




**Županijska lučka uprava Krk
Upravno vijeće**

**IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE
S FINACIJSKIM IZVJEŠTAJEM
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK
ZA 2023. GODINU**



Predsjednica Upravnog vijeća:

Nada Milošević



Ravnatelj:

Alfred Franković

Pripremio:

Alfred Franković

ožujak, 2024. godine

Na temelju članka 117. stavka 2. točke 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/2023), članka 7. stavka 1. točke 4. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk („Službene novine“ broj 38/23), članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Krk, na 50. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2024. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU

1. USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Temeljem Zakona o morskim lukama i čl. 7 Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 08. travnja 1999. godine osnovalo Županijsku lučku upravu Krk kao jednu od osam lučkih uprava, radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luke županijskog značaja Valbiska i luka lokalnog značaja: Baška, Klimno, Šilo, Krk, Glavotok, Malinska, Njivice, Omišalj, Voz, Punat, Stara Baška i Vrbnik. Nakon izmjena i dopuna odluke o osnivanju Županijska lučka uprava Krk upravlja s 23 (dvadeset i tri) luke otvorene za javni promet odnosno 9 (devet) luka otvorenih za javni promet županijskog značaja i 14 (četnaest) luka otvorenih za javni promet lokalnog značaja.

Sjedište Županijske lučke uprave Krk je u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 5.

Tijela lučke uprave čine Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće ima 5 (pet) članova, u sljedećem sastavu:

- ✚ Nada Milošević, predsjednica, predstavnik osnivača;
- ✚ Vlado Šušak, predstavnik osnivača;
- ✚ Miroslav Topić, predstavnik osnivača;
- ✚ Danko Milohnić, predstavnik koncesionara;
- ✚ Vladimir Malnar, predstavnik nadležne lučke kapetanije

Ravnatelj Županijske lučke uprave Krk je Alfred Franković na mandat od 07. rujna 2022. godine do 06. rujna 2026. godine.

Godišnji izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana rada Županijske lučke uprave Krk za 2023. godinu obuhvaća ostvarenje programa koji su provedeni putem pripadajućih aktivnosti i projekata, a temeljeni su na sljedećim:

- ✚ ovlastima i nadležnostima propisanim zakonskim i podzakonskim aktima
- ✚ Zaključcima Županijske skupštine i Župana Primorsko-goranske županije

- ✚ Prostornom planu Primorsko-goranske županije te Prostornom planu Grada Krka, Općine Omišalj, Općine Malinska-Dubašnica, Općine Punat, Općine Baška, Općine Vrbnik i Općine Dobrinj.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Krk, ustrojavaju se službe kao unutarnje ustrojstvene jedinice.

U Županijskoj lučkoj upravi Krk ustrojene su sljedeće službe:

1. Služba lučkog redarstva
2. Služba financijsko-računovodstvenih poslova
3. Služba tehničkih poslova
4. Služba općih poslova
5. Služba europskih projekata i fondova.

2. DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK

Županijska lučka uprava Krk je neprofitna pravna osoba upisana u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci. Temeljem članka 116. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23 – dalje u tekstu: ZPDML) djelatnost županijske lučke uprave je upravljanje i korištenje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, a obavlja se kao javna djelatnosti.

Djelatnost županijske lučke uprave je:

1. građenje, održavanje, upravljanje, zaštita i unaprjeđenje lučkog područja
2. građenje i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje
3. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu
4. provođenje reda u luci, koje osim ostaloga uključuje ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila
5. osiguranje pružanja osnovnih lučkih djelatnosti, i to:
 - a) privez i odvez plovnih i plutajućih objekata
 - b) ukrcaj i iskrcaj tereta
 - c) opskrba plovnih objekata vodom i energijom
 - d) usluga dizanja i spuštanja plovnih objekata more
 - e) lučko tegljenje i potiskivanje
6. osiguravanje prihvata i predaje svih vrsta otpada s pomorskih objekata osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuju gospodarenje otpadom
7. osiguravanje opskrbe plovnih objekata gorivom
8. usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području
9. davanje koncesija i posebne upotrebe
10. obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim Zakonom.

Županijska lučka uprava dužna je osigurati uslugu priveza i odveza plovni i plutajućih objekata u svim lukama u kojima postoji operativni dio luke i nautički dio luke.

Financiranje županijske lučke uprave propisano je člankom 123. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te su prihodi županijske lučke uprave:

1. lučke tarife
2. prihod od koncesije na lučkom području
3. prihod od posebne upotrebe na lučkom području
4. sredstva iz proračuna osnivača
5. sredstva iz državnog proračuna
6. bespovratne potpore iz strukturnih fondova Europske unije
7. ostali prihodi u skladu s ovim Zakonom i općim aktima županijske lučke uprave.

Sredstvima pod točkom 5. županijska lučka uprava može financirati samo izgradnju i održavanje lučke podgradnje.

Sredstva iz točaka 1. do 4., 6. i 7. pripadaju u cijelosti županijskoj lučkoj upravi na čijem području se ubiru i namijenjena su za:

1. izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje
2. opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova
3. održavanje dubine u luci i na sidrištu luke
4. troškove poslovanja županijske lučke uprave.

Županijska lučka uprava Krk je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama. Na financijsko poslovanje primjenjuju se Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14, 114/22), Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 1/15, 25/17, 96/18, 103/18, 134/22) i Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 31/15, 67/18, 115/18, 21/21).

3. LUČKO PODRUČJE

Županijska lučka uprava Krk upravlja s lukama otvorenim za javni promet:

✦ *županijskog značaja:*

1. Baška
2. Krk
3. Malinska
4. Omišalj
5. Punat
6. Surbova-Baška
7. Šilo
8. Valbiska
9. Vrbnik

✦ *lokalnog značaja:*

1. Čižići
2. Dunat
3. Glavotok
4. Klimno
5. Lokvišća
6. Njivice
7. Porat
8. Rova
9. Soline
10. Stara Baška
11. Sveta Fuska
12. Vantačići
13. Vela Jana
14. Voz.


Ukupna površina lučkog područja iznosi 1.081.975 m² koje zauzima 951.996 m² površine morskog akvatorija i 129.930 m² kopnenog dijela. Županijska lučka uprava Krk raspolaže dizalicama u luci Omišalj, Malinska i Sveta Fuska.

Županijska lučka uprava Krk na području luka raspolaže s 3.553 vezova za brodice, od čega je 2.614 stalna veza u komunalnom dijelu luke te 939 u nautičkom dijelu luke.

Na području luke Krk i luke Dunat su zaključeni ugovori o koncesiji u kojima se nalazi 166 nautičkih vezove. Ugovor o koncesiji u luci Krk istječe u 2024. godini te će 53 nautička veza biti na raspolaganju Županijskoj lučkoj upravi Krk.

Prema lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja, broj vezova iskazuje se kako slijedi:

REDNI BROJ	LUKA	KOMUNALNI VEZ	NAUTIČKI VEZ	UKUPNO
1.	Krk	377	62	439
2.	Baška	303	65	368
3.	Punat	437	53	490
4.	Njivice	113	58	171
5.	Malinska	257	92	349
6.	Šilo	52	-	52
7.	Lokvišća	77	47	124
8.	Klimno	98	66	164
9.	Stara Baška	43	25	68
10.	Vrbnik	108	20	128
11.	Glavotok	24	-	24
12.	Valbiska	47	-	47
13.	Porat	39	120	159
14.	Rova	24	-	24
15.	Vantačići	34	25	59
16.	Čižići	63	100	163
17.	Soline	29	7	36
18.	Omišalj	186	153	339
19.	Vela Jana	146	6	152
20.	Sv. Fуска	126	40	166
21.	Dunat	31	-	31
22.	Voz	-	-	-
23.	Surbova	-	-	-
UKUPNO		2.614	939	3.553

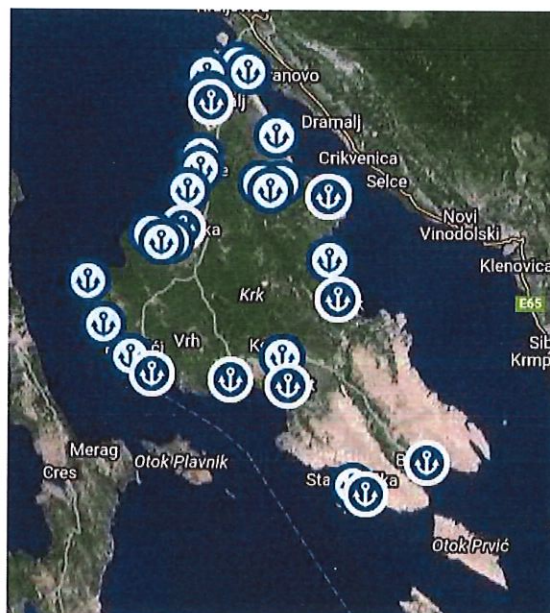



Luka Porat



Luka Baška


4. OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA

U 2023. godini Županijska lučka uprava Krk na temelju zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora, ostvarila je prihode zajedno sa donacijama - primicima i prihodima od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji te obvezama prema leasing kućama u visini od 5.691.547,97 eura kako slijedi:

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	2.872.436,00	2.850.819,82	99,25
3112	Prihodi od pružanja usluga	2.872.436,00	2.850.819,82	99,25
31121	Lučke pristojbe	2.204.517,00	2.203.486,73	99,95
31122	Lučke naknade	398.000,00	396.690,81	99,67
31123	Naknade za koncesiju	245.417,00	226.462,50	92,28
31124	Ostali prihodi poslovanja	620,00	614,79	99,16
31125	Neizravna naknada za prihvrat otpada	23.882,00	23.564,99	98,67
34	Prihodi od imovine	5.180,00	5.744,31	110,89
35	Prihodi od donacija	362.921,00	327.653,25	90,28
36	Ostali prihodi	0,00	1.418,02	-
UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA		3.240.537,00	3.185.635,40	98,31
24	Ostale kratkoročne obveze	53.089,00	44.069,31	83,01
OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE		53.089,00	44.069,31	83,01
29	Odgođeni prihodi od donacija	3.605.805,00	2.461.843,26	68,27
29220	Odgođeni prihodi – donacija iz državnog proračuna RH	929.060,00	698.291,52	75,16
29221	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna PGŽ	269.446,00	158.624,47	58,87
29222	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave	180.790,00	179.063,73	99,05
29223	Odgođeni prihodi donacije od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – EU fondovi	2.226.509,00	1.425.863,54	64,04
ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA (PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)		3.605.805,00	2.461.843,26	68,27
52	Preneseni višak prihoda	213.031,00		-
SVEUKUPNI PRIHODI, DONACIJE I VIŠAK PRIHODA		7.112.462,00	5.691.547,97	80,02

Godišnji program rada i plan razvoja Županijske lučke uprave Krk za 2023. godinu usvojen je na 20. sjednici Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk održanoj dana 12. prosinca 2022. godine, na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 09. svibnja 2023. godine usvojene su I. izmjene Godišnjeg programa rada i plan razvoja luka Županijske lučke uprave Krk, a na 43. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 19. prosinca 2023. godine usvojene su II. Izmjene Godišnjeg plana rada luke Županijske lučke uprave Krk za 2023. godinu.

Prikaz plana i ostvarenja prihoda za 2023. godinu

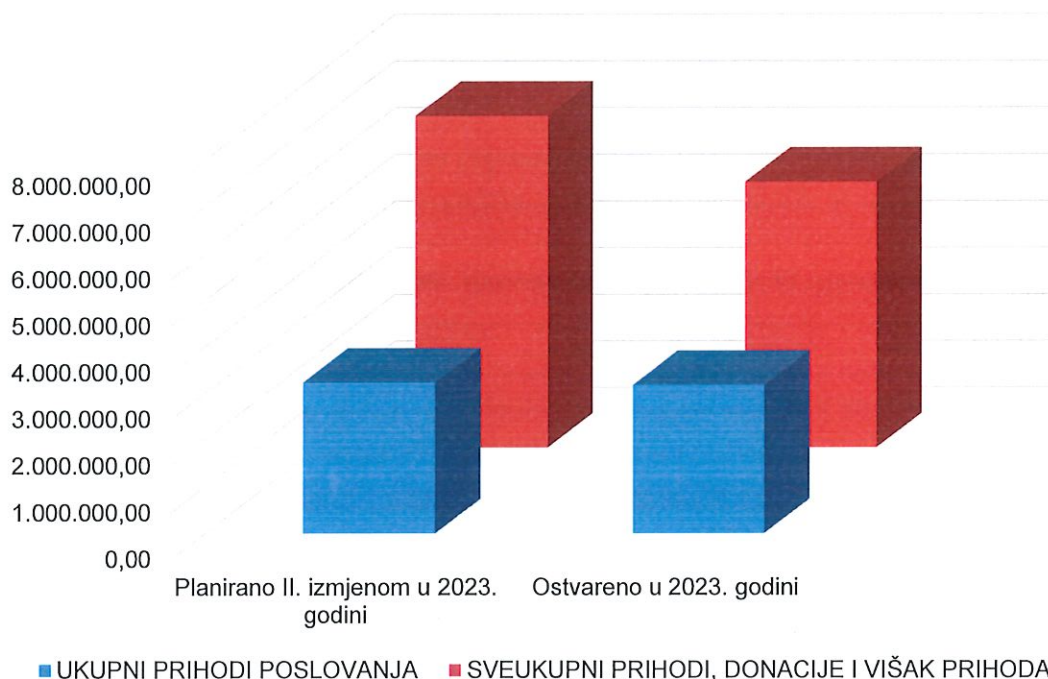

Ostvareni prihodi Županijske lučke uprave Krk u ukupnom iznosu od 5.691.547,97 eura obuhvaćaju:

- ✚ Prihode poslovanja – 3.185.635,40 eura
- ✚ Obveze prema leasing kućama – 44.069,31 eura
- ✚ Odgođene prihode od donacija – 2.461.843,26 eura.

Gledajući samo prihode poslovanja Županijske lučke uprave Krk, isti su ostvareni u iznosu od 3.185.635,40 eura što je 98,31% planiranog iznosa od 3.240.537,00 eura.

Najveći prihod Županijska lučka uprava Krk ostvaruje od lučkih pristojbi (konto 31121), koji su u 2023. godini ostvareni u iznosu od 2.203.486,73 eura što je 99,95% planiranog iznosa od 2.204.517,00 eura.

Prihodi od lučkih naknada za isporučene usluge (31122) ostvareni su u iznosu od 396.690,81 eura što je 99,67% planiranog iznosa od 398.000,00 eura.

Prihodi od naknada za koncesiju (31123) ostvareni su u iznosu od 226.462,50 eura što je 92,28% planiranog iznosa od 245.417,00 eura. Odnose se za koncesije po ugovorima na lučkom području Županijske lučke uprave Krk i Plana davanja koncesija na lučkom području.

Ostali prihodi poslovanja (31124) ostvareni su u iznosu od 614,79 eura što je 99,16% planiranog iznosa od 620,00 eura.

Prihodi od neizravne naknade za prihvrat otpada (31125) ostvareni su u iznosu od 23.564,99 eura što je 98,67% planiranog iznosa od 23.882,00 eura.

Prihodi od imovine (34) ostvareni su od financijske i nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 5.744,31 eura što je 110,89% planiranog iznosa od 5.180,00 eura.

Prihodi od donacija iz proračuna (351 - sučeljavanje) udjela u investiciji ostvareni su u iznosu od 296.823,78 eura što je 88,63% planiranog iznosa od 334.921,00 eura, a odnose se na slijedeće:

- ✚ prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske (3511) u iznosu 102.178,07 eura
- ✚ prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (3512) u iznosu 96.825,02 eura
- ✚ prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave (3513) u iznosu 96.140,73 eura:
 - Općina Omišalj (35131) u iznosu 34.991,65 eura
 - Općina Vrbnik (35132) u iznosu 445,20 eura
 - Općina Baška (35133) u iznosu 7.830,76 eura
 - Grad Krk (35134) u iznosu 18.901,06 eura
 - Općina Malinska - Dubašnica (35135) u iznosu 14.671,65 eura
 - Općina Puntar (35136) u iznosu 19.300,41 eura
- ✚ EU – bespovratna sredstva u iznosu 1.679,96 eura.

Ostali prihodi od donacija (355) ostvareni su u iznosu od 30.829,47 eura što je 110,11% planiranog iznosa od 28.000,00 eura. Odnose se na prihode temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske za električnu energiju.

Ostali nespomenuti prihodi (363) ostvareni su u iznosu od 1.418,02 eura, te isti nisu bili planirani.

Obveze prema leasing kućama (24932) ostvareni su u iznosu od 44.069,31 eura što je 83,01% planiranog iznosa od 53.089,00 eura. U 2023. godini sklopljena su dva financijska leasinga: BKS – leasing Croatia d.o.o. za nabavu vozila nabavne vrijednosti 27.397,85 eura i UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za nabavu vozila nabavne vrijednosti 20.655,86 eura. Po navedenim ugovorima o financijskom leasingu u 2023. godini otplaćeno je 3.984,40 eura te je obveza na dan 31.12.2023. godine 44.069,31 eura.

Odgođeni prihodi od donacija (292) ostvareni su u iznosu od 2.461.843,26 eura što je 68,27% planiranog iznosa od 3.605.805,00 eura, te se odnose na slijedeće:

- ✚ iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (Ministarstvo mora, promete i infrastrukture - 29220) ostvareno je 698.291,52 eura što je 75,16% planiranog iznosa od 929.060,00 eura. Temeljem prijavljenog projekta na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekta podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture u 2023. godini odobrena su sredstva i sklopljen je:
- Ugovor o sufinanciranju u 2023. godini za sufinanciranje radova rekonstrukcije luke Baška – 3. faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri gata okomita na njega u iznosu od 550.000,00 eura
 - Dodatak Ugovoru o sufinanciranju u 2023. godini za sufinanciranje radova rekonstrukcije luke Baška – 3. faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri gata okomita na njega u dijelu povećanja iznosa na 740.000,00 eura.
- ✚ iz Proračuna Primorsko-goranske županije (29221) ostvareno je 158.624,47 eura što je 58,87% planiranog iznosa od 269.446,00 eura, a odnosi se na sljedeće:
- sufinanciranje izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije luke Malinska – I faza – rekonstrukcija i dogradnja primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana ostvareno je 3.235,12 eura što je 24,78% planiranog iznosa od 13.057,00 eura. Ugovor temeljem kojeg su osigurana namjenska sredstva zaključen je u 2022. godini u iznosu 59.725,26 eura, te su temeljem istog u 2022. godini ostvarena sredstva u iznosu od 46.668,66 eura. Dodatak Ugovoru br. 018/07/2022 zaključen je 30. prosinca 2022. godine za produljenje roka korištenja sredstva do 30. lipnja 2023. godine za ostatak iznosa od 13.056,61 eura. 2. Dodatak Ugovoru br. 018/07/2022 zaključen je 16. lipnja 2023. godine za produljenje roka korištenja sredstva do 30. studenog 2023. godine za ostatak iznosa od 9.821,48 eura;
 - sufinanciranje radova na nabavi i ugradnji plutajućeg pontona u luci Omišalj (Pesja) ostvareno je 59.700,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 59.700,00 eura. Ugovor o korištenju namjenskih sredstva temeljem kojeg su osigurana namjenska sredstva zaključen je 18. svibnja 2023. godine u iznosu 59.700,00 eura;
 - sufinanciranje radova na dobavi i montaži stupne konzolne dizalice u luci Sveta Fуска ostvareno je 13.250,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 13.250,00 eura. Ugovoru o korištenju namjenskih sredstva temeljem kojeg su osigurana namjenska sredstva zaključen je 18. svibnja 2023. godine u iznosu 13.250,00 eura;
 - sufinanciranje radova na izradi natkrivenog prostora za hitnu pomoć u luci Valbiska ostvareno je 27.010,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 27.010,00 eura. Ugovor o korištenju namjenskih sredstva temeljem kojeg su osigurana namjenska sredstva zaključen je 05. prosinca 2023. godine u iznosu 27.010,00 eura;
 - sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz ostvareno je 26.429,35 eura što je 100% planiranog iznosa od

26.429,00 eura. Ugovor o korištenju namjenskih sredstava zaključen je 05. prosinca 2023. godine u iznosu 26.429,35 eura;

- sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran ostvareno je 29.000,00 eura, a navedena sredstva nisu bila planirana.

Planirani prihodi (odgođeni) od donacija u iznosu od 130.000,00 eura za sufinanciranje radova rekonstrukcije luke Baška – 3. faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri gata okomita na njega prema sklopljenom Ugovoru o korištenju namjenskih sredstava nisu ostvarena. Županijska lučka uprava je ostvarila namjenska sredstva od Državnog proračuna prema privremenim situacijama za navedene radove te se nisu mogla iskoristiti namjenska sredstva iz proračuna Primorsko-goranske županije.

✚ Iz proračuna jedinica lokalne samouprave (29222) ostvareno je 179.063,73 eura što je 99,05% planiranog iznosa od 180.790,00 eura. Ostvarena sredstva odnose na sljedeće:

- Proračuna Grada Krk ostvareno je 84.718,21 eura što je 100% planiranog iznosa od 84.718,00 eura, te se odnose na sljedeće:
 - sufinanciranje radova i usluga za rekonstrukciju operativnog gata u luci Glavotok temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenih u 2022. i 2023. godini u kojem Grad Krk se obvezuje sufinancirati u iznosu od 148.876,20 eura, odnosno 50% iznosa ugovorenih radova i usluga stručnog nadzora. U 2022. godini su za navedenu investiciju dobivena sredstva u iznosu od 64.158,00 eura.
- Proračuna Općine Malinska-Dubašnica ostvareno je 69.526,31 eura što je 100% planiranog iznosa od 69.527,00 eura, te se odnose na sljedeće:
 - sufinanciranje izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije luke Malinska – I faza – rekonstrukcija i dogradnja primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana ostvareno je 42.163,81 eura što je 100% planiranog iznosa od 42.164,00 eura, Ugovor o sufinanciranju sklopljen je 05. listopada 2023. godine u iznosu od 42.163,81 eura što čini 20% od sveukupne ugovorene vrijednosti usluge izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije luke Malinska;
 - sufinanciranje nabave i montaže plutajućeg pontona u luci Malinska ostvareno je 27.362,50 eura što je 100% planiranog iznosa od 27.363,00 eura. Ugovor o sufinanciranju sklopljen je 05. listopada 2023. godine u iznosu od 27.362,50 eura što čini 87,56% od sveukupne procijenjene vrijednosti nabave i montaže plutajućeg pontona;
- Proračun Općine Punat ostvareno je 24.819,21 eura što je 93,50% planiranog iznosa od 26.545,00 eura, te se odnose na sljedeće:

- sufinanciranje izrade projektne dokumentacije dogradnje dva gata na području Vele vode temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenog 04. listopada 2023. godine u iznosu od 26.545,00 eura.

✚ EU projekt Baška – bespovratna sredstva za projekt „Dogradnja luke Baška“ ostvareno je 1.425.863,54 eura što je 64,04% planiranog iznosa od 2.226.509,00 eura. Dobivena sredstva odnose se na financijska sredstva za koje su podnijeti zahtjevi prema privremenim i okončanim situacijama prihvatljivih troškova sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova od 2019. godine. Iznos dobivenih sredstava je manji zbog toga što su stvarno izvedene količine radova po pojedinim stavkama manje od ugovorene količine radova iz ugovornog troškovnika. Ukupno od podnošenja i odobravanja zahtjeva dobiveno je 3.946.978,78 eura i to:

- u 2021. godini iznos od 1.177.298,20 eura
- u 2022. godini iznos od 1.343.817,04 eura
- u 2023. godini iznos od 1.425.863,54 eura.

Županijska lučka uprava Krk se u 2023. godini prijavila na natječaje za sufinanciranje projekata iz Proračuna Republike Hrvatske i Proračuna Primorsko-goranske županije:

1. Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture u 2023. godini
2. Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava za poticanje rada županijskih lučkih uprava u 2023. godini.

Osim navedenih natječaja zaključeni su ugovori o sufinanciranju s lokalnim samoupravama.

Temeljem prijave za navedene natječaje i sklopljenih ugovora s lokalnim samoupravama za sufinanciranje projekata Županijskoj lučkoj upravi Krk dodijeljena su sredstva u sveukupnom iznosu od 1.085.999,98 eura i to za:

1. Rekonstrukcija luke Baška – 3. faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri gata okomita na njega prema sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju broj: 13 – POM/2023 od 24. svibnja 2023. godine i Dodatak Ugovoru broj: 13 – POM/2023 od 22. studenog 2023. godine u iznosu od 740.000,00 eura (Proračun Republike Hrvatske)
2. Rekonstrukcija luke Malinska – I faza – rekonstrukcija i dogradnja primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana prema sklopljenom 2. Dodatku Ugovora br. 018/07/2022 o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu od 21. lipnja 2023. godine u iznosu od 9.821,48 eura (prijava i ugovor iz 2022. godine iz Proračuna Primorsko-goranske županije)
3. Plutajući ponton u luci Omišalj (Pesja) prema sklopljenom Ugovoru br. 027/07/2023 o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za


poticanje rada županijskih lučkih uprava u 2023. godini od 18. svibnja 2023. godine u iznosu od 59.700,00 eura (Proračun Primorsko-goranske županije)

4. Stupna konzolna dizalica u luci Sveta Fуска prema sklopljenom Ugovoru br. 027/07/2023 o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za poticanje rada županijskih lučkih uprava u 2023. godini od 18. svibnja 2023. godine u iznosu od 13.250,00 eura (Proračun Primorsko-goranske županije)
5. Natkriveni prostor za hitnu pomoć u luci Valbiska prema sklopljenom Ugovoru br. 052/07/2023 o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za poticanje rada županijskih lučkih uprava u 2023. godini od 05. prosinca 2023. godine u iznosu od 27.010,00 eura (Proračun Primorsko-goranske županije)
6. Rekonstrukcija operativnog gata u luci Voz prema sklopljenom Ugovoru br. 052/07/2023 o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za poticanje rada županijskih lučkih uprava u 2023. godini od 05. prosinca 2023. godine u iznosu od 26.429,00 eura (Proračun Primorsko-goranske županije)
7. Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran prema sklopljenom Ugovoru br. 060/07/2023 o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za poticanje rada županijskih lučkih uprava u 2023. godini od 15. prosinca 2023. godine u iznosu od 29.000,00 eura (Proračun Primorsko-goranske županije)
8. Rekonstrukcija operativnog gata u luci Glavotok prema Ugovoru o sufinanciranju radova i usluga rekonstrukcije operativnog gata u luci Glavotok od 29. srpnja 2022. godine i Ugovoru o sufinanciranju dijela radova i usluga rekonstrukcije operativnog gata u luci Glavotok za 2023. godinu od 31. kolovoza 2023. godine u iznosu od 84.718,00 eura (Proračun Grada Krka)
9. Rekonstrukcija luke Malinska – I faza – rekonstrukcija i dogradnja primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana prema Ugovoru o sufinanciranju usluga projektne dokumentacije rekonstrukcije luke Malinska – I. faza – rekonstrukcija i dogradnja primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana od 04. listopada 2023. godine u iznosu od 42.164,00 eura (Proračun Općine Malinska-Dubašnica)
10. Plutajući ponton u luci Malinska prema Ugovoru o sufinanciranju nabave i montaže plutajućeg pontona u luci Malinska od 04. listopada 2023. godine u iznosu od 27.362,50 eura (Proračun Općine Malinska-Dubašnica)
11. Dogradnja dva gata na području Vele vode u luci Punat prema Ugovoru o sufinanciranju usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju dva gata na području Vele vode u luci Punat od 04. listopada 2023. godine u iznosu od 26.545,00 (Proračun Općine Punat).

Od ukupno dodijeljenih sredstava utrošeno je 1.035.979,72 eura.


Prema vrsti prihoda, grafički se iskazuje kako slijedi:

Prikaz ostvarenih prihoda ŽLU Krk u 2023. g.

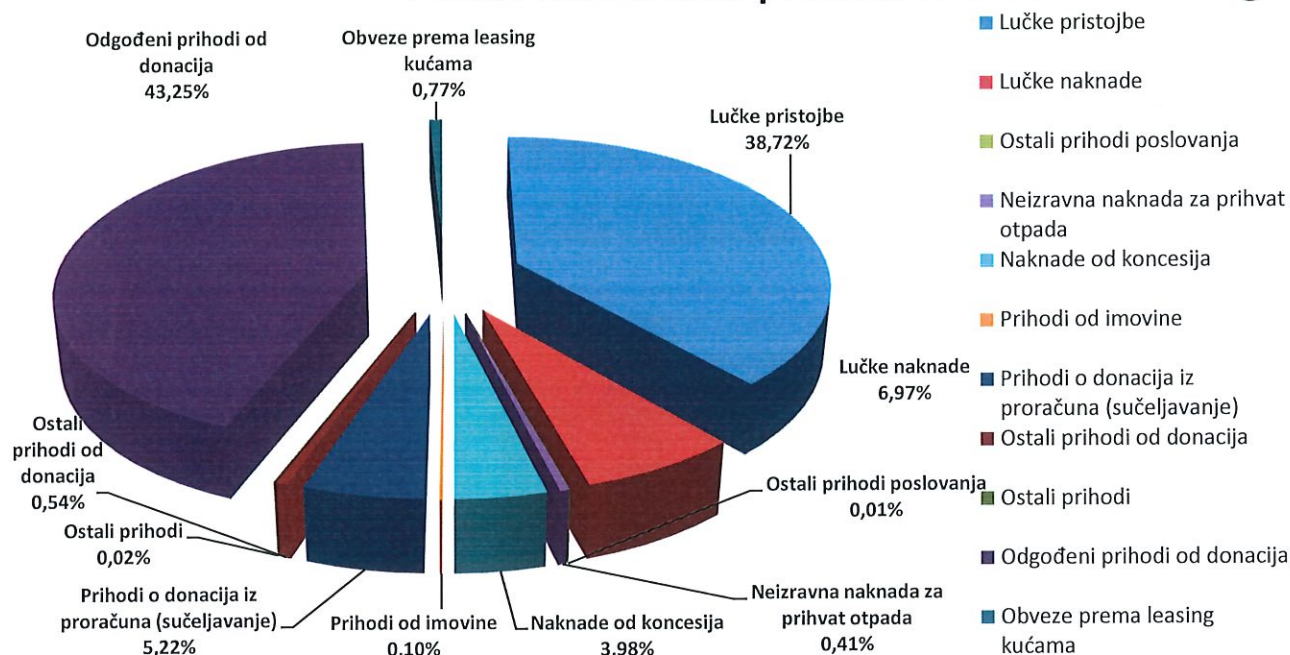

Detaljni prikaz plana prihoda prikazan je u Izvještaju o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za 2023. godinu koji je sastavni dio ovog plana rada.


Prikaz planiranih i ostvarenih prihoda ŽLU Krk za 2023. godinu

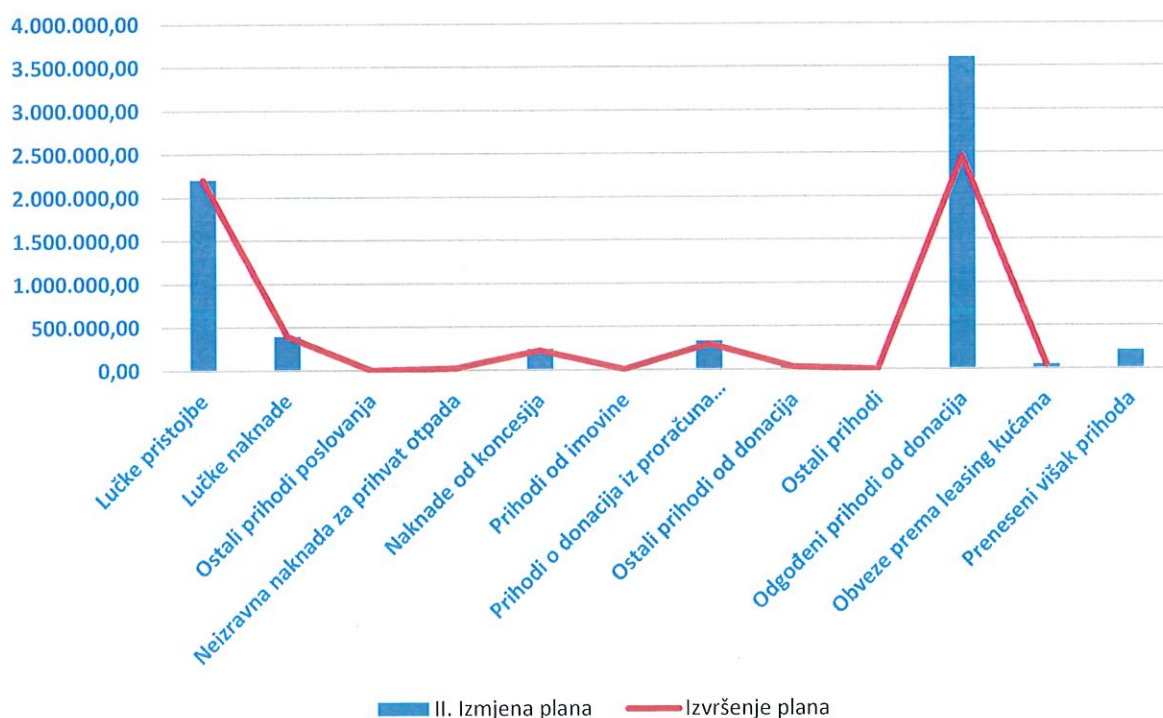

Usporedba ostvarenih prihoda o pružanja usluga za razdoblje 2021. – 2023. godine

Konto	Naziv	Ostvareno u 2021. godini	Ostvareno u 2022. godini	Ostvareno u 2023. godini
3112	Prihodi od pružanja usluga	2.238.477,83	2.736.063,73	2.850.819,82


Usporedba prihoda od pružanja usluga
za razdoblje 2021. - 2023. godine

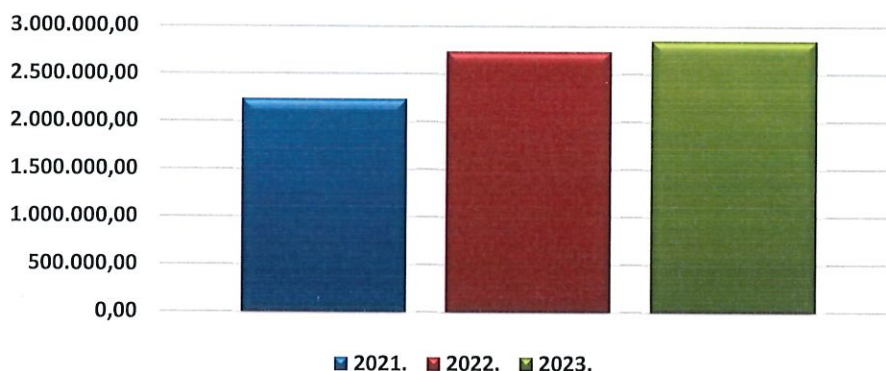

Usporedba ostvarenih prihoda od lučkih pristojbi za razdoblje 2021. – 2023. godine

Konto	Naziv	Ostvareno u 2021. godini	Ostvareno u 2022. godini	Ostvareno u 2023. godini
311211	Pristojba za uporabu obale	331.934,57	448.067,23	512.888,18
311212	Brodsko ležarina	90.205,55	127.016,42	135.136,15
311213	Pristojba za vez	1.273.442,66	1.523.973,63	1.555.462,40


Usporedba prihoda od lučkih pristojbi
za razdoblje 2021. - 2023. godine

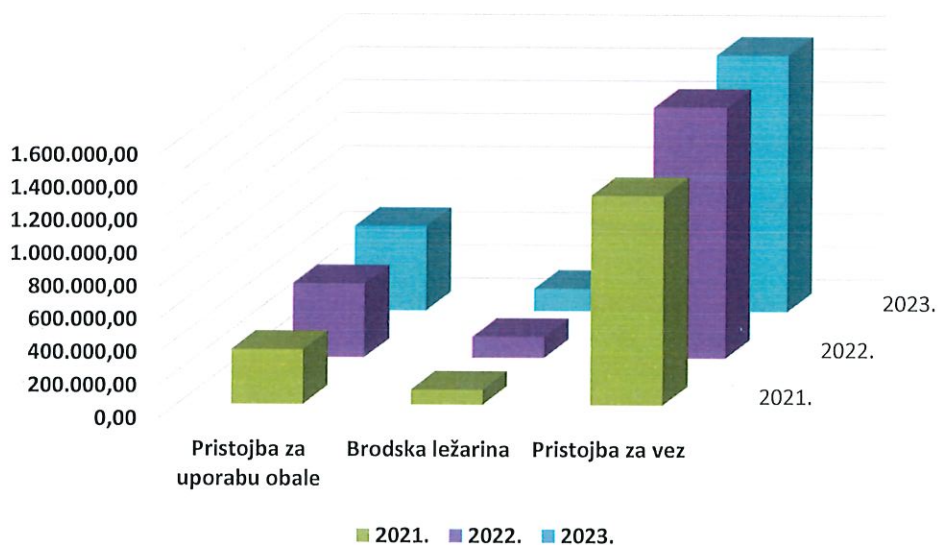

Usporedba ostvarenih prihoda od pristojbi za vez za razdoblje 2021. – 2023. godine

Konto	Naziv	Ostvareno u 2021. godini	Ostvareno u 2022. godini	Ostvareno u 2023. godini
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	207.890,11	208.518,15	202.091,18
3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.065.552,56	1.315.455,48	1.353.371,22


Usporedba prihoda od pristojbi za vez za razdoblje 2021. - 2023. godine



 Usporedba ostvarenih prihoda od lučkih naknada za razdoblje 2021. – 2023. godine

Konto	Naziv	Ostvareno u 2021. godini	Ostvareno u 2022. godini	Ostvareno u 2023. godini
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	291.852,15	303.181,37	307.776,51
311224	Usluge opskrbe vodom	4.599,42	6.890,22	13.788,44
311225	Usluge opskrbe električnom energijom	25.973,37	31.265,54	40.897,68
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	38.271,95	36.461,61	34.228,18


**Usporedba prihoda od lučkih naknada
za razdoblje 2021. - 2023. godine**

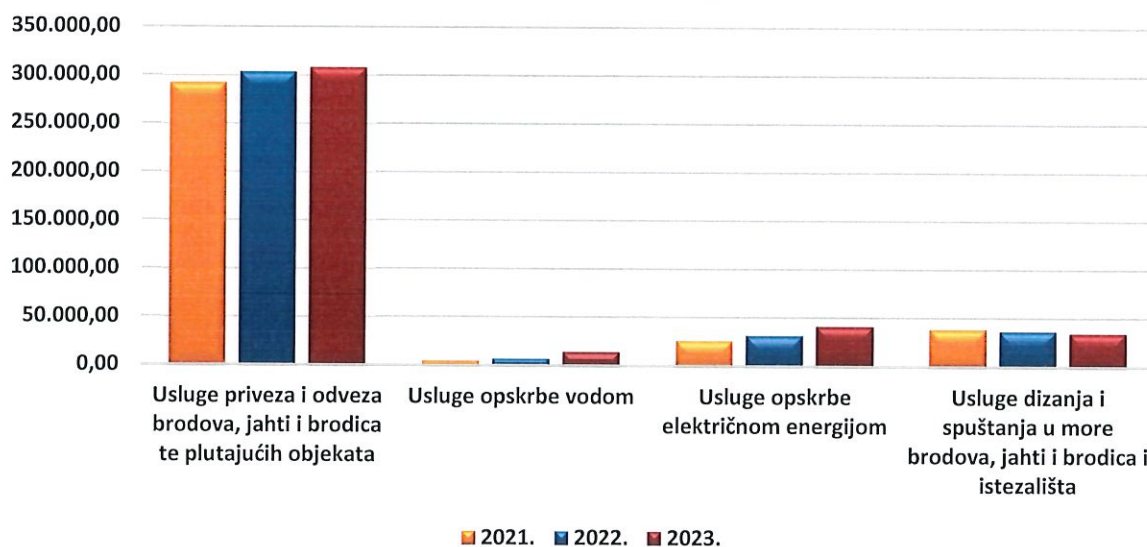

✚ Usporedba ostvarenih prihoda od naknada za koncesiju za razdoblje 2021. – 2023. godine

Konto	Naziv	Ostvareno u 2021. godini	Ostvareno u 2022. godini	Ostvareno u 2023. godini
311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	28.384,49	31.188,83	34.224,60
311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	153.749,96	227.933,94	192.237,90


Usporedba prihoda od naknada za koncesiju
za razdoblje 2021. - 2023. godine



Usporedba ostvarenih prihoda od ostalih prihoda poslovanja za razdoblje 2021. – 2023. godine

Konto	Naziv	Ostvareno u 2021. godini	Ostvareno u 2022. godini	Ostvareno u 2023. godini
31124	Ostali prihodi poslovanja i rezervacije	63,71	84,94	614,79

Usporedba ostalih prihoda poslovanja
za razdoblje 2021. - 2023. godine



Luka Punat

5. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA


U 2023. godini Županijska lučka uprava Krk ostvarila je rashode sa izdacima za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.563.132,58 eura. Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.159.400,52 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.403.732,06 eura:

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
41	Rashodi za radnike	652.400,00	589.105,26	90,30
42	Materijalni rashodi	1.116.367,00	960.630,09	86,05
43	Rashodi amortizacije	606.600,00	601.269,64	99,12
44	Financijski rashodi	11.545,00	7.417,48	64,25
45	Donacije	0,00	0,00	-
46	Ostali rashodi	3.754,00	978,05	26,05
UKUPNI RASHODI POSLOVANJA		2.390.666,00	2.159.400,52	90,33
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	4.532.085,00	2.403.732,06	53,04
051	Građevinski objekti	3.580.051,00	1.891.193,16	52,83
052	Postrojenja i oprema u pripremi	98.934,00	60.141,41	60,79
053	Prijevozna sredstva u pripremi	56.389,00	51.351,87	91,07
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	796.711,00	401.045,62	50,34
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0	-
52	Preneseni manjak prihoda	0,00	0	-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.922.751,00	4.563.132,58	65,92

Ostvareni rashodi Županijske lučke uprave Krk u ukupnom iznosu od 4.563.132,58 eura obuhvaćaju:

- Rashode poslovanja – 2.159.400,52 eura
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 2.403.732,06 eura.

Prikaz plana i ostvarenje rashoda za 2023. godinu

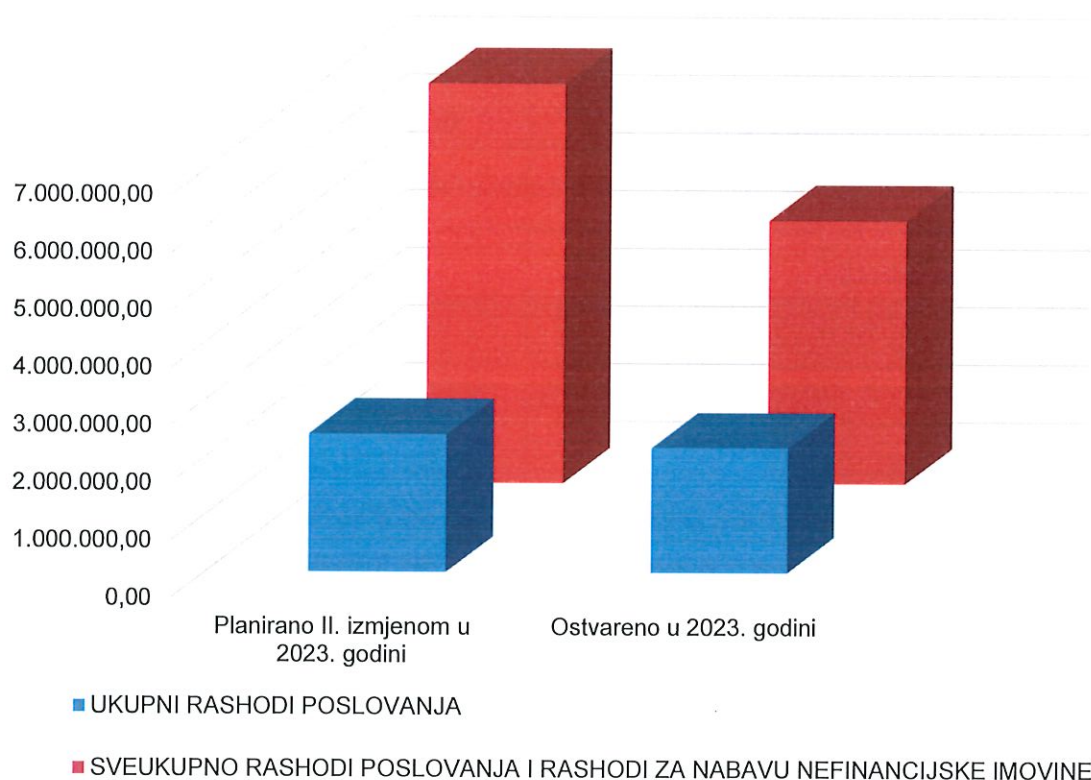


Rashodi poslovanja Županijske lučke uprave Krk ostvareni su u iznosu od 2.159.400,52 eura što je 90,33% planiranog iznosa od 2.390.666,00 eura.

Rashodi za radnike (41) ostvareni su u iznosu od 589.105,26 eura što je 90,30% planiranog iznosa od 652.400,00 eura. Obuhvaćaju plaće za redovni rad u bruto iznosu (411), ostale rashode za radnike (412) te doprinose na plaće (413).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
41 – RASHODI ZA RADNIKE		652.400,00	589.105,26	90,30
411	Plaće	516.955,00	463.663,43	89,69
412	Ostali rashodi za radnike	59.130,00	53.715,11	90,84
413	Doprinosi na plaće	76.315,00	71.726,72	93,99


Prikaz planiranih i ostvarenih Rashoda za radnike za 2023. godinu



Materijalni rashodi (42) ostvareni su u iznosu od 960.630,09 eura što je 86,05 % planiranog iznosa od 1.116.367,00 eura. Obuhvaćaju slijedeće rashode: naknade troškova radnicima (421), naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. (422), rashode za usluge (425), rashode za materijal i energiju (426) i ostali nespomenuti materijalni rashodi (429).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
42 – MATERIJALNI RASHODI		1.116.367,00	960.630,09	86,05
421	Naknada troškova radnicima	39.708,00	34.178,35	86,07
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	21.236,00	10.440,90	49,17
425	Rashodi za usluge	825.604,00	716.289,68	86,76
426	Rashodi za materijal i energiju	195.594,00	165.749,47	84,74
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	34.225,00	33.971,69	99,26


**Prikaz planiranih i ostvarenih Materijalnih rashoda
za 2023. godinu**

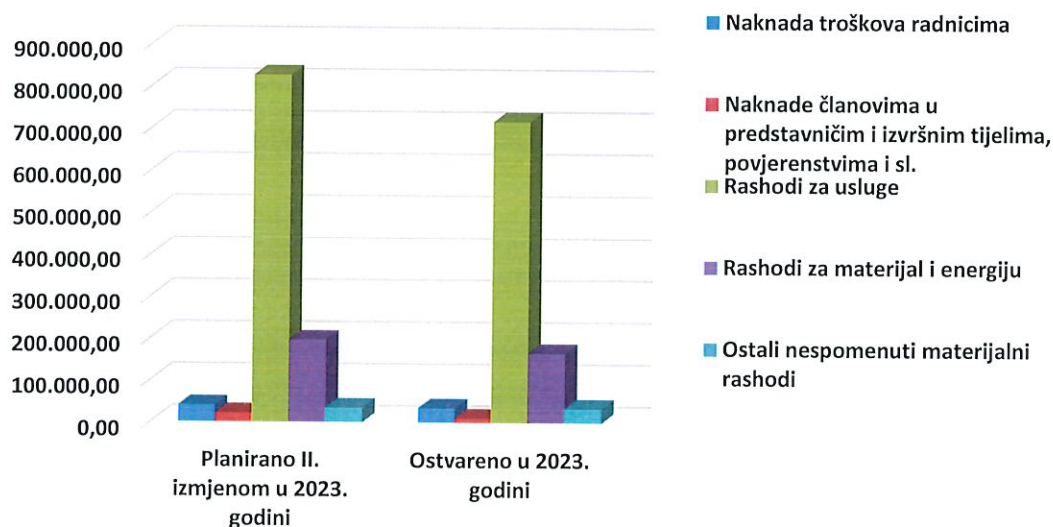

Naknade troškova radnicima (421) ostvarene su u iznosu od 34.178,35 eura što je 86,07% planiranog iznosa od 39.708,00 eura. Obuhvaćaju slijedeće rashode: službena putovanja (4211), naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (4212) i stručno usavršavanje radnika (4213).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
421 – NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA		39.708,00	34.178,35	86,07
4211	Službena putovanja	12.500,00	10.208,96	81,67
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.554,00	21.476,35	87,47
4213	Stručno usavršavanje radnika	2.654,00	2.493,04	93,94


**Prikaz planiranih i ostvarenih
Naknada troškova radnicima
za 2023. godinu**



Rashodi za usluge (425) ostvareni su u iznosu od 716.289,68 eura što je 86,76% planiranog iznosa od 825.604,00 eura. Obuhvaćaju slijedeće rashode: usluge telefona, pošte i prijevoza (4251), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (4252), usluge promidžbe i informiranja (4253), komunalne usluge (4254), zakupnine i najamnine (4255), zdravstvene i veterinarske usluge (4256), intelektualne i osobne usluge (4257), računalne usluge (4258) i ostale usluge (4259).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
425 – RASHODI ZA USLUGE		825.604,00	716.289,68	86,76
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.236,00	18.172,61	85,57
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	483.053,00	423.047,59	87,58
4253	Usluge promidžbe i informiranja	24.319,00	22.487,68	92,47
4254	Komunalne usluge	98.993,00	96.418,05	97,40
4255	Zakupnine i najamnine	24.741,00	22.685,93	91,69
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.352,00	7.481,52	72,27
4257	Intelektualne i osobne usluge	125.800,00	94.316,41	74,97
4258	Računalne usluge	26.897,00	26.418,84	98,22
4259	Ostale usluge	10.213,00	5.261,05	51,51


**Prikaz planiranih i ostvarenih
Rashoda za usluge
za 2023. godinu**

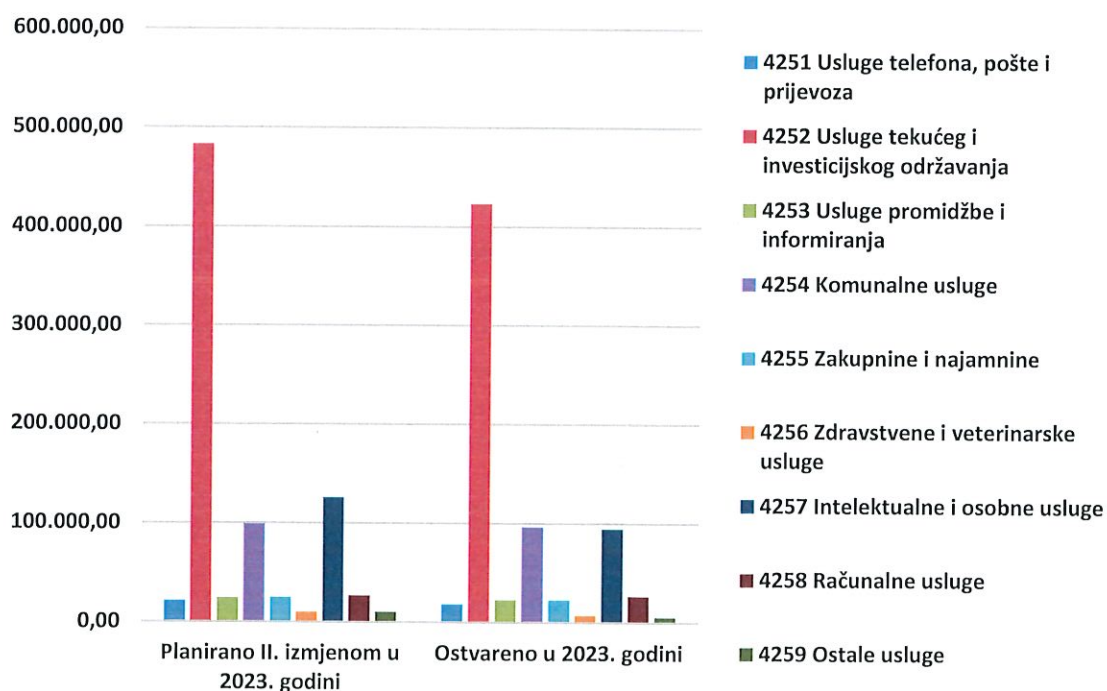

Rashodi za materijal i energiju (426) ostvareni su u iznosu od 165.749,47 eura što je 84,74% planiranog iznosa od 195.594,00 eura. Obuhvaćaju slijedeće rashode: uredski materijal i ostali materijalni rashodi – materijal za čišćenje i održavanje (4261), materijal i sirovine – materijal u slučaju onečišćenja mora (4262), energija (4263), sitni inventar i autogume (4264), gorivo za vozila i plovila (4265) i materijal za tekuće održavanje (4267).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
426 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		195.594,00	165.749,47	84,74
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – materijal za čišćenje i održavanje	7.963,00	5.716,44	71,79
4262	Materijal i sirovine – materijal u slučaju onečišćenja mora	12.609,00	7.961,70	63,14
4263	Energija	92.655,00	85.356,09	92,12
4264	Sitni inventar i autogume	24.500,00	23.587,14	96,27
4265	Gorivo za vozila i plovila	10.618,00	10.685,40	100,63
4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)	47.249,00	32.442,70	68,66


**Prikaz planiranih i ostvarenih
Rashoda za materijal i energiju
za 2023. godinu**



Ostali nespomenuti materijalni rashodi (429) ostvareni su u iznosu od 33.971,69 eura što je 99,26% planiranog iznosa od 34.225,00 eura. Obuhvaćaju slijedeće rashode: premije osiguranja (4291), reprezentaciju (4292), članarine (4293) i ostale nespomenute materijalne rashode (4295).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
429 – OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI		34.225,00	33.971,69	99,26
4291	Premije osiguranja	17.500,00	16.869,72	96,40
4292	Reprezentacija	15.000,00	15.590,98	103,94
4293	Članarine	1.062,00	1.000,00	94,16
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi – biljezi i pristojbe	663,00	510,99	77,07


**Prikaz planiranih i ostvarenih
Ostalih nespomenutih materijalnih rashoda
za 2023. godinu**



Rashodi amortizacije (43) ostvareni su u iznosu od 601.269,64 eura što je 99,12% planiranog iznosa od 606.600,00 eura.

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
43	Rashodi amortizacije	606.600,00	601.269,64	99,12


**Prikaz planiranih i ostvarenih
Rashoda amortizacije
za 2023. godinu**

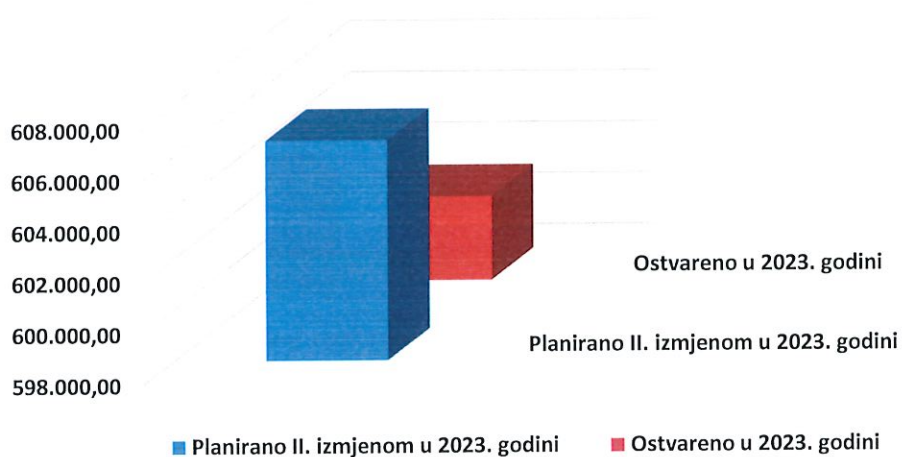

Financijski rashodi (44) ostvareni su u iznosu od 7.417,48 eura što je 64,25% planiranog iznosa od 11.545,00 eura. Obuhvaćaju slijedeće rashode: kamate na primljene kredite i zajmove (442) i ostale financijske rashode (443).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
44 – FINANCIJSKI RASHODI		11.545,00	7.417,48	64,25
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	1.150,00	887,70	77,19
443	Ostali financijski rashodi	10.395,00	6.529,78	62,82


**Prikaz planiranih i ostvarenih
Financijskih rashoda
za 2023. godinu**



Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 978,05 eura što je 26,05% planiranog iznosa od 3.754,00 eura. Obuhvaćaju ostale nespomenute rashode (462).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
46 – OSTALI RASHODI		3.754,00	978,05	26,05
462	Ostali nespomenuti prihodi	3.754,00	978,05	26,05

**Prikaz planiranih i ostvarenih
Ostalih rashoda
za 2023. godinu**

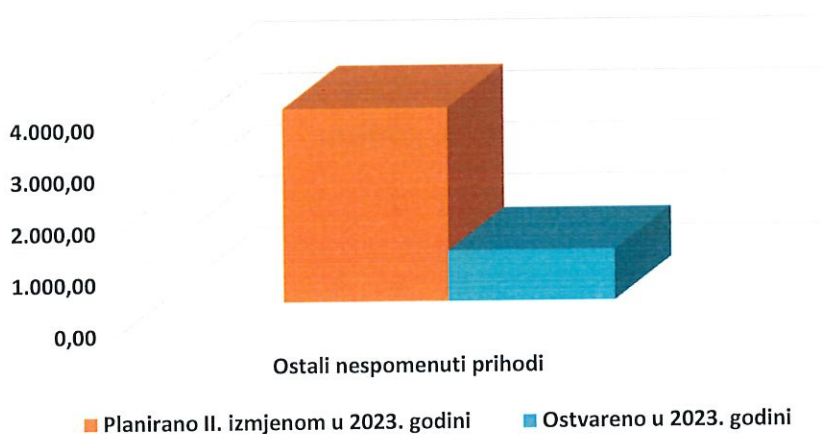


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi (05) ostvareni su u iznosu od 2.403.732,06 eura što je 53,04% planiranog iznosa od 4.532.085,00 eura.

Obuhvaćaju građevinske objekte (051), postrojenja i oprema u pripremi (052), prijevozna sredstva u pripremi (053) i ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi (055).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
05	– RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE U PRIPREMI	4.532.085,00	2.403.732,06	53,04
051	Građevinski objekti	3.580.051,00	1.891.193,16	52,83
052	Postrojenja i oprema u pripremi	98.934,00	60.141,41	60,79
053	Prijevozna sredstva u pripremi	56.389,00	51.351,87	91,07
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	796.711,00	401.045,62	50,34


**Prikaz planiranih i ostvarenih
Rashoda za nabavu nefinancijske imovine u pripremi
za 2023. godinu**

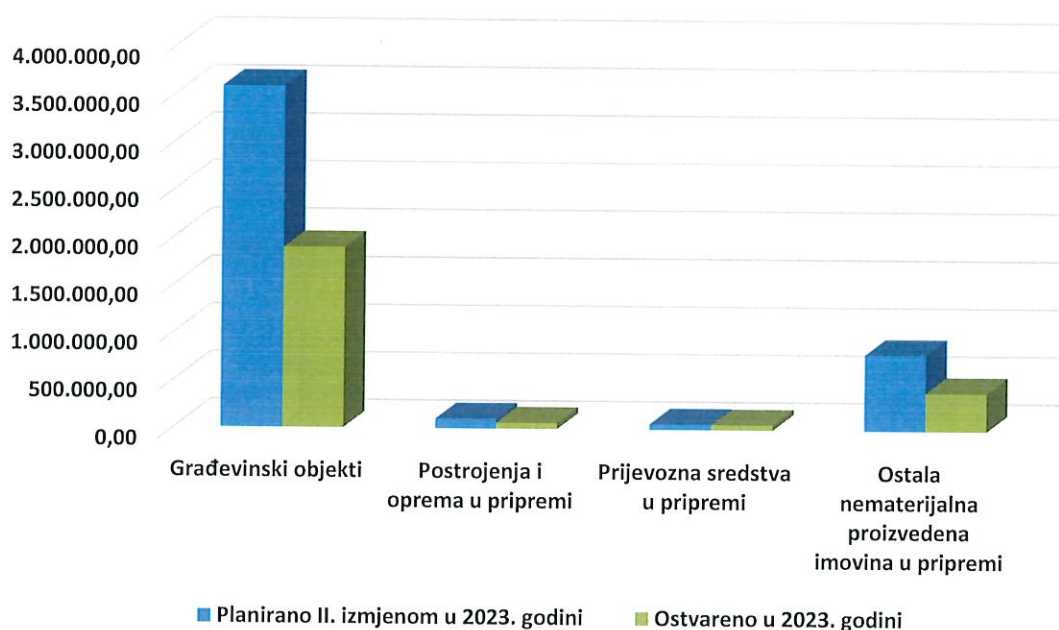

Građevinski objekti (051) ostvareni su u iznosu od 1.891.193,16 eura što je 52,83% planiranog iznosa od 3.580.051,00 eura. Obuhvaćaju ulaganja u lučku podgradnju (05131), lučku nadgradnju (05132), ulaganja u skladište, silose i garaže (05134) te EU projekt – Dogradnje luke Baška (0514).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
051 – GRAĐEVINSKI OBJEKTI		3.580.051,00	1.891.193,16	52,83
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	2.083.794,00	1.199.091,04	57,54
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	38.063,00	36.187,50	95,07
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.	25.254,00	17.250,00	68,31
0514	EU projekt – Dogradnja luke Baška	1.432.940,00	638.664,62	44,57


**Prikaz planiranih i ostvarenih
rashoda za Građevinski objekti
za 2023. godinu**

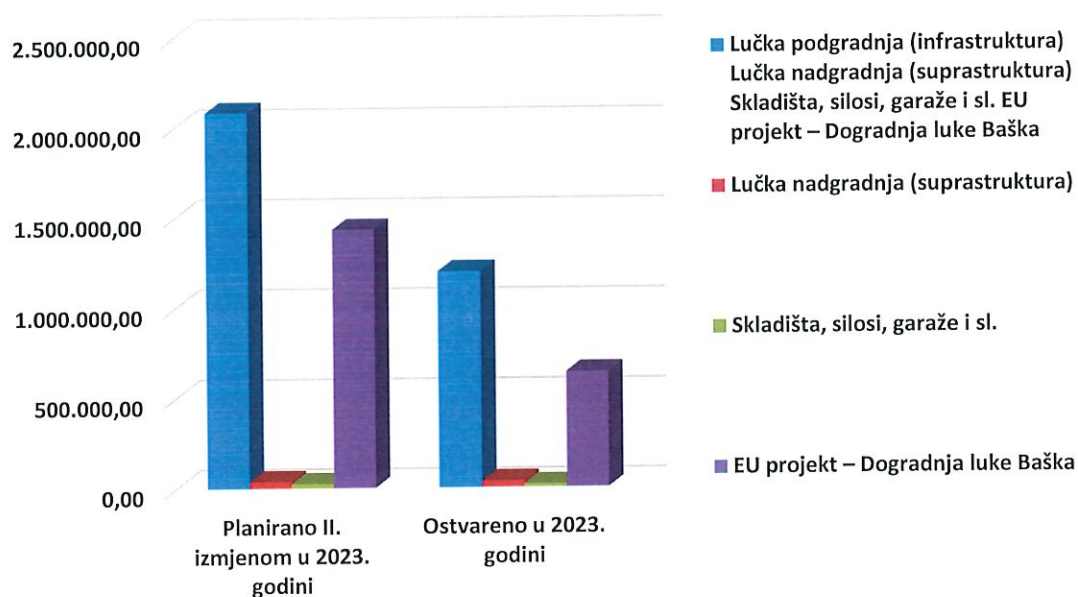

Postrojenja i oprema u pripremi (052) ostvareni su u iznosu od 60.141,41 eura što je 60,79% planiranog iznosa od 98.934,00 eura. Obuhvaćaju ulaganja u uredsku opremu i namještaj u pripremi (0521), komunikacijsku opremu u pripremi (0522) i komunalnu opremu u pripremi (0523).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
052 – POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI		98.934,00	60.141,41	60,79
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	9.290,00	2.425,00	26,10
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	12.500,00	12.471,25	99,77
0523	Komunalna oprema u pripremi	77.144,00	45.245,16	58,65


**Prikaz planiranih i ostvarenih
rashoda za Postrojenja i oprema u pripremi
za 2023. godinu**

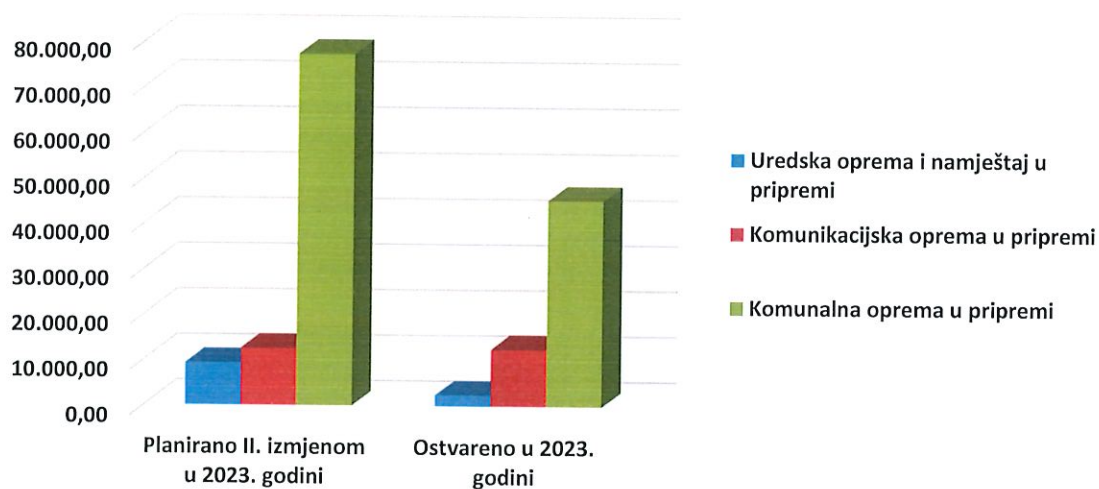

Prijevozna sredstva u pripremi (053) ostvareni su u iznosu od 56.389,00 eura što je 91,07% planiranog iznosa od 51.351,87 eura. Obuhvaćaju automobile i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu (0531) i prijevozna sredstva u pomorskom prometu (0532).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
053 – PRIJEVOZNA SREDSTVA U PRIPREMI		56.389,00	51.351,87	91,07
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	53.089,00	48.053,71	90,52
0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	3.300,00	3.298,16	99,94


**Prikaz planiranih i ostvarenih
rashoda za Prijevozna sredstva u pripremi
za 2023. godinu**

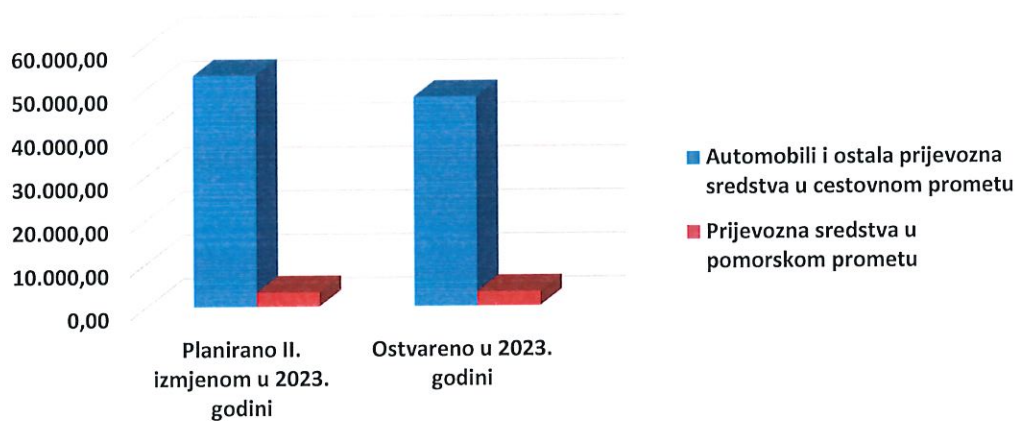


Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi (055) ostvareni su u iznosu od 401.045,62 eura što je 50,34% planiranog iznosa od 796.711,00 eura. Obuhvaća ulaganje u projektnu dokumentaciju (0552), usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata (0553) i vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata (0554).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
055	– OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA U PRIPREMI	796.711,00	401.045,62	50,34
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	722.568,00	344.091,44	47,62
0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	71.488,00	56.366,51	78,85
0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	2.655,00	587,67	22,13

**Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda
za Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u pripremi
za 2023. godinu**

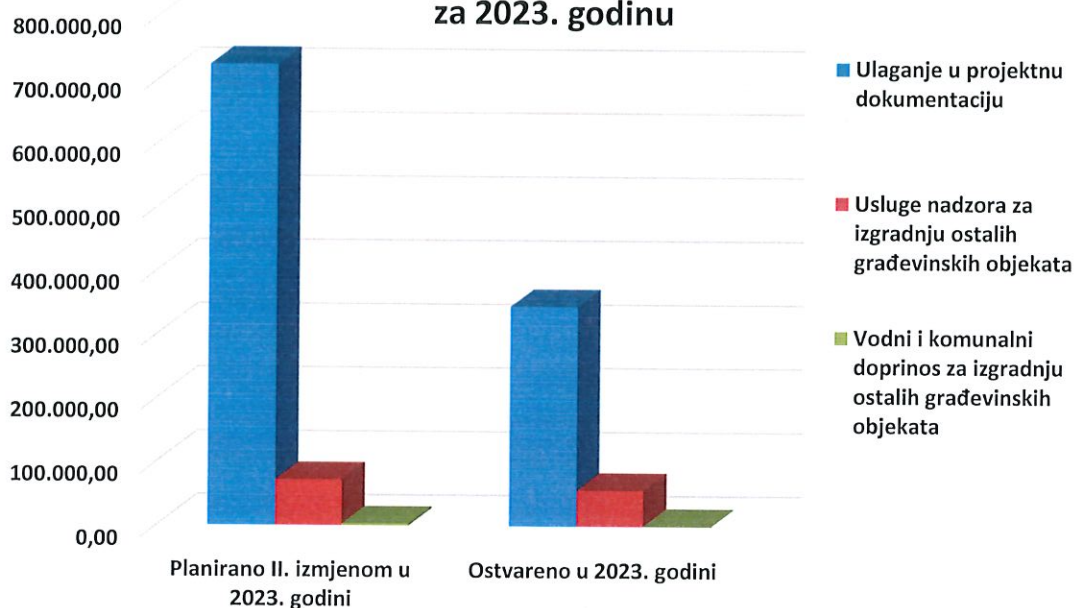

Prikaz ostvarenih rashoda ŽLU Krk u 2023. godini



Luka Krk

Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:

1. Rashodi stručnih i administrativnih poslova
2. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe
3. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave Krk s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaj za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Krk.

Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima sistematizirano 46 radnih mjesta. Zaključno s 31.12.2023. godine uz ravnatelja bilo je popunjeno i 26 radnih mjesta ugovorom o radu na neodređeno vrijeme i 5 radnih mjesta ugovorom o radu na određeno vrijeme.

Popunjena radna mjesta zaključno s 31.12.2023. godine i zapošljavanja tijekom 2023. godine prikazana su kako slijedi:

 **Ravnatelj** – 1 izvršitelj

 **Služba lučkog redarstva**

- Voditelj Službe lučkog redarstva – 1 izvršitelj
- Viši stručni suradnik za vezove – 2 izvršitelja
- Stručni suradnik za vezove – 1 izvršitelj
- Voditelj luke Valbiska – 1 izvršitelj
- Lučki redar – 21 izvršitelj

Napomena: U 2023. godini zaposleno je 6 izvršitelja (lučkih redara) ugovorom o radu na određeno vrijeme, od kojih su 2 izvršitelja bila zaposlena na period svibanj-listopad.

2 izvršitelja (lučki redar i voditelj luke Valbiska) podnijeli su sporazumni raskid ugovora o radu te je sklopljen 1 ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto voditelj luke Valbiska.

 **Služba financijsko knjigovodstvenih poslova**

1. Voditelj Službe financijsko-knjigovodstvenih poslova – 1 izvršitelj
2. Računovođa – 2 izvršitelja

Napomena: U 2023. godini zaposlen je 1 izvršitelj (računovođa) ugovorom o radu na određeno vrijeme kao zamjena za bolovanje i rodiljni dopust

 **Služba tehničkih poslova**

3. Voditelj Službe tehničkih poslova – 1 izvršitelj

 **Služba općih poslova i Služba europskih projekta i fondova**

Voditelj Službe općih poslova – 1 izvršitelj

Napomena: U 2023. godini u ožujku istekao je ugovor o radu na određeno vrijeme za izvršitelja – voditelj Službe europskih projekta i fondova

NAZIV PROGRAMA:	1. RASHODI STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA
SVRHA PROGRAMA:	Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone.
CILJ PROGRAMA:	Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	Program sadrži aktivnost i to: Rashoda ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuču, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode, financijske rashode, ostale rashode i uredska i računalna oprema. Za provedbu programa u Izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu ostvarena su sredstva u visini od 803.387,03 eura.


NAZIV PROGRAMA:	2. RASHODI EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA
SVRHA PROGRAMA:	Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama; pružanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži.

CILJ PROGRAMA: REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA:	Suradivati s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranskom županijom, jedinicama lokalne samouprave i pravnim osobama nadležnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja, ekološkim udrugama i centrima radi povećanja razine zaštite od ekoloških zagađenja, te održavanje reda u trajektnim pristaništima pogotovo tokom ljetnih mjeseci. Uskladiti potrebe jedinica lokalne samouprave sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika. Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: 1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja) i mobilnim eko-spremištima 2. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava 3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama 4. Aktivnost – Promidžba Za provedbu programa u Izvršenju Finacijskog plana za 2023. godinu ostvarena su sredstva u visini od 32.957,16 eura.
---	---

NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA:	3. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka. Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje. Uvođenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Za provedbu programa u Izvršenju Finacijskog plana za 2023. godinu ostvarena su sredstva u iznosu 3.726.788,39 eura za održavanje i razvoj lučke infrastrukture i suprastrukture i to kako slijedi:
---	---

Plan rashoda	Ostvareno u 2023. godini	Udio
Rashodi stručnih i administrativnih poslova	803.387,03	17,61%
Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe	32.957,16	0,72%
Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje	3.726.788,39	81,67%
Ukupno	4.563.132,58	

Izvršenje plana rashoda za 2023. godinu

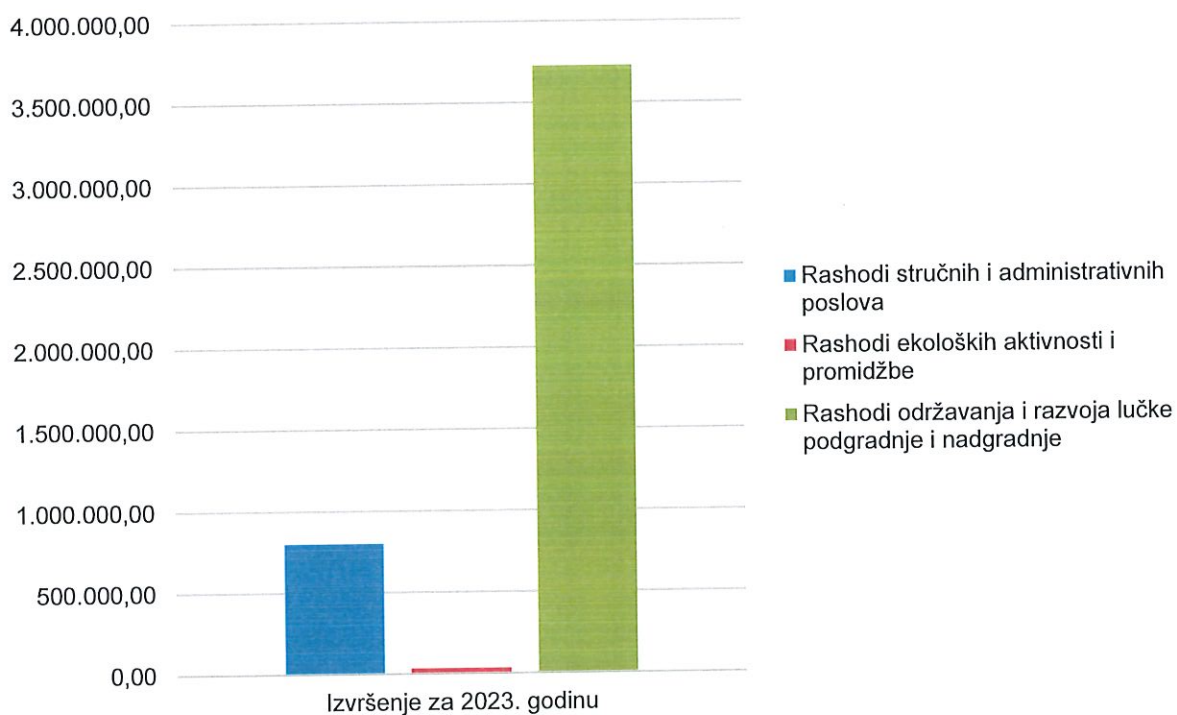

IZVRŠENJE PLANA ULAGANJA:

Prikaz ulaganja u lučku infrastrukturu – podgradnju (05131, 05132, 05134, 05141, 05142, 05143, 05144, 05145, 05146, 05147, 05148, 05224, 05231, 0552, 05531, 05532, 05541) po lukama u ukupnom iznosu od 2.353.253,35 eura.

Planirano					Ostvarenje	
Naziv luke otvorene za javni promet	Opis ulaganja	Planirani iznos ulaganja 2023. godine (EUR)	Preneseni višak iz 2022. godine (EUR)	Planirani iznos ulaganja 2023. godine I. izmjenom (EUR)	Planirani iznos ulaganja 2023. godine II. izmjenom (EUR)	Ostvareni iznos ulaganja 2023. godine (EUR)
LUKA KRK						
Rekonstrukcija luke						
	Usluga izrade izmjene i dopune idejnog projekta Rekonstrukcije luke Krk, te provedba upravnog postupka za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole (Uporabna cjelina 1) (0552)				3.440,00	3.437,50
	Usluge geodetskih radova za potrebe izmjene projekta i lokacijske dozvole Rekonstrukcije luke Krk (Uporabna cjelina 1) (0552)				1.875,00	0,00
	Upravna pristojba za izmjenu lokacijske dozvole Rekonstrukcija luke Krk (Uporabna cjelina 1) (0552)				2.800,00	2.654,46
	Usluga izrade izmjene i dopune idejnog projekta Rekonstrukcije luke Krk, te provedba upravnog postupka za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole (Uporabna cjelina 3) (0552)				4.400,00	0,00
	Upravna pristojba za izmjenu lokacijske dozvole Rekonstrukcija luke Krk (Uporabna cjelina 3) (0552)				2.800,00	0,00

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU

Ribarska luka Krk – Uporabna cjelina 1 – Faza 1 i Faza 3						
Usluge izrade izmjene glavnog projekta rekonstrukcije luke Krk – Ribarska luka Krk – Uporabna cjelina 1 – Faza 1 i Faza 3 (0552)	33.015,00	33.015,00	21.568,00	Usluge izrade izmjene glavnog projekta rekonstrukcije luke Krk – Ribarska luka Krk – Uporabna cjelina 1 – Faza 1 i Faza 3 (0552)	21.567,47	
Radovi na rekonstrukciji luke Krk – Ribarska luka Krk – Uporabna cjelina 1 – Faza 1 i Faza 3 (05131)	6.636,00	6.636,00	6.636,00	Radovi na rekonstrukciji luke Krk – Ribarska luka Krk – Uporabna cjelina 1 – Faza 1 i Faza 3 (05131)	0,00	
Usluge izrade prijavnog obrasca i dokumentacije za financiranje projekta, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo, Ribarska luka Krk (0552)	19.908,00	19.908,00	0,00			
Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za Ribarsku luku Krk (0552)			1.600,00	Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za Ribarsku luku Krk (0552)	1.600,00	
Primarni lukobran – Uporabna cjelina 1 – Faza 1 i Faza 3						
Usluge izrade izmjene i dopune glavnog projekta Rekonstrukcije luke Krk - Uporabna cjelina 1 te provedba upravnog postupka za izmjenu i dopunu građevinske dozvole (0552)			3.440,00	Usluge izrade izmjene i dopune glavnog projekta Rekonstrukcije luke Krk - Uporabna cjelina 1 te provedba upravnog postupka za izmjenu i dopunu građevinske dozvole (0552)	0,00	
Upravna pristojba za izmjenu građevinske dozvole za primarni lukobran Krk - Uporabna cjelina 1 - Faza 1 i Faza 3 (0552)			1.600,00	Upravna pristojba za izmjenu građevinske dozvole za primarni lukobran Krk - Uporabna cjelina 1 - Faza 1 i Faza 3 (0552)	0,00	
Obala Marina – Uporabna cjelina 5						
Usluge izrade izvedbenog projekta – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 5 – Obala Marina (0552)	32.384,00	32.384,00	0,00			
Usluge revizije izvedbenog projekta – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 5 – Obala Marina (0552)	3.318,00	3.318,00	0,00			
Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 5 – Obala Marina (0552)		1.327,00	1.327,00	Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 5 – Obala Marina (0552)	0,00	
Sekundarni lukobran – Uporabna cjelina 2						
Usluge izrade glavnog projekta sa svim pripadajućim dijelovima i podlogama – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran (0552)	32.352,00	32.352,00	32.352,00	Usluge izrade glavnog projekta sa svim pripadajućim dijelovima i podlogama – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran (0552)	32.187,51	

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU

	Usluga izrade geotehničkih istražnih radova – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran (0552)	32.352,00		32.352,00	32.352,00	Usluga izrade geotehničkih istražnih radova – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran (0552)	32.125,00
	Usluga izrade geodezije – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran (0552)	28.202,00		28.370,00	28.370,00	Usluga izrade geodezije – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran (0552)	28.250,00
	Usluge izrade izvedbenog projekta – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran (0552)	46.453,00		46.453,00	46.453,00	Usluge izrade izvedbenog projekta – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran (0552)	0,00
	Usluge revizije izvedbenog projekta – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran (0552)	3.318,00		3.318,00	0,00		
	Usluge izrade prijavnog obrasca i dokumentacije za financiranje projekta, zaštita lučkog akvatorija (0552)	26.545,00		26.545,00	26.545,00	Usluge izrade prijavnog obrasca i dokumentacije za financiranje projekta, zaštita lučkog akvatorija (0552)	0,00
						Elaborat optimalnog tehničkog rješenja (0552)	139,36
	Upravna pristojba za građevinsku dozvolu za sekundarni lukobran u luci Krk – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran (0552)	0,00		0,00	1.200,00	Upravna pristojba za građevinsku dozvolu za sekundarni lukobran u luci Krk – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran (0552)	584,06
Gatovi – Uporabna cjelina 3							
	Geodetska podloga – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi (0552)	1.593,00		1.593,00	4.000,00	Geodetska podloga – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi (0552)	0,00
	Maritima studija, dopuna i ažuriranje – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi (0552)	5.309,00		5.309,00	8.500,00	Maritima studija, dopuna i ažuriranje – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi (0552)	0,00
	Usluge izrade geotehničkih istražnih radova za Rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi (0552)	0,00		0,00	8.250,00	Usluge izrade geotehničkih istražnih radova za Rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi (0552)	0,00
	Usluge izrade glavnog projekta – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi (0552)	8.295,00		8.295,00	16.200,00	Usluge izrade glavnog projekta – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi (0552)	0,00
	Usluge revizije glavnog projekta – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi (0552)	2.655,00		2.655,00	2.655,00	Usluge revizije glavnog projekta – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi (0552)	0,00

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU

	Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za Rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi (0552)	0,00		0,00	1.000,00	Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za Rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi (0552)	0,00
	Usluge izrade izvedbenog projekta Rekonstrukcije luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi (0552)	0,00		0,00	8.125,00	Usluge izrade izvedbenog projekta Rekonstrukcije luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi (0552)	0,00
Rampa za osobe s invaliditetom, prilaz sekundarnom lukobranu u luci Krk							
	Usluga izrade glavnog projekta prilazne rampe za osobe s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti kao prilaz sekundarnom lukobranu u luci Krk (0552)	0,00		0,00	3.250,00	Usluga izrade glavnog projekta prilazne rampe za osobe s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti kao prilaz sekundarnom lukobranu u luci Krk (0552)	0,00
	Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za rampu za osobe s invaliditetom (0552)	0,00		0,00	150,00	Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za rampu za osobe s invaliditetom (0552)	0,00
Odvodnja i zbrinjavanje otpadnih voda na istezalištu							
	Radovi na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05131)	82.952,00		82.952,00	10.000,00	Radovi na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05131)	0,00
	Usluge geodezije, izjava ovlaštenog inženjera geodezije i snimak izvedenog stanja na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (0552)	664,00		664,00	0,00		
	Upravna pristojba za uporabnu dozvolu na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (0552)	239,00		239,00	0,00		
	Usluge stručnog nadzora na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05531)	2.522,00		2.522,00	500,00	Usluge stručnog nadzora na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05531)	0,00
	Usluge koordinatora zaštite na radu na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05531)	1.327,00		1.327,00	300,00	Usluge koordinatora zaštite na radu na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05531)	0,00
	Priključak vode na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05131)		1.991,00	1.991,00	0,00		
LUKA BAŠKA							
EU projekt - Dogradnja luke Baška 1. i 2. faza							
	EU projekt – radovi na dogradnji luke Baška 1. i 2. faza (05141)	38.086,00		1.299.521,00	1.299.521,00	EU projekt – radovi na dogradnji luke Baška 1. i 2. faza (05141)	433.620,11

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU

EU projekt – oprema na dogradnji luke Baška 1. i 2. faza (05142)			17.843,00	17.843,00	EU projekt – oprema na dogradnji luke Baška 1. i 2. faza (05142)	106.348,80
EU projekt – usluge stručnog nadzora na dogradnji luke Baška 1. i 2. faza (05143)			27.659,00	27.659,00	EU projekt – usluge stručnog nadzora na dogradnji luke Baška 1. i 2. faza (05143)	27.658,38
EU projekt – usluge projektantskog nadzora na dogradnji luke Baška 1. i 2. faza (05144)			8.097,00	8.097,00	EU projekt – usluge projektantskog nadzora na dogradnji luke Baška 1. i 2. faza (05144)	8.097,35
EU projekt – usluge voditelja projekta na dogradnji luke Baška 1. i 2. faza (05145)			8.871,00	8.871,00	EU projekt – usluge voditelja projekta na dogradnji luke Baška 1. i 2. faza (05145)	8.870,70
EU projekt – usluge administrativnog vođenja projekta na dogradnji luke Baška 1. i 2. faza (05146)			4.895,00	4.895,00	EU projekt – usluge administrativnog vođenja projekta na dogradnji luke Baška 1. i 2. faza (05146)	4.894,17
EU projekt – usluge promidžbe i vidljivosti na dogradnji luke Baška 1. i 2. faza (05147)			5.724,00	5.724,00	EU projekt – usluge promidžbe i vidljivosti na dogradnji luke Baška 1. i 2. faza (05147)	5.640,77
EU projekt – razni neprihvatljivi troškovi (05148)	15.661,00	16.060,00	50.180,00	60.330,00	EU projekt – razni neprihvatljivi troškovi (05148)	43.534,34
Rekonstrukcija luke Baška – 3. faza						
Radovi na rekonstrukciji luke Baška – 3. faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri gata okomita na njega (05131)	1.061.783,00		1.369.250,00	1.369.250,00	Radovi na rekonstrukciji luke Baška – 3. faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri gata okomita na njega (05131)	698.291,52
Usluge stručnog nadzora na dogradnji luke Baška – 3. faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri gata okomita na njega (05531)	32.351,00		32.188,00	32.188,00	Usluge stručnog nadzora na dogradnji luke Baška – 3. faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri gata okomita na njega (05531)	26.822,95
Usluge koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova na dogradnji luke Baška – 3. faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri gata okomita na njega (05531)	4.778,00		4.778,00	4.778,00	Usluge koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova na dogradnji luke Baška – 3. faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri gata okomita na njega (05531)	1.875,00
Usluge projektantskog nadzora na dogradnji luke Baška – 3. faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri gata okomita na njega (05532)	10.784,00		10.784,00	10.784,00	Usluge projektantskog nadzora na dogradnji luke Baška – 3. faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri gata okomita na njega (05532)	5.374,89
Usluge hidrografske izmjere za rekonstrukciju luke Baška – 3. faza (prije početka radova) (0552)	2.820,00		2.820,00	0,00		
Usluge hidrografske izmjere za rekonstrukciju luke Baška – 3. faza (nakon izvođenja radova) (0552)	5.309,00		5.309,00	0,00		
Usluge izrade geodetskog snimka izvedenog stanja i Izjava ovlaštenog inženjera geodezije za rekonstrukciju luke Baška – 3. faza (0552)	531,00		531,00	0,00		

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU

	Usluge izrade projekta sidrenog sustava rekonstrukcije luke Baška (0552)	4.380,00		4.380,00	Usluge izrade projekta sidrenog sustava rekonstrukcije luke Baška (0552)	4.380,00	4.375,00
	Priključak struje za rekonstrukciju luke Baška - 3. faza (05131)	13.538,00		13.538,00	Priključak struje za rekonstrukciju luke Baška - 3. faza (05131)	13.538,00	0,00
	Radovi na izradi sidrenog sustava na rekonstrukciji luke Baška - 3. faza (05131)				Radovi na izradi sidrenog sustava na rekonstrukciji luke Baška - 3. faza (05131)	177.500,00	0,00
Rekonstrukcija luke Baška - 4. faza							
	Usluge izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju luke Baška - 4. faza (0552)	16.458,00		16.458,00	Usluge izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju luke Baška - 4. faza (0552)	16.375,00	16.375,00
	Usluge izrade izmjene i dopune glavnog projekta i građevinske dozvole za rekonstrukciju luke Baška - 4. faza (0552)	2.489,00		2.489,00		0,00	
	Radovi na rekonstrukciji luke Baška - 4. faza - izgradnja gata ispred Stare rive te gata „T“ tlorcta u akvatoriju između Garofulina i Stare rive (05131)	26.545,00		26.545,00	Radovi na rekonstrukciji luke Baška - 4. faza - izgradnja gata ispred Stare rive te gata „T“ tlorcta u akvatoriju između Garofulina i Stare rive (05131)	5.000,00	0,00
	Usluge hidrografske izmjere rekonstrukcije luke Baška - 4. faza (prije početka radova) (0552)	2.820,00		0,00		0,00	
	Usluge stručnog nadzora na dogradnji luke Baška - 4. faza - izgradnja gata ispred Stare rive te gata „T“ tlorcta u akvatoriju između Garofulina i Stare rive (05531)	1.195,00		1.195,00	Usluge stručnog nadzora na dogradnji luke Baška - 4. faza - izgradnja gata ispred Stare rive te gata „T“ tlorcta u akvatoriju između Garofulina i Stare rive (05531)	625,00	0,00
LUKA OMIŠALJ							
Plutajući ponton							
	Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za postavljanje plutajućeg pontona (0552)		133,00	133,00	Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za postavljanje plutajućeg pontona (0552)	133,00	106,18
	Nabava i montaža plutajućeg pontona u dužini od 60 m (05131)		195.454,00	195.454,00	Nabava i montaža plutajućeg pontona u dužini od 60 m (05131)	195.454,00	194.523,56
	Izrada elektro, vodovodne i hidrauličke instalacije do pontona (05131)		24.554,00	24.554,00		0,00	
	Usluge geodetskih radova za iskošenje za postavljanje plutajućeg pontona (0552)			250,00	Usluge geodetskih radova za iskošenje za postavljanje plutajućeg pontona (0552)	250,00	250,00
	Usluge stručnog nadzora nad radovima za nabavu i montažu plutajućeg pontona (05531)		5.309,00	5.309,00	Usluge stručnog nadzora nad radovima za nabavu i montažu plutajućeg pontona (05531)	5.309,00	5.308,75

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU

Usluge koordinatora zaštite na radu za nabavu i postavljanje plutajućeg pontona (05531)	3.849,00		3.849,00	0,00		
Usluge projektantskog nadzora za nabavu i postavljanje plutajućeg pontona (05532)			1.500,00	1.500,00		1.500,00
Upravna pristojba za uporabnu dozvolu za postavljanje plutajućeg pontona (0552)			0,00	200,00		0,00
						2.116,25
Plutajući ponton (drugi)						
Usluge hidroarheološkog istraživanja (0552)			0,00	2.500,00		0,00
Usluge izrade glavnog projekta za nabavu i montažu plutajućeg pontona u luci Omišalj (Pesja) (0552)	7.963,00		7.963,00	7.963,00		0,00
Usluge izrade geodetske podloge za nabavu i montažu plutajućeg pontona u luci Omišalj (Pesja) (0552)	2.256,00		2.256,00	2.256,00		0,00
Usluge izrade i dopune ažuriranja maritimne studije za nabavu i montažu plutajućeg pontona u luci Omišalj (Pesja) (0552)	4.645,00		4.645,00	4.645,00		0,00
Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za nabavu i montažu plutajućeg pontona u luci Omišalj (Pesja) (0552)			133,00	133,00		0,00
Uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice						
Geodetska podloga za izradu glavnog projekta za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice (0552)	2.655,00		2.655,00	2.655,00		1.500,00
Usluge izrade elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice (0552)			0,00	3.315,00		0,00
Usluge izrade idejnog rješenja za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice (0552)			5.807,00	0,00		
Usluge izrade glavnog projekta uređenja obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice (0552)	13.272,00		13.272,00	13.272,00		0,00

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU

	Usluge izrade revizije glavnog projekta za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice (0552)			0,00	2.000,00	Usluge izrade revizije glavnog projekta za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice (0552)	0,00		0,00
	Usluge izrade geotehničkih istražnih radova za potrebe izrade glavnog projekta za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice (0552)				10.000,00	Usluge izrade geotehničkih istražnih radova za potrebe izrade glavnog projekta za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice (0552)	0,00		9.875,00
	Usluge ažuriranja maritimne studije za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice (0552)				4.750,00	Usluge ažuriranja maritimne studije za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice (0552)	0,00		0,00
	Upravna pristojba za građevinsku dozvolu za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice (0552)				1.000,00	Upravna pristojba za građevinsku dozvolu za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice (0552)	0,00		0,00
LUKA PORAT									
Rekonstrukcija luke - I faza - 2. uporabna cjelina									
	Radovi na rekonstrukciji luke Porat – I faza – 2. uporabna cjelina (05131) - ostatak			78.822,00	78.822,00	Radovi na rekonstrukciji luke Porat – I faza – 2. uporabna cjelina (05131) - ostatak			78.821,46
	Usluge stručnog nadzora na rekonstrukciji luke Porat – I faza – 2. uporabna cjelina (05531) - ostatak			7.698,00	7.698,00	Usluge stručnog nadzora na rekonstrukciji luke Porat – I faza – 2. uporabna cjelina (05531) - ostatak			7.697,93
	Usluge koordinatora zaštite na radu na rekonstrukciji luke Porat – I faza – 2. uporabna cjelina (05531) - ostatak			1.991,00	1.330,00	Usluge koordinatora zaštite na radu na rekonstrukciji luke Porat – I faza – 2. uporabna cjelina (05531) - ostatak			1.327,22
	Usluge projektantskog nadzora na rekonstrukciji luke Porat – I faza – 2. uporabna cjelina (05532) - ostatak			1.337,00	1.337,00	Usluge projektantskog nadzora na rekonstrukciji luke Porat – I faza – 2. uporabna cjelina (05532) - ostatak			1.320,59
	Usluge izrade parcelacijskog elaborata nakon građevinske dozvole, snimak izvedenog stanja, Izjava ovlaštenog inženjera o usklađenosti izvedenog stanja i geodetskog projekta, hidrografska izmjera nakon izvedenih radova (batimetrija) – ostatak (dio planiran u 2022. g.) (0552)	1.991,00	3.318,00	5.973,00	5.973,00	Usluge izrade parcelacijskog elaborata nakon građevinske dozvole, snimak izvedenog stanja, Izjava ovlaštenog inženjera o usklađenosti izvedenog stanja i geodetskog projekta, hidrografska izmjera nakon izvedenih radova (batimetrija) – ostatak (dio planiran u 2022. g.) (0552)			3.250,00
	Usluge izrade geodetskog elaborata za formiranje čestice (0552)			750,00	750,00	Usluge izrade geodetskog elaborata za formiranje čestice (0552)			0,00

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU

Upravna pristojba za izdavanje uporabne dozvole rekonstrukcije luke Porat – I faza – 2. uporabna cjelina (0552)	345,00	345,00	234,00	Upravna pristojba za izdavanje uporabne dozvole rekonstrukcije luke Porat – I faza – 2. uporabna cjelina (0552)	233,35
Rekonstrukcija luke - I faza – 3. uporabna cjelina					
Usluge izrade izmjene idejnog projekta (0552)			6.250,00	Usluge izrade izmjene idejnog projekta (0552)	0,00
Geodetski elaborat za provedbu lokacijske dozvole za rekonstrukciju luke Porat (0552)			2.500,00	Geodetski elaborat za provedbu lokacijske dozvole za rekonstrukciju luke Porat (0552)	0,00
Usluge izrade ažuriranja maritimne studije (0552)			4.750,00	Usluge izrade ažuriranja maritimne studije (0552)	0,00
LUKA NJIVICE					
Sidreni sustav					
Izrada sidrenog sustava ispred hotela Jadran (10 vezova) (05131)	9.954,00	9.954,00	9.954,00	Izrada sidrenog sustava ispred hotela Jadran (10 vezova) (05131)	9.987,50
LUKA PUNAT					
Rekonstrukcija - dogradnja dva gata na području Vele Vode					
Usluge izrade geodetskog i hidrografskog snimanja za rekonstrukciju – dogradnja dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)	3.069,00		3.069,00	Usluge izrade geodetskog i hidrografskog snimanja za rekonstrukciju – dogradnja dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)	3.069,21
Usluge geomehaničkih istražnih radova za rekonstrukciju – dogradnju dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)	7.466,00		22.375,00	Usluge geomehaničkih istražnih radova za rekonstrukciju – dogradnju dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)	21.750,00
Usluge ažuriranja i dopuna maritimne studije za rekonstrukciju – dogradnju dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)	5.309,00		0,00		
Usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije – dogradnja dva gata na području Vele vode u luci Punat i elaborat sidrenog sustava (0552)	13.604,00		13.604,00	Usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije – dogradnja dva gata na području Vele vode u luci Punat i elaborat sidrenog sustava (0552)	0,00
Usluge revizije glavnog projekta rekonstrukcije – dogradnje dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)	3.318,00		3.318,00	Usluge revizije glavnog projekta rekonstrukcije – dogradnje dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)	0,00
Usluge izrada elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za			0,00	Usluge izrada elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za	1.987,50

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU

rekonstrukciju i dogradnju dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)					rekonstrukciju i dogradnju dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)	
Usluga izrade izvedbenog projekta rekonstrukcije – dogradnje dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)	7.466,00			7.466,00	0,00	
Usluge revizije izvedbenog projekta rekonstrukcije – dogradnje dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)	2.489,00			2.489,00	0,00	
Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju – dogradnja dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)	266,00			531,00	531,00	0,00
Plutajući ponton						
Usluge izrade idejnog rješenja za plutajući ponton u luci Punat (0552)				0,00	3.250,00	3.250,00
Usluga izrade geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole za plutajući ponton u luci Punat (0552)				0,00	2.500,00	0,00
Usluga izrade maritimne studije za dobavu i montažu plutajućeg pontona u luci Punat (0552)				0,00	4.750,00	0,00
Usluge izrade glavnog projekta za dobavu i montažu plutajućeg pontona u luci Punat (0552)				0,00	8.000,00	0,00
Upravna pristojba za građevinsku dozvolu za plutajući ponton u luci Punat (0552)				0,00	150,00	0,00
LUKA MALINSKA						
Rekonstrukcija i dogradnja primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza						
Usluge izrade glavnog projekta i vođenje postupka ishođenja građevinske dozvole rekonstrukcije i dogradnje primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza (0552)		154.290,00		154.290,00	154.290,00	108.003,19
Usluge izrada elaborata za ocjenu o potrebi izrade procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje primarnog lukobrana		2.265,00		2.265,00	2.265,00	2.264,58

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU

	i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza (0552) - ostatak					lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza (0552) - ostatak	
	Usluge revizije glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza (0552)	6.626,00	6.626,00	6.626,00	6.626,00	Usluge revizije glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza (0552)	0,00
	Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole rekonstrukcije i dogradnje primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza (0552)	1.593,00	1.593,00	1.593,00	2.500,00	Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole rekonstrukcije i dogradnje primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza (0552)	0,00
Plutajući ponton za ribare							
	Usluge izrade geodetske podloge za potrebe izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za dobavu i montažu plutajućeg pontona za ribare (0552)			0,00	2.500,00	Usluge izrade geodetske podloge za potrebe izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za dobavu i montažu plutajućeg pontona za ribare (0552)	0,00
	Usluge izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za dobavu i montažu plutajućeg pontona za ribare (0552)			0,00	5.000,00	Usluge izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za dobavu i montažu plutajućeg pontona za ribare (0552)	0,00
	Upravna pristojba za izdavanje lokacijske dozvole za plutajući ponton za ribare (0552)			0,00	150,00	Upravna pristojba za izdavanje lokacijske dozvole za plutajući ponton za ribare (0552)	0,00
	Usluge izrade projekta sidrenja za plutajući ponton (0552)			0,00	4.375,00	Usluge izrade projekta sidrenja za plutajući ponton (0552)	0,00
	Usluge nabave i montaže plutajućeg pontona (05131)			0,00	31.250,00	Usluge nabave i montaže plutajućeg pontona (05131)	31.112,50
LUKA GLAVOTOK							
Rekonstrukcija operativnog gata							
	Radovi za rekonstrukciju operativnog gata u luci Glavotok (05131)		136.999,00	136.999,00	136.999,00	Radovi za rekonstrukciju operativnog gata u luci Glavotok (05131)	136.997,97
	Usluge stručnog nadzora za rekonstrukciju operativnog gata u luci Glavotok (05531)		2.281,00	2.281,00	2.281,00	Usluge stručnog nadzora za rekonstrukciju operativnog gata u luci Glavotok (05531)	2.281,18
	Usluge izrade snimka izvedenog stanja, izjava ovlaštenog inženjera geodezije o usklađenosti izvedenog stanja i geodetskog projekta, hidrografska izmjera nakon izvedenih radova (batimetrija) za rekonstrukciju operativnog gata (0552)	2.655,00		664,00	664,00	Usluge izrade snimka izvedenog stanja, izjava ovlaštenog inženjera geodezije o usklađenosti izvedenog stanja i geodetskog projekta, hidrografska izmjera nakon izvedenih radova (batimetrija) za rekonstrukciju operativnog gata (0552)	625,00

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU

Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju operativnog gata u luci Glavotok (0552)	266,00	266,00	133,00	Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju operativnog gata u luci Glavotok (0552)	132,72
LUKA VOZ					
Rekonstrukcija operativnog gata					
Priključak struje za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (05131)	17.918,00	17.918,00	0,00		
Priključak vode za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (05131)	2.655,00	2.655,00	0,00		
Usluge izrade glavnog projekta za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (0552)	11.547,00	11.547,00	11.547,00	Usluge izrade glavnog projekta za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (0552)	11.537,50
Usluge geodezije projekta za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (0552)	1.858,00	1.858,00	1.858,00	Usluge geodezije projekta za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (0552)	1.858,13
Usluge geomehaničkih istražnih radova za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (0552)	3.318,00	3.318,00	3.318,00	Usluge geomehaničkih istražnih radova za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (0552)	3.235,11
Usluge izrade maritimne studije za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (0552)	7.565,00	7.565,00	7.565,00	Usluge izrade maritimne studije za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (0552)	7.548,61
Usluge revizije glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija i geotehničkih konstrukcija za projekt Rekonstrukcija operativnog gata u luci Voz (0552)	2.522,00	2.522,00	2.522,00	Usluge revizije glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija i geotehničkih konstrukcija za projekt Rekonstrukcija operativnog gata u luci Voz (0552)	2.250,00
Usluge izrade elaborata o ocjeni o potrebi izrade utjecaja na okoliš za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (0552)	3.318,00	3.318,00	0,00		
Usluga izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (ostatak, u 2022. godini planirano 7.565,00 eura) (0552)	3.550,00	7.565,00	11.116,00	Usluga izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (ostatak, u 2022. godini planirano 7.565,00 eura) (0552)	0,00
Usluge revizije izvedbenog projekta za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (ostatak, u 2022. godini planirano 1.725,00 eura) (0552)	763,00	1.725,00	2.489,00	Usluge revizije izvedbenog projekta za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (ostatak, u 2022. godini planirano 1.725,00 eura) (0552)	0,00

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU

Priprema poslovnog plana za prijavu na natječaj Ministarstva poljoprivrede, Uprava za ribarstvo (0552)	16.590,00	16.590,00	16.590,00	Priprema poslovnog plana za prijavu na natječaj Ministarstva poljoprivrede, Uprava za ribarstvo (0552)	0,00
Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju operativnog gata (0552)	266,00	266,00	266,00	Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju operativnog gata (0552)	0,00
LUKA VELA JANA					
Rekonstrukcija luke					
Radovi na rekonstrukciji luke Vela Jana (jedna faza – dio) (05131)	78.285,00		67.589,00	0,00	
Usluga izrade izvedbenog projekta rekonstrukcije luke Vela Jana (jedna faza) (0552)	8.627,00		8.627,00	0,00	
Geodetski radovi za potrebe izrade idejnog i glavnog projekta za građenje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja luke Vela Jana (0552)			0,00	4.375,00	0,00
LUKA SVETA FUSKA					
Rekonstrukcija luke					
Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju luke Sveta Fuska (0552)	132.723,00		6.636,00	6.636,00	0,00
Nabava i montaža dizalice					
Usluge izrade geodetske podloge za nabavu i montažu dizalice (0552)			1.161,00	1.161,00	1.125,00
Usluge izrade glavnog projekta temelja za montažu dizalice (0552)			6.371,00	6.371,00	6.370,00
Nabava i montaža dizalice (05132)			38.063,00	38.063,00	36.187,50
Usluge atestiranja dizalice i izdavanje dozvole za rad dizalice (0552)			0,00	625,00	0,00
Radovi za temelje radi montažu dizalice (05131)			11.597,00	11.597,00	11.522,73
Usluge stručnog nadzora za radove na temeljima za postavljanje dizalice (05531)			1.858,00	1.858,00	1.858,00

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU


LUKA ŠILO						
Rekonstrukcija luke						
Usluge dopune idejnog rješenja rekonstrukcije luke Šilo (0552)			3.250,00		Usluge dopune idejnog rješenja rekonstrukcije luke Šilo (0552)	3.250,00
LUKA VRBNIK						
Dogradnja luke L1 i L2 faza						
Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole dogradnje luke – L1 faza (0552)	1.845,00		1.845,00		Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole dogradnje luke – L1 faza (0552)	1.844,85
Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole dogradnje luke – L2 faza (0552)	239,00		239,00		Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole dogradnje luke – L2 faza (0552)	238,90
Studija izvodljivosti za pripremu projekta Rekonstrukcije luke Vrbnik – Faza L1 na natječaj – zaštita lučkog akvatorija i izgradnja komunalnih vezova (0552)			0,00	27.000,00	Studija izvodljivosti za pripremu projekta Rekonstrukcije luke Vrbnik – Faza L1 na natječaj – zaštita lučkog akvatorija i izgradnja komunalnih vezova (0552)	0,00
LUKA VALBISKA						
Izrada natkrivenog prostora za prijem vozila Hitne pomoći						
Radovi na izradi natkrivenog prostora za prijem vozila Hitne pomoći (05131)			18.000,00	27.010,00	Radovi na izradi natkrivenog prostora za prijem vozila Hitne pomoći (05131)	27.310,05
Usluge izrade glavnog građevinskog projekta s troškovnikom za izradu natkrivenog prostora za prijem vozila Hitne pomoći (0552)			2.875,00	2.875,00	Usluge izrade glavnog građevinskog projekta s troškovnikom za izradu natkrivenog prostora za prijem vozila Hitne pomoći (0552)	2.875,00
Usluge geodetskog snimka stvarnog stanja u svrhu projektiranja metalne nadstrešnice za prijem vozila Hitne pomoći (0552)			250,00	250,00	Usluge geodetskog snimka stvarnog stanja u svrhu projektiranja metalne nadstrešnice za prijem vozila Hitne pomoći (0552)	250,00
Upravna pristojba za potvrdu glavnog projekta za izradu natkrivenog prostora za prijem vozila Hitne pomoći (0552)			133,00	133,00	Upravna pristojba za potvrdu glavnog projekta za izradu natkrivenog prostora za prijem vozila Hitne pomoći (0552)	0,00
Usluge stručnog nadzora za izradu natkrivenog prostora za prijem vozila Hitne pomoći (05531)			1.000,00	1.000,00	Usluge stručnog nadzora za izradu natkrivenog prostora za prijem vozila Hitne pomoći (05531)	1.000,00
Nabava i postavljanje prijenosne kamene kućice						
Radovi na uređenju platoa za montažu kućice u Valbiski (05131)			10.784,00	10.784,00	Radovi na uređenju platoa za montažu kućice u Valbiski (05131)	10.623,75

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2023. GODINU

	Nabava i montaža kućice u Valbiski (05134)		17.254,00	17.254,00	Nabava i montaža kućice u Valbiski (05134)	17.250,00
LUKE NA PODRUČJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK						
Komunalna oprema						
	Komunalna oprema na lučkom području – kolica za brodice na istezalištu, ormarići za vodu, ormarići za struju i vodu, usporivači za kolnik, solarne lampe za valobran, agregat, inox polirani stupi, interpretacijska tabla za Porat i Glavotok (05231)	38.530,00	34.395,00	33.683,00	Komunalna oprema na lučkom području – kolica za brodice na istezalištu, ormarići za vodu, ormarići za struju i vodu, usporivači za kolnik, agregat, inox polirani stupi, interpretacijska tabla za Porat i Glavotok (05231)	28.853,43
	Lučko svjetlo u luci Vrbnik, solarne lampe za lučko svjetlo u Vrbniku i ograda na kuli lučkog svjetla u Klimnu (05231)	11.191,00	14.641,00	14.641,00	Lučko svjetlo u luci Vrbnik i solarne lampe za lučko svjetlo u Vrbniku (05231)	12.815,19
	Koševi za otpatke i klupe u luci Porat (na I fazi – 2. uporabna cjelina) (05231)		0,00	2.910,00	Koševi za otpatke i klupe u luci Porat (na I fazi – 2. uporabna cjelina) (05231)	2.908,55
	Betonske klupice i betonski stol u luci Vela Jana (05231)		0,00	1.400,00	Betonske klupice i betonski stol u luci Vela Jana (05231)	0,00
	Solarna lampa i rasvjetni stup u luci Klimno (05231)		0,00	668,00	Solarna lampa i rasvjetni stup u luci Klimno (05231)	667,99
	Nabava i montaža kamenih klupica na operativnom gatu u luci Glavotok (05231)		0,00	3.000,00	Nabava i montaža kamenih klupica na operativnom gatu u luci Glavotok (05231)	0,00
	Ormarići za struju („pametni“) u luci Malinska i Omišalj (05231)		0,00	17.500,00	Ormarići za struju („pametni“) u luci Malinska i Omišalj (05231)	0,00
	Rampa u luci Valbiska (05231)		0,00	3.342,00	Rampa u luci Valbiska (05231)	0,00
Prijevozna sredstva u pomorskom prometu						
	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu (motor za plovilo) (0532)	2.642,00	2.642,00	3.300,00	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu (motor za plovilo) (0532)	3.298,16
Skladišta, silosi, garaže i sl.						
	Brodski kontejneri za svrhu korištenja kao skladišnog prostora u luci Valbiska i Omišalj (05134)		0,00	8.000,00	Brodski kontejneri za svrhu korištenja kao skladišnog prostora u luci Valbiska i Omišalj (05134)	0,00
Sustav video nadzora						
	Postavljanje kamera u luci Malinska (05224)		0,00	12.500,00	Postavljanje kamera u luci Malinska (05224)	12.471,25
Ostala projektna dokumentacija						
	Ostala projektna dokumentacija (0552)	6.636,00	6.636,00	6.636,00	Ostala projektna dokumentacija (0552)	0,00

Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata				
	Vodni doprinos po građevinskim dozvolama (Krk, Voz, Punat i Malinska) – (05541)	2.655,00	2.655,00	Vodni doprinos po građevinskim dozvolama (Krk i Omišalj) – (05541)
				587,67

Luka	Ostvareni iznos ulaganja u 2023. godini	Udio
Krk	122.545,36	5,21%
Baška	1.391.778,98	59,14%
Omišalj	215.179,74	9,14%
Porat	92.650,55	3,94%
Njivice	9.887,50	0,42%
Punat	30.056,71	1,28%
Malinska	141.380,27	6,01%
Glavotok	140.036,87	5,95%
Voz	26.429,35	1,12%
Vela Jana	0,00	0,00%
Sveta Fuska	57.063,23	2,42%
Šilo	3.250,00	0,14%
Vrbnik	2.083,75	0,09%
Valbiska	59.308,80	2,52%
Luke na području ŽLU Krk - ostalo	61.602,24	2,62%
UKUPNO	2.353.253,35	

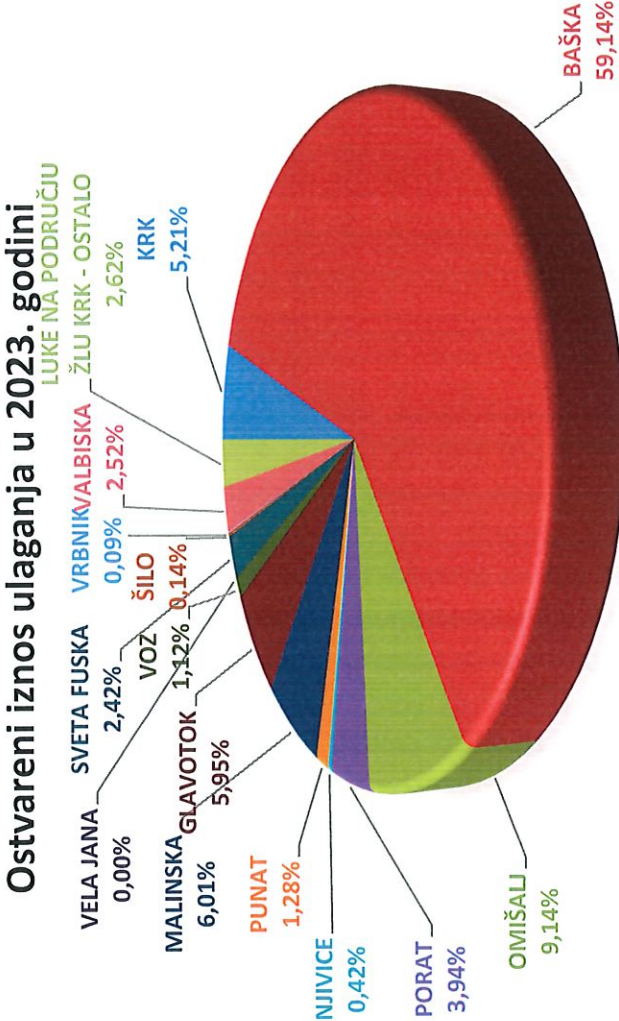

OSTVARENJE ULAGANJA U LUČKU PODGRADNJU I NADGRADNJU:**1. LUKA: BAŠKA****1.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:****1.1.1. Naziv projekta: EU projekt – Dogradnja luke Baška 1. i 2. faza**

Opis projekta: Projektom Rekonstrukcija luke Baška - 1. Faza (Vela riva) i 2. Faza (Mala riva) obuhvaćeno je:

- 1. faza – produženje primarnog lukobrana - Vela riva. Primarni lukobran produžen je za cca 50,00 m', a izveden je tlocrtno zakrivljenog oblika i prati približno oblik postojećeg lukobrana te ima proširenu glavu na koju je postavljeno novo lučko svjetlo. Izveden je kao nasuti lukobran što podrazumijeva masivni betonski zid na temeljnom nasipu s unutarnje strane te kamena obalozaštita – školjera s vanjske strane. Primarni lukobran je obložen kamenim poklopnica i obložnicama te je opremljen bitvama, mornarskim stepenicama, ormarićima za napajanje plovila strujom i vodom i hidrantom.
- 2. faza – produženje sekundarnog lukobrana - Mala riva. Sekundarni lukobran – Mala riva produžila se u dužini od 105,00 m' i širine 6,00 m' što znači da je novi dio Male rive uži od starog dijela i tlocrtno je zakrivljenog oblika. Novi dio sekundarnog lukobran izveo se kao rasčlanjena konstrukcija, dubinski temeljena na „Benotto“ pilotima, djelomično propustan radi cirkulacije mora unutar luke, s valobranim ekranima. Produžetak sekundarnog lukobrana završno je obložen kamenim poklopnica i obložnicama te je opremljen lučkim svjetlom, bitvama, mornarskim stepenicama, ormarićima za napajanje plovila strujom i vodom i hidrantom.

Cilj projekta: Dogradnja luke Baške – 1. i 2. Faza – obzirom da je luka Baška bila nesigurna luka i nezaštićena od vjetrova i valova, projektom zaštitit će se akvatorij luke.

Provedba projekta: Za investiciju rekonstrukcija i dogradnja luke Baška I (dogradnja primarnog lukobrana Vela riva) i II faza (produženje sekundarnog lukobrana Mala riva) potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020, KK.07.4.1.04.0010 - Dogradnja luke Baška sklopljen je dana 9. rujna 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 41.166.298,55 kuna, a prethodno navedenim Ugovorom ŽLU KRK su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 39.709.975,94 kuna, odnosno u cijelosti su pokriveni pozivom definirani prihvatljivi troškovi.

Izvori financiranja su: 85% iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa) i 15% iz državnog proračuna.

- U mjesecu prosincu 2019. godini pokrenut je postupak jednostavne nabave za usluge administrativnog vođenja projekta dogradnje luke Baška, a početkom 2020. godine je sklopljen ugovor sa tvrtkom Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 118.000,00 kn bez PDV-a (15.661,29 eura), odnosno 147.500,00 kn (19.576,61 eura) sa PDV-om. U 2023. godini izvršene su usluge u iznosu od 4.894,17 eura s PDV-om.
- Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za uslugu provedbe promotivne kampanje u 2020. godini sklopljen je ugovor s tvrtkom TRI i d.o.o. iz Punat u iznosu 109.510,00 kn (14.534,47 eura) bez PDV-a, odnosno 136.887,50 kn (18.168,09 eura) s PDV-om. U 2023. godini izvršene su usluge prema okončanoj situaciji u iznosu od 5.640,77 eura s PDV-om.
- Nakon provedenog postupka javne nabave radi odabira izvođača radova potpisan je ugovor za radove na dogradnji luke Baška s Zajednicom ponuditelja Aqua Mont Service d.o.o. iz Beograda i Aqua Mont Service d.o.o. za usluge iz Splita. Ugovor je potpisan dana 22. listopada 2020. godine u iznosu 26.600.000,00 kn (3.530.426,70 eura) bez PDV-a, odnosno 33.250.000,00 kn (4.413.033,38 eura) s PDV-om. Rok za izvođenje svih radova je 18 mjeseci od dana uvođenja u posao, te je očekivani rok dovršetka 01.01.2023. godine. Dodatkom 1. Ugovora o javnoj nabavi radova na dogradnji luke Baška sklopljenog dana 28. veljače 2022. godine promijenjena je tehnologija izvođenja radova te je izmijenjena cijena radova koja ukupno iznosi 26.593.542,20 kuna (3.529.569,61 eura) bez PDV-a odnosno 33.241.927,70 kuna (4.411.962,00 eura) s PDV-om. Dodatkom 2. Ugovora sklopljenog 16. kolovoza 2022. godine ugovoreni su dodatni radovi te je izmijenjena cijena radova koja ukupno iznosi 26.823.108,26 kuna (3.560.038,26 eura) bez PDV-a odnosno 33.528.885,32 kuna (4.450.047,82 eura) s PDV-om. Dodatkom 3. Ugovora sklopljenog dana 20. prosinca 2022. godine uveo se novi podugovaratelj. Dodatkom 4. Ugovora sklopljenog dana 06. veljače 2023. godine ugovoreni su dodatni radovi koji nisu predviđeni projektnom dokumentacijom i ponudbeno-ugovornim troškovnikom te rok za izvođenje radova zbog dodatno ugovorenih radova. Dodatkom 5. Ugovora sklopljenog dana 15. veljače 2023. godine mijenja se rok za izvođenje radova zbog neizvođenja radova tijekom vremenskih neprilika. U 2023. godini izvršeno je radova u iznosu od 539.968,91 eura s PDV-om.
- Ugovor o javnoj nabavi usluga vođenja građevinskog dijela projekta na projektu „Dogradnja luke Baška“ sklopljen je s tvrtkom KARLOLINE-KLING d.o.o. u iznosu 195.000,00 kn (25.880,95 eura) bez PDV-a, odnosno 243.750,00 kn (32.351,18 eura) s PDV-om, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave u 2020. godini. U 2023. godini izvršene su usluge prema okončanoj situaciji u iznosu od 8.870,70 eura s PDV-om.
- Ugovor o javnoj nabavi usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja sklopljen je s Zajednicom ponuditelja: IG d.o.o. iz Labina, Marecon d.o.o. i TIM d.o.o. iz Rijeke. Iznos ugovorenih usluga je 608.000,00 kn (80.695,47 eura) bez PDV-a, odnosno 760.000,00 kn (100.869,33 eura) s PDV-om

sklopljen na temelju provedenog postupka javne nabave u 2020. godini. U 2023. godini izvršene su usluge prema okončanoj situaciji u iznosu od 27.658,38 eura s PDV-om.

- Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za uslugu projektantskog nadzora građenja sklopljen je ugovor s tvrtkom Marecon d.o.o. iz Rijeke u iznosu 178.000,00 kn (23.624,66 eura) bez PDV-a, odnosno 222.500,00 kn (29.530,82 eura) s PDV-om u 2020. godini. U 2023. godini izvršene su usluge prema okončanoj situaciji u iznosu od 8.097,35 eura s PDV-om.
- U 2023. godini planirani su neprihvatljivi troškovi u iznosu 60.330,00 eura. Izvršeni su u iznosu od 43.534,34 eura odnosno 72,16% planiranog iznosa za slijedeće:
 - zakup svjetleće plutače radi označavanja akvatorija 1. i 2. faze gradilišta u luci Baška u iznosu od 3.255,20 eura
 - geodetski snimak izvedenog stanja te izjava ovlaštenog inženjera geodezije u iznosu od 6.387,29 eura
 - priključak struje u iznosu od 6.887,09 eura
 - hidrantski ormarić sa opremom u iznosu od 3.306,16 eura
 - zaštitna ograda u iznosu od 5.655,00 eura
 - izrada i postavljanje ploče u iznosu od 588,33 eura
 - ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog kolektora u iznosu od 5.399,38 eura
 - geodetski elaborat za 1. i 2. fazu u iznosu 1.375,00 eura
 - upravna pristojba za uporabnu dozvolu za 1. i 2. fazu u iznosu od 530,89 eura
 - analiza procjene razlike u cijeni u iznosu od 10.150,00 eura.

U travnju 2023. godine je obavljen tehnički pregled te su u svibnju 2023. godine dobivene slijedeće uporabne dozvole za:

- rekonstrukciju luke Baška 1. faza – produženje primarnog lukobrana „Vela riva“ prema Građevinskoj dozvoli izdanoj dana 13.03.2017. godine i Izmjeni i dopuni građevinske dozvole izdane dana 03.03.2020. godine
- rekonstrukciju luke Baška, 2. faza – produženje sekundarnog lukobrana „Mala riva“ prema Građevinskoj dozvoli izdanoj dana 01.06.2017. godine i Izmjeni i dopuni građevinske dozvole izdane dana 03.03.2020. godine.



Vrijednost projekta: Ukupni rashodi u 2023. godini za EU projekt - Dogradnja luke Baška 1. i 2. faza ostvareni su u iznosu od 638.664,62 eura što je 44,57% planiranog iznosa od 1.432.940,00 eura za dovršetak radova i usluga koje se odnose na:


-  rashode za radove u iznosu od 433.620,11 eura što je 33,37% planiranog iznosa od 1.299.521,00 eura (ostvarenje je manje od ugovorenog i planiranog zbog toga što su stvarno izvedene količine radova po pojedinim stavkama manje od ugovorene količine radova iz ugovornog troškovnika)
-  rashode za nabavu opreme u iznosu od 106.348,80 eura što je 596,03% planiranog iznosa od 17.843,00 eura
-  usluge stručnog nadzora građenja i koordinator zaštite na radu u iznosu od 27.658,38 eura što je 100,00% planiranog iznosa od 27.659,00 eura
-  usluge projektantskog nadzora u iznosu od 8.097,35 eura što je 100,00% planiranog iznosa od 8.097,00 eura
-  usluge voditelja građevinskog dijela projekta u iznosu od 8.870,70 eura što je 100,00% planiranog iznosa od 8.871,00 eura
-  usluge administrativnog vođenja projekta u iznosu od 4.894,17 eura što je 99,98% planiranog iznosa od 4.895,00 eura
-  usluge promidžbe i vidljivosti u iznosu od 5.640,77 eura što je 98,55% planiranog iznosa od 5.724,00 eura

- ✚ neprihvatljivi troškovi u iznosu od 43.534,34 eura što je 72,16% planiranog iznosa od 60.330,00 eura
- ✚ Usluge stručnog nadzora nad radovima na izradi sidrenog sustava plovila u iznosu od 5.500,00 eura.

Ukupno rashodi odnosno ulaganja u imovinu u pripremi – dogradnja luke Baška - EU projekt na dan 31. prosinca 2023. godine od početka provedbe projekta iznosi 4.040.720,90 eura.

Godina	Rashodi projekta u pripremi	Index
2020.	14.518,15	0,36%
2021.	1.323.436,08	32,75%
2022.	2.064.102,04	51,08%
2023.	638.664,63	15,81%
UKUPNO	4.040.720,90	

Rashodi projekta Dogradnja luke Baška - 1. i 2. faza u razdoblju od 2020. - 2023. godine

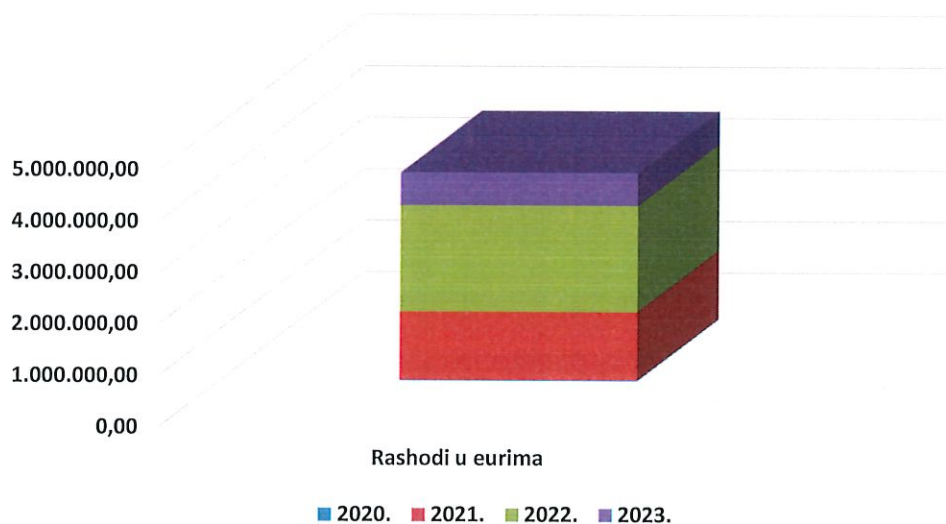


1.1.2. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke – III. Faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri okomita gata na njega**

Opis projekta: Gat Garofulin planira se na nivou hodne površine proširiti - dograditi i to cijeli uži dio gata do nekadašnje obaloutvrde na glavi gata („garofulina“), sa sadašnje širine od oko 1,5 m na novu ukupnu širinu od oko 2,5 m. Predviđa se sa zapadne strane gata izvesti uz postojeći gat plitko temeljene armirano-betonske utvrđice, te ih povezati preko armature s postojećom betonskom konstrukcijom gata. Ukupna dužina dijela gata Garofulin koja se proširuje iznosi (mjereno sa zapadne strane) 87,12 m. Gat Garofulin povezan je na postojeći obalni zid, a kojeg se predviđa rekonstruirati zasebnim projektom u sklopu uređenja obalnog pojasa naselja Baška, stoga je potrebno u korijenu izvesti novi obalni zid koji će odgovarati predviđenom zidu iz projekta uređenja obalnog pojasa.

Okomito na dograđeni (prošireni) gat Garofulin izvesti će se tri pravocrtna gata, dužine svaki po 74,0 m.



Plovila će se privezivati na gatove 1, 2 i 3 s obje strane, u četverovez. Direktno za privez plovila na Garofulinu koristiti će se samo njegova istočna strana

Cilj projekta: Rekonstrukcija luke – III. Faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri okomita gata na njega poduzima se u svrhu izgradnje novih vezova u luci Baška.

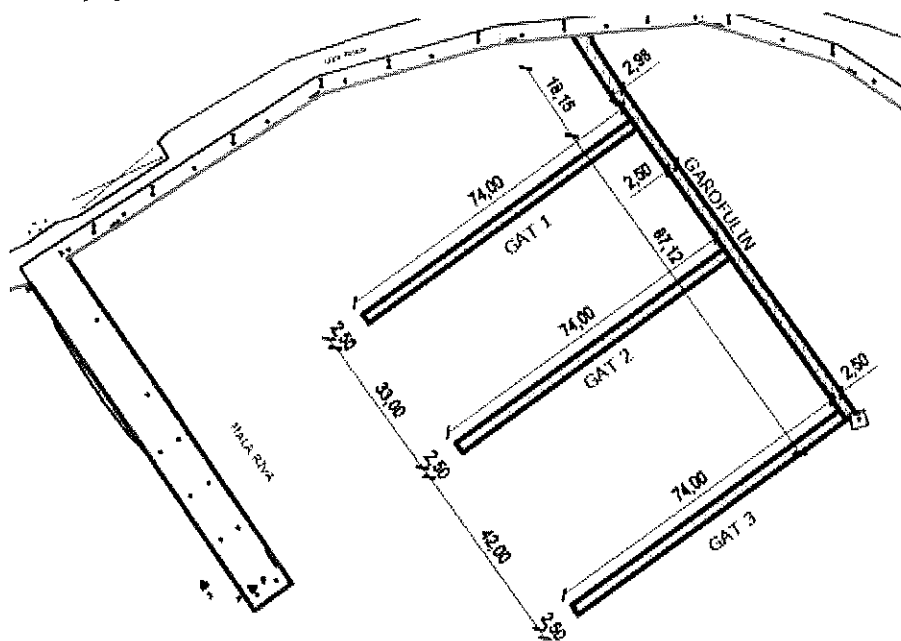

Provedba projekta: Projekt Rekonstrukcija luke – III. Faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri okomita gata na njega je započeo u 2023. godini, te će biti završen u 2024. godini.

- Nakon provedenog postupka javne nabave radi odabira izvođača radova potpisan je Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji luke Baška – 3. faza Ev. broj nabave: EV-M-70/22 s BSK Commerce d.o.o. iz Rijeke. Ugovor je potpisan dana 11. svibnja 2023. godine u iznosu 1.095.399,58 eura bez PDV-a, odnosno 1.369.249,48 eura s PDV-om. Rok za izvođenje svih radova je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao. U 2023. godini izvršeno je radova u iznosu od 698.291,52 eura s PDV-om.
- Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji luke Baška – 3. faza sklopljen je s Karloline – Kling d.o.o. iz Liča dana 15. svibnja 2023. godine. Iznos ugovorenih usluga je 25.750,00 eura bez PDV-a, odnosno 32.187,50 eura s PDV-om sklopljen na temelju provedenog postupka jednostavne nabave u 2023. godini. U 2023. godini izvršene su usluge u iznosu od 26.822,95 eura s PDV-om.
- Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za pružanje usluga koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova i usluge izrade plana izvođenja radova sklopljen je ugovor s tvrtkom TIM d.o.o. iz Rijeke dana 29. kolovoza 2023. godine. Iznos ugovorenih usluga je 3.000,00 bez PDV-a, odnosno 3.750,00 eura s PDV-om. U 2023. godini izvršene su usluge u iznosu od 1.875,00 eura s PDV-om.
- Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za uslugu projektantskog nadzora građenja sklopljen je ugovor s tvrtkom Marecon d.o.o. iz Rijeke u iznosu 8.600,00 eura bez PDV-a, odnosno 10.750,00 s PDV-om. U 2023. godini izvršene su usluge u iznosu od 5.374,89 eura s PDV-om.

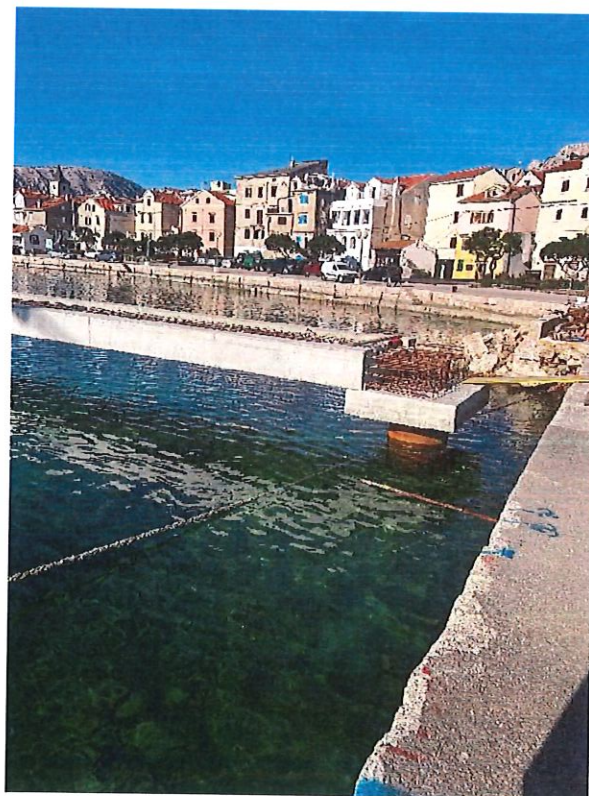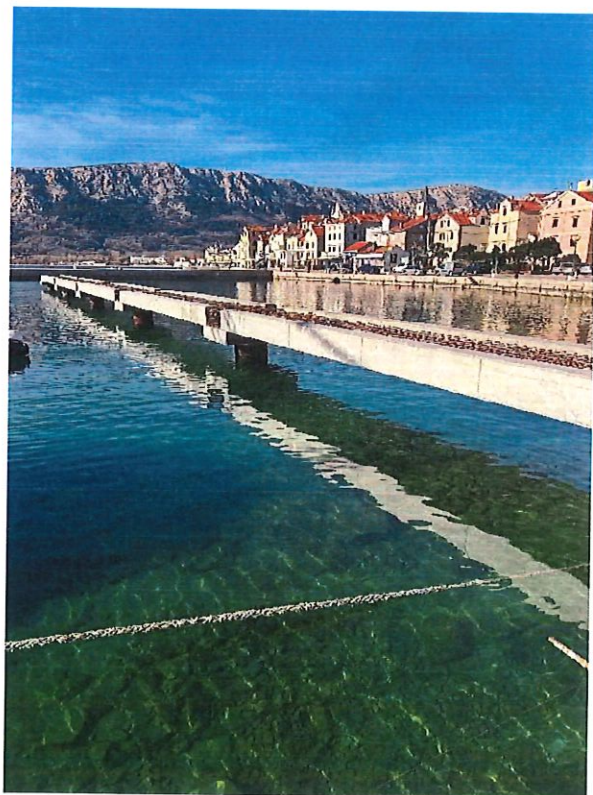

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za Rekonstrukcije luke Baška – 3. faza ostvareni su u iznosu od 736.739,36 eura što je 45,69% planiranog iznosa od 1.612.418,00 eura za radove i usluge koje se odnose na:

- ✚ rashode za radove u iznosu od 698.291,52 eura što je 51,00% planiranog iznosa od 1.369.250,00 eura
- ✚ usluge stručnog nadzora u iznosu od 26.822,95 eura što je 83,33% planiranog iznosa od 32.188,00 eura
- ✚ usluge koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova u iznosu od 1.875,00 eura što je 39,24% planiranog iznosa od 4.778,00 eura
- ✚ usluge projektantskog nadzora u iznosu od 5.374,89 eura što je 49,84% planiranog iznosa od 10.784,00 eura
- ✚ usluge izrade projekta sidrenog sustava u iznosu od 4.375,00 eura što je 99,89% planiranog iznosa od 4.380,00 eura.


U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2023. godine, a odnose se na slijedeće radove i usluge:

- ✚ priključak struje u iznosu od 13.538,00 eura (usluga za priključak je plaćena u 2023. godini u iznosu od 9.863,86 eura prema ugovoru, ali će račun biti zaprimljen nakon završetka svih radova u 2024. godini)
- ✚ radovi na izradi sidrenog sustava u iznosu od 177.500,00 eura (otvoreni postupak javne nabave započeo je krajem 2023. godine te će radovi bit izvedeni u 2024. godini).

Temeljem sklopljenog Ugovora s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture u 2023. godini dobivena su sredstva za sufinanciranje radova u iznosu od 698.291,52 eura, kao što je navedeno u izvršenju prihoda.


Rashodi – ulaganja u imovinu u pripremi	Planirano II. izmjenom u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini	Index
Radovi	1.369.250,00	698.291,52	51,00%
Usluge stručnog nadzora	32.188,00	26.822,95	83,33%
Usluge koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova	4.778,00	1.875,00	39,24%
Usluge projektantskog nadzora	10.784,00	5.374,89	49,84%
Usluge izrade projekta sidrenog sustava	4.380,00	4.375,00	99,89%
Priključak struje	13.538,00	0,00	-
Radovi na izradi sidrenog sustava	177.500,00	0,00	-
Ukupno projekt u pripremi	1.612.418,00	736.739,36	

Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda za projekt Rekonstrukcija luke Baška - 3. faza

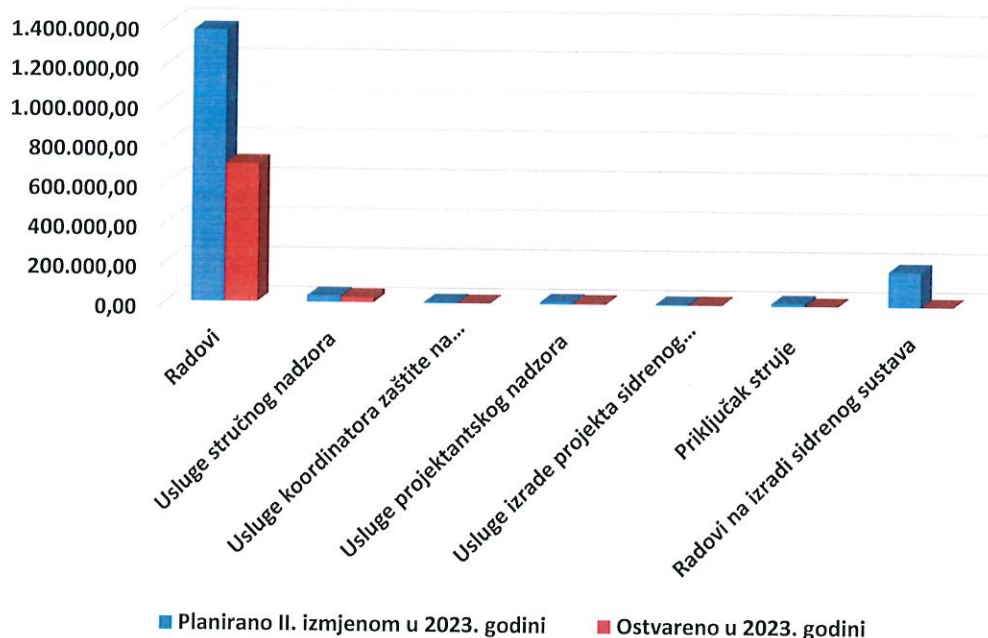

Izvor sredstava	Iznos	Struktura
Ministarstvo mora prometa i infrastrukture	698.291,52	94,78%
Županijska lučka uprava Krk	38.447,84	5,22%
UKUPNO	736.739,36	

Izvori su/financiranja u 2023. godini

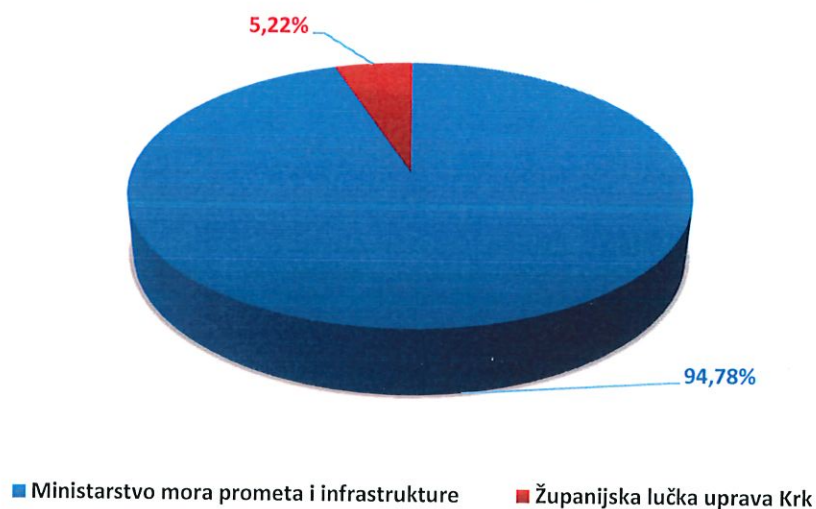

1.1.3. Naziv projekta: Rekonstrukcija luke – IV. Faza – izgradnja gata ispred Stare rive te gata „T“ tlocrta u akvatoriju između Garofulina i Stare rive

Opis projekta: Ovim projektom planira se izgradnja gata (5) ispred Stare rive, te gata „T“ tlocrta u akvatoriju između Garofulina i Stare rive (Gat 4) u luci Baška. Gat oznake „4“ nalazi se u akvatoriju između Garofulina i Stare rive, tlocrtnog je „T“ oblika. Prvi dio gata je okomit na obalni zid na koji se oslanja i dužine je 28,00 m, širine 2,50 m. U nastavku na glavi ima dva okomita kraka sa obje strane, a dužine su, onaj sa sjeverne strane dug je 32,50 m, a s južne strane 30,00 m. Ukupna dužina ovog okomitog dijela je 65,00 m, a širina gata je 2,50 m. Gat je planiran kao fiksna raščlanjena konstrukcija, duboko temeljena na armirano-betonskim „Bennotto“ pilotima. Rasponska se konstrukcija izvodi većinom od prefabriciranih prednapetih armirano-betonskih nosača. Gat „5“ se nastavlja na postojeću glavu Stare rive. Dužine je 85,90 m i širine 2,50 m. Gat je planiran kao fiksna raščlanjena konstrukcija, duboko temeljena na armirano-betonskim „Bennotto“ pilotima. Rasponska se konstrukcija izvodi većinom od prefabriciranih prednapetih armirano-betonskih nosača. Gatovi će se opremiti mornarskim stepenicama i anelima.

Cilj projekta: Svrha ovog projekta je izgradnja novih komunalnih i nautičkih vezova u luci Baška.



Provedba projekta:

- Nakon provedenog postupka jednostavne nabave radi odabira izvođača radova potpisan je Ugovor o nabavi radova na rekonstrukciji luke Baška – 4. faza s BSK

Commerce d.o.o. iz Rijeke. Ugovor je potpisan dana 26. svibnja 2023. godine u iznosu 3.846,00 eura bez PDV-a, odnosno 4.807,50 eura s PDV-om.

- Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji luke Baška – 4. faza sklopljen je Marecon d.o.o. iz Rijeke dana 29. svibnja 2023. godine. Iznos ugovorenih usluga je 500,00,00 eura bez PDV-a, odnosno 625,00 eura s PDV-om.

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za Rekonstrukcije luke Baška – 4. faza ostvareni su u iznosu od 16.375,00 eura što je 74,43% planiranog iznosa od 22.000,00 eura za radove i usluge koje se odnose na:

- ✚ usluge izrade izvedbenog projekta u iznosu od 16.375,00 eura što je 100,00% planiranog iznosa od 16.375,00 eura.

U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2023. godine, a odnose se na slijedeće radove i usluge:

- ✚ radovi u iznosu od 5.000,00 eura
- ✚ usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova u iznosu od 625,00 eura.

2. LUKA: KRK

2.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

2.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke (projektne dokumentacije)**

Opis projekta: Projektom se planira izmjena i dopuna projektne dokumentacije radi Uporabne cjeline 1 – primarnog lukobrana i Uporabne cjeline 3 – gatovi.

Cilj projekta: Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 1 – primarni lukobran planira se u svrhu bolje zaštite lučkog akvatorija, osiguranja komunalnih i nautičkih vezova, te sigurnog mjesta za privez plovila. Uporabna cjelina 3 – gatovi planira se u svrhu izgradnje novih komunalnih vezova u uvali Portapižana.

Provedba projekta: Ugovorene su izmjene i dopune projektne dokumentacije radi Uporabne cjeline 1 – primarni lukobran.

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za Rekonstrukcije luke Krk ostvareni su u iznosu od 6.091,96,00 eura što je 39,78% planiranog iznosa od 15.315,00 eura za usluge koje se odnose na:

- ✚ usluge izrade izmjene i dopune idejnog projekta, te provedba upravnog postupka za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole (Uporabna cjelina 1) u iznosu od 3.437,50 eura što je 99,93% planiranog iznosa od 3.440,00 eura
- ✚ upravna pristojba za izmjenu lokacijske dozvole (Uporabna cjelina 1) u iznosu od 2.654,46 eura što je 94,80% planiranog iznosa od 2.800,00 eura.

U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2023. godine, a odnose se na slijedeće usluge:

- ✚ usluge geodetskih radova za potrebe izmjene idejnog projekta i lokacijske dozvole (Uporabna cjelina 1) u iznosu od 1.875,00 eura
- ✚ usluge izrade idejnog projekta za izmjenu lokacijske dozvole (Uporabna cjelina 3) u iznosu od 4.400,00 eura
- ✚ upravna pristojba za izmjenu lokacijske dozvole (Uporabna cjelina 3) u iznosu od 2.800,00 eura.

2.1.2. Naziv projekta: **Ribarska luka Krk – Uporabna cjelina 1 – Faza 1 i Faza 3**

Opis projekta: Projektom se planira izmjena i dopuna glavnog projekta rekonstrukcije luke Krk – Ribarska luka Krk - Uporabna cjelina 1 – Faza 1 – Faza 3 radi izmjene za izdavanje građevinske dozvole.

Cilj projekta: Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 1 – primarni lukobran planira se u svrhu bolje zaštite lučkog akvatorija te izgradnju ribarske luke.

Provedba projekta: Ugovorene su izmjene projektne dokumentacije radi Uporabne cjeline 1 – Faza 1 i Faza 3 te ishodovana građevinska dozvola.

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za Rekonstrukcije luke Krk ostvareni su u iznosu od 23.167,47 eura što je 77,73% planiranog iznosa od 29.804,00 eura za usluge koje se odnose na:

- ✚ usluge izrade izmjene glavnog projekta Rekonstrukcije luke Krk – Ribarska luka Krk - Uporabna cjelina 1 – Faza 1 i Faza 3 u iznosu od 21.567,47 eura što je 100% planiranog iznosa od 21.568,00 eura
- ✚ upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za Ribarsku luku - Uporabna cjelina 1 u iznosu od 1.600,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 1.600,00 eura.

U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva za početak radova koja nisu ostvarena, a odnose se na slijedeće radove:

- ✚ radovi na rekonstrukciji luke Krk – Ribarska luka - Uporabna cjelina 1 – Faza 1 i Faza 3 u iznosu od 6.636,00 eura.

2.1.3. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke – primarni lukobran – Uporabna cjelina 1 – Faza 1 i Faza 3**

Opis projekta: Projektom se planira produženje postojećeg primarnog lukobrana te će njegova ukupna dužina iznositi 195,70 m, a tlocrtno nije u pravcu već je razlomljen pod kutom od 118° i time podijeljen na dva dijela. Širina gata u prvom dijelu (na spoju s postojećim lukobranom) je 22,0 m, a ostali dio je širine 12,0 m. Za gat je definirana projektna dubina od -5,00 m, a kota vrha obalnog zida, odnosno partera lukobrana iznosi +1,50 m n.m.

Konstrukcija gata sastoji se od dva masivna betonska obalna zida, između kojih se izrađuje nasip od čistog kamenog materijala. Konstrukcija obale je gravitacijskog tipa izrađena od kalupnog betona na licu mjestu. Radi omogućavanja strujanja mora, lukobran će biti opremljen s četiri otvora koji se nalaze na međusobnoj udaljenosti od cca 40,0 m. Na taj način omogućiti će se protok vode kroz lukobran, odnosno izmjena vode unutar luke, što je vrlo važno za prirodno održanje biljnih i životinjskih zajednica. Lukobran će se obložiti kamenom te opremiti polerima, mornarskim stepenicama, anelima, ormarićima za napajanje plovila strujom i vodom, hidrantom te polupodzemnim spremnicima za zbrinjavanje otpada.



Cilj projekta: Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 1 – primarni lukobran poduzima se u svrhu bolje zaštite lučkog akvatorija, osiguranja komunalnih i nautičkih vezova, te sigurnog mjesta za privez plovila.

Vrijednost projekta: Financijskim planom za 2023. godinu planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 5.040,00 eura, a koji nisu izvršene do kraja 2023. godine za slijedeće usluge :

- ✚ usluge izrade izmjene i dopune glavnog projekta Rekonstrukcije luke Krk – Uporabna cjelina 1 te provedba upravnog postupka za izmjenu i dopunu građevinske dozvole u iznosu 3.440,00 eura
- ✚ upravna pristojba za izmjenu građevinske dozvole za primarni lukobran Krk – Uporabna cjelina 1 – Faza 1 i Faza 3.

2.1.4. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke – Obala Marina – Uporabna cjelina 5**

Opis projekta: Projektom je definiran zahvat na uporabnoj cjelini 5 – „Obala Marina“ gdje je predviđeno da se postojeća obala u dužini oko 125,00 m proširi do 5,00 m, a istočni dio u duljini 27,65 m će se sanirati u podmorskom dijelu dok će se u nadmorskom dijelu izvršiti rekonstrukcija s novim nadmorskim zidom bez izmjena obalne linije, kota partera je na +1,20 m, projektirane dubine akvatorija pred obalnim zidom -4,0 m. Obalni zid će se izvesti kao vertikalni zid od dva reda armirano-betonskih bušenih pilota na razmaku od cca 7,00 m, s montažnim a.b. elementima između pilota koji s nadmorskim dijelom čine vertikalni obalni zid. Vrh zida je postavljen na koti +1,20m.

Šetnica s kamenim opločenjem se izvodi uz obalni zid te zajedno sa kamenom poklopnicom ukupne je širine 5,50 do 6,50 m.

Rekonstruirana obala opremiti će se lijevanoželjeznim polerima nosivosti 15 tona na razmaku cca 7,0 m za privez plovila, a između njih ugraditi će se aneli od nehrđajućeg čelika-prokroma te ormarićima za opskrbu strujom i vodom i rasvjetnim tijelima.

Nakon izgradnje obale predviđeno je 18 mjesta za privez plovila duljine do 25,0 m, širine veza 7,0m.

Cilj projekta: Rekonstrukcija luke Krk - Uporabna cjelina 5 – „Obala Marina“ poduzima se u svrhu ojačanja same obale i proširenja šetnice.



Vrijednost projekta: Financijskim planom za 2023. godinu planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 1.327,00 eura, a koji nisu izvršene do kraja 2023. godine za slijedeće usluge :

- ✚ upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 5 – Obala Marina.

2.1.5. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke – sekundarni lukobran – Uporabna cjelina 2**

Opis projekta: Projektom se planira izgraditi betonski sekundarni lukobran, dužine 83,00 m s vanjske strane i 77,00 m s unutrašnje strane, širine 8,00 m, kote partera lukobrana + 1,50 m.n.m., a projektirane dubine uz obalni zid -5,00 m. Lukobran će se obložiti kamenom te opremiti mornarskim stepenicama, bitvama, anelima, lučkim svjetlom, rasvjetnim stupovima, ormarićima za opskrbu strujom i vodom te hidrantom. Za potrebe temeljne infrastrukture izvesti će se s vanjske i s unutrašnje strane energetska kanal u sklopu serklaža obalnog zida opremljen cijevima za provlačenje instalacija. U sredini poprečnog presjeka sekundarnog lukobrana izvesti će se valobrani zid za sprečavanje prelijevanja mora, dok će se radi omogućavanja strujanja mora unutar uvale Portapižana sekundarni lukobran opremiti s dva otvora na trećinama dužine lukobrana. Na taj način omogućiti će se protok vode kroz lukobran, odnosno izmjena vode unutar uvale, što je vrlo važno za prirodno održanje biljnih i životinjskih zajednica.

Provedba projekta: Ugovorene i izvršene su usluge izrade projektne dokumentacije Uporabne cjeline 2 – sekundarni lukobran osim usluge izrade izvedbenog projekta i usluge izrade prijavnog obrasca i dokumentacije za financiranje projekta zaštite lučkog akvatorija prema Financijskom planu za 2023. godinu za planirani projekt.

Cilj projekta: Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran poduzima se u svrhu zaštite lučkog akvatorija luke otvorene za javni promet županijskog značaja luke Krk od južnih valova te će se time omogućiti sigurnost priveza postojećih brodica kao i izgradnja novih komunalnih vezova u uvali Portapižana.



Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za Rekonstrukcije luke Krk ostvareni su u iznosu od 93.285,93 eura što je 55,77% planiranog iznosa od 167.272,00 eura za usluge koje se odnose na:

- ✚ usluge izrade izmjene glavnog projekta sa svim pripadajućim dijelovima i podlogama Rekonstrukcije luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran u iznosu od 32.187,51 eura što je 99,49% planiranog iznosa od 32.352,00 eura
- ✚ usluga izrade geotehničkih istražnih radova – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran u iznosu od 32.125,00 eura što je 99,30% planiranog iznosa od 32.352,00 eura
- ✚ usluga izrade geodezije – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran u iznosu od 28.250,00 eura što je 99,58% planiranog iznosa od 28.370,00 eura
- ✚ elaborat optimalnog tehničkog rješenja u iznosu od 139,36 eura, a nisu planirana sredstva

- ✚ upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za sekundarni lukobran u luci Krk – Rekonstrukcija luke Krk - Uporabna cjelina 2 u iznosu od 584,06 eura što je 48,67% planiranog iznosa od 1.200,00 eura.


U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva za usluge koje nisu ostvarene u 2023. godini, a odnose se na slijedeće:

- ✚ usluge izrade izvedbenog projekta – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran u iznosu od 46.453,00 eura
- ✚ usluge izrade prijavnog obrasca i dokumentacije za financiranje projekta, zaštita lučkog akvatorija u iznosu od 26.545,00 eura.

Temeljem sklopljen Ugovora s Primorsko-goranskom županijom u 2023. godini dobivena su sredstva za sufinanciranje usluge izrade glavnog projekta za Rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran u iznosu od 29.000,00 eura, kao što je navedeno u izvršenju prihoda.

Izvor sredstava za izradu projektne dokumentacije	Iznos	Struktura
Primorsko-goranska županija	29.000,00	31,09%
Županijska lučka uprava Krk	64.285,93	68,91%
UKUPNO	93.285,93	

Izvori su/financiranja u 2023. godini




2.1.6. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke – gatovi – Uporabna cjelina 3**

Opis projekta: Ovim projektom planira se rekonstrukcija obalnog zida, uređenje obalnog platoa u pozadini te dobava i montaža dva plutajuća pontona u uvali Portapižana. Plutajući pontoni biti će sastavljeni od montažnih elemenata, međusobno privezanih te se sidre lancima i sidrenim blokovima i biti će dužine 96 m i do 120 m, širine 2,00 – 4,00 m i visine 1,00 m koji se spajaju na novu obalu visine + 1,20 m.n.m, a sa kopnom su vezani preko pasarela koje se oslanjaju na sidrenim utvrdicama. Gatovi će se opremiti sa sustavom priveza (aneli, bitve) te ormarićima za opskrbu strujom i vodom i rasvjetnim tijelima.

Uporabna cjelina 3 može se raditi nakon izvedbe Uporabne cjeline 1 i 2.

Cilj projekta: Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi poduzima se u svrhu izgradnje novih komunalnih vezova u uvali Portapižana.

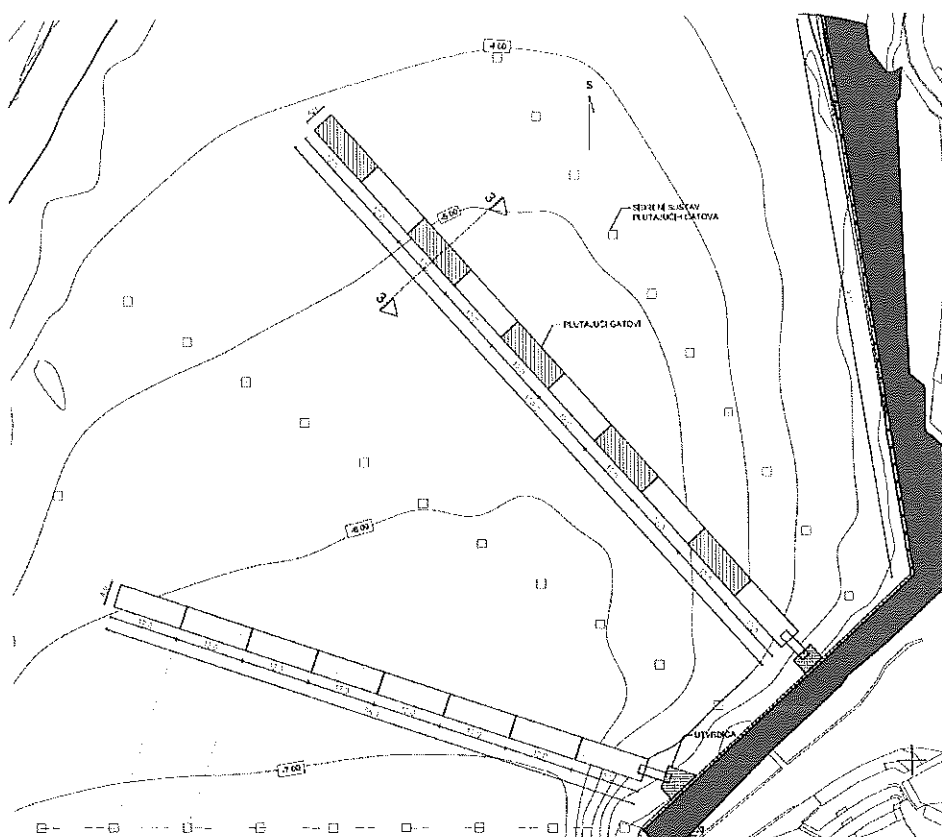

Vrijednost projekta: Financijskim planom za 2023. godinu planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 48.730,00 eura, a koji nisu izvršene do kraja 2023. godine za slijedeće usluge :

- 📍 geodetska podloga – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi u iznosu od 4.000,00 eura

- ✚ maritimna studija, dopuna i ažuriranje – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi u iznosu od 8.500,00 eura
- ✚ usluge izrade geotehničkih istražnih radova za Rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi u iznosu od 8.250,00 eura
- ✚ usluge izrade glavnog projekta – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi u iznosu od 16.200,00 eura
- ✚ usluge revizije glavnog projekta – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi u iznosu od 2.655,00 eura
- ✚ usluga izrade izvedbenog projekta – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi u iznosu od 8.125,00 eura
- ✚ upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi u iznosu od 1.000,00 eura.

2.1.7. Naziv projekta: Rampa za osobe s invaliditetom, prilaz sekundarnom lukobranu u luci Krk

Opis projekta: Predmet zahvata je izgradnja betonske rampe s rukohvatom za osiguranje pristupačnosti novom lukobranu osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na području lukobrana Portapisana, na dijelu k.č. 4961/1 k. Betonska rampa s rukohvatom isključivo se postavlja za prilaz budućem sekundarnom lukobranu Portapisana.

Cilj projekta: Betonska rampa s rukohvatom izvodi se u svrhu osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom budućem sekundarnom lukobranu.



Vrijednost projekta: Financijskim planom za 2023. godinu planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 3.400,00 eura, a koji nisu izvršene do kraja 2023. godine za slijedeće usluge :

-  usluge izrade glavnog projekta prilazne rampe za osobe s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti kao prilaz sekundarnom lukobranu u iznosu od 3.250,00 eura
-  upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za rampu za osobe s invaliditetom u iznosu od 150,00 eura.

2.1.8. Naziv projekta: *Rekonstrukcija istezališta u luci Krk - odvodnja i zbrinjavanje otpadnih voda na istezalištu*

Opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija istezališta u Luci Krk. Rekonstrukcija se odnosi na rješavanje odvodnje i zbrinjavanje otpadnih voda na istezalištu.

Ovim projektom predviđena je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od pranja brodova sa svim pripadajućim objektima: taložnik, crpna stanica, uređaj za kemijsko fizikalni tretman smještenom u kontejner, kontrolno okno, crpna stanica koja omogućava spoj na javnu sanitarnu kanalizaciju.

Cilj projekta: Svrha ovog projekta je rješavanje odvodnje i zbrinjavanje otpadnih voda na istezalištu u luci Krk.

Vrijednost projekta: Financijskim planom za 2023. godinu planirani su rashodi za početak izvođenja radova i usluga koji će se izvoditi u 2024. godini nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave i postupaka jednostavne nabave u ukupnom iznosu od 10.800,00 eura. U 2023. godini nisu izvršeni slijedeći rashodi za:

-  Radove na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u iznosu od 10.000,00 eura
-  Usluge stručnog nadzora na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk u iznosu od 500,00 eura
-  Usluge koordinatora zaštite na radu na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk u iznosu od 300,00 eura.

3. LUKA: MALINSKA

3.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

3.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija i dogradnja primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza**

Opis projekta: U sklopu rekonstrukcije luke Malinska planira se rekonstrukcija i dogradnja postojećeg primarnog lukobrana u dijelu postojećih gabarita, gdje se na istom s vanjske strane izvodi valobrani zid s krunom na koti od oko +2,50 m, te se iza njega prema moru izvodi kamena obalozaštita (školjera). Postojeći se obalni plato lukobrana uređuje s nagibom prema unutarnjoj strani luke te se na tom kraju izvodi novi masivni betonski obalni zid za privez brodica. Radi dodatne zaštite akvatorija luke na glavi primarnog lukobrana predviđa se, približno u pravcu sjever - jug, izgradnja produžetka primarnog lukobrana. Isti bi se radi većih dubina mora (do oko 23 m) izveo na temeljnom nasipu, kao masivni, betonski, vertikalni lukobran, s valobranim zidom u dijelu iznad partera radi dodatnog sprječavanja prelijevanja valova. Planirane je dužine oko 80 m, i širine 6 m. Na njemu bi bio moguć privez plovila za povoljnih vremenskih uvjeta i s vanjske strane.

Na južnoj strani ulaza u luku predviđena je dogradnja sekundarnog lukobrana za oko 57 m u pravcu postojećeg dijela lukobrana (približno jug-sjever), širine oko 6 m. Sekundarni lukobran se planira izvesti duboko temeljen na armirano-betonskim bušenim pilotima, s uronjenim valobranim ekranom (djelomično propusni lukobran).

Cilj projekta: Rekonstrukcija i dogradnja primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza u luci Malinska poduzima se u svrhu bolje zaštite lučkog akvatorija, osiguranja komunalnih i nautičkih vezova, te sigurnog mjesta za privez plovila.



Provedba projekta: U 2023. godini planirane usluge izrade glavnog projekta su izvršene i predane za postupak ishođenja građevinske dozvole rekonstrukcije i dogradnje primarnog lukobrana i dogradnje sekundarnog lukobrana – I faza. Izvršene su usluge elaborata za ocjenu o potrebi izrade procjene utjecaja na okoliš.

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za izradu projektne dokumentacije projekta Rekonstrukcije i dogradnje primarnog lukobrana i dogradnje sekundarnog lukobrana ostvareni su u iznosu od 110.267,77 eura što je 66,55% planiranog iznosa od 165.681,00 eura za usluge koje se odnose na:

- ✚ usluge izrade izmjene glavnog projekta i vođenje postupka ishođenja građevinske dozvole rekonstrukcije i dogradnje primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza u iznosu od 108.003,19 eura što je 70,00% planiranog iznosa od 154.290,00 eura
- ✚ usluga izrade elaborata za ocjenu o potrebi izrade procjene utjecaja na okoliš i dogradnje primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza u iznosu od 2.264,58 eura što je 99,98% planiranog iznosa od 2.265,00 eura.

U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva za usluge koje nisu ostvarene u 2023. godini, a odnose se na slijedeće:


- ✚ usluge revizije glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza u iznosu od 6.626,00 eura
- ✚ upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole rekonstrukcije i dogradnje primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza u iznosu od 2.500,00 eura.

Temeljem sklopljen Ugovora s Primorsko-goranskom županijom u 2022. godini i Dodatku ugovora u 2023. godini dobivena su sredstva za sufinanciranje usluge izrade elaborata za ocjenu o potrebi izrade procjene utjecaja na okoliš u iznosu od 3.235,12 eura, kao što je navedeno u izvršenju prihoda.

Temeljem sklopljenog Ugovora s Općinom Malinska-Dubašnica u 2023. godini dobivena su sredstva za sufinanciranje usluge izrade glavnog projekta u iznosu od 42.163,81 eura, kao što je navedeno u izvršenju prihoda.

Izvor sredstava za izradu projektne dokumentacije	Iznos	Struktura
Primorsko-goranska županija	3.235,12	2,93%
Općina Malinska-Dubašnica	42.163,81	38,24%
Županijska lučka uprava Krk	64.868,84	58,83%
UKUPNO	110.267,77	

Izvori su/financiranja u 2023. godini



3.1.2. Naziv projekta: **Plutajući ponton za ribare**

Opis projekta: Planira se nabava i montaža novog plutajućeg pontona u luci Malinska zbog omogućavanja priveza ribarskih brodova.

Cilj projekta: Postavljanje plutajućeg pontona za ribarske brodice poduzima se u svrhu pružanja usluge ribarima.

Provedba projekta: U 2023. godini nabavljen je plutajući ponton te su naručene usluge izrade projektne dokumentacije.

Vrijednost projekta: Rashodi za nabavu i montažu plutajućeg pontona ostvareni su u iznosu od 31.112,50 eura što je 71,89% planiranog iznosa od 43.275,00 eura koji se odnose na:

- ✚ Uslugu nabave i montaže plutajućeg pontona u iznosu od 31.112,50 eura što je 99,56% planiranog iznosa od 31.250,00 eura.

U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva za usluge koje nisu ostvarene u 2023. godini, a odnose se na slijedeće:


- ✚ usluge izrade geodetske podloge za potrebe izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za dobavu i montažu plutajućeg pontona za ribare u iznosu od 2.500,00 eura

- ✚ usluge izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za dobavu i montažu plutajućeg pontona za ribare u iznosu od 5.000,00 eura
- ✚ upravna pristojba za izdavanje lokacijske dozvole za plutajući ponton za ribare u iznosu od 150,00 eura
- ✚ usluge izrade projekta sidrenja za plutajući ponton u iznosu od 4.375,00 eura.

Temeljem sklopljenog Ugovora s Općinom Malinska-Dubašnica u 2023. godini dobivena su sredstva za sufinanciranje usluge nabave i montaže plutajućeg pontona u iznosu od 27.362,50 eura, kao što je navedeno u izvršenju prihoda.

Izvor sredstava	Iznos	Struktura
Općina Malinska-Dubašnica	27.362,50	87,95%
Županijska lučka uprava Krk	3.750,00	12,05%
UKUPNO	31.112,50	

Izvori su/financiranja u 2023. godini

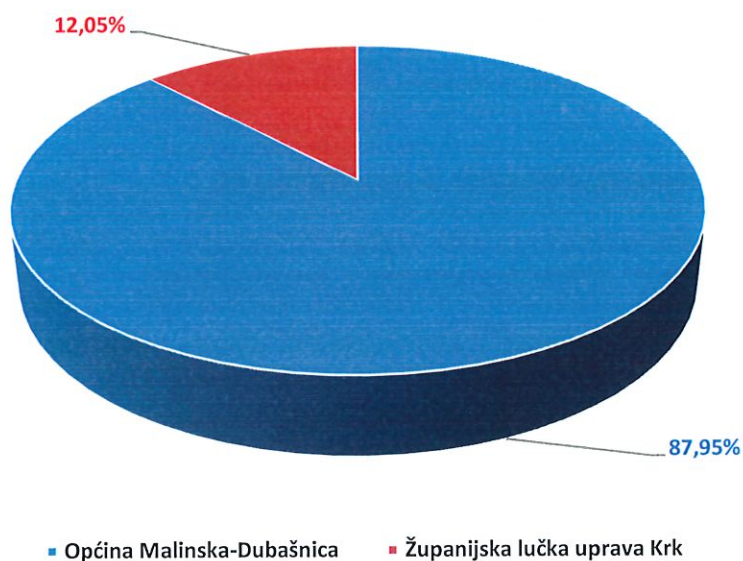

3.2. TEKUĆE ULAGANJE:

3.2.1. Naziv ulaganja: **Ponton – provjera i zamjena lanaca i gambeta na plastičnom pontonu**

Opis: Provjera i zamjena lanaca i gambeta na plastičnom pontonu u luci Malinska.

Cilj: Sigurno korištenje pontona u svrhu priveza plovila u luci Malinska.

Vrijednost: Ostvarenje planiranih rashoda za 2023. godinu su iznosu od 15.202,50 eura što je 99,60% planiranog iznosa od 15.263,00 eura za slijedeće:

- ✚ usluge provjere i zamjene lanaca i gambeta na plastičnom pontonu u iznosu od 15.202,50 eura što je 99,60% planiranog iznosa od 15.263,00 eura.

3.2.2. Naziv ulaganja: **Ponton – sanacija betonskog pontona**

Opis: Radovi na sanaciji betonskog pontona koje uključuje mijenjanje vijaka, kabela za struju te sanacija hodne površine dva segmenta u luci Malinska.

Cilj: Sigurno korištenje pontona u svrhu priveza plovila u luci Malinska.

Vrijednost: Ostvarenje planiranih rashoda za 2023. godinu su iznosu od 7.245,63 eura što je 70,90% planiranog iznosa od 10.220,00 eura za slijedeće:

- ✚ radovi na sanaciji betonskog pontona koje uključuje mijenjanje vijaka, kabela za struju u iznosu od 5.395,63 eura što je 62,54% planiranog iznosa od 8.627,00 eura
- ✚ radovi na sanaciji hodne površine dva segmenta betonskog pontona u iznosu od 1.850,00 eura što je 116,13% planiranog iznosa od 1.593,00 eura.

3.2.3. Naziv ulaganja: **Pasarela u luci Malinska**

Opis: Radovi na izradi i montaži pasarele u luci Malinska.

Cilj: Sigurno korištenje pasarele u svrhu priveza plovila u luci Malinska.

Vrijednost: Ostvarenje planiranih rashoda za 2023. godinu su iznosu od 4.250,00 eura što je 56,25% planiranog iznosa od 7.555,00 eura za slijedeće:

- ✚ radovi na izradi pasarele u iznosu od 4.250,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 4.250,00 eura

U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva za radove koji nisu izvršeni do kraja 2023. godine, a odnose se na slijedeće:

- ✚ radovi na montaži pasarele u iznosu od 3.305,00 eura.

3.2.4. Naziv ulaganja: **Sanacija platoa dizalice u luci Malinska**

Opis: Radovi na sanaciji platoa dizalice u luci Malinska.

Cilj: Sigurno korištenje dizalice u svrhu davanja usluge korisnicima dizalice u luci Malinska.

Vrijednost: Ostvarenje planiranih rashoda za 2023. godinu su iznosu od 13.652,12 eura što je 99,99% planiranog iznosa od 13.654,00 eura za slijedeće:

-  radovi na sanaciji platoa dizalice u iznosu od 11.513,94 eura što je 100% planiranog iznosa od 11.514,00 eura
-  radovi na sanaciji prilazu platoa dizalice u iznosu od 2.138,18 eura što je 99,91% planiranog iznosa od 2.140,00 eura.

4. LUKA: OMIŠALJ

4.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

4.1.1. Naziv projekta: **Plutajući ponton u luci Omišalj**

Opis projekta: U luci Omišalj će se izvršiti nabava i ugradnja plutajućeg pontona, dužine 60 m i širine 2,50 m. Postavljanje plutajućeg pontona je predviđeno na mjestu postojećeg plutajućeg pontona koji je dužine 33 m.

Cilj projekta: Postavljanjem plutajućeg pontona pružat će se usluga korisnicima vezova.



Provedba projekta: Projekt nabave i ugradnje plutajućeg pontona u luci Omišalj započeo je u 2022. godini, dovršen u 2023. godini, a tehnički pregled je obavljen u 2024. godini.

- U mjesecu listopadu 2022. godine pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova nabave i ugradnje plutajućeg pontona u luci Omišalj. Krajem mjeseca prosinca 2022. godine Stručno povjerenstvo za javnu nabavu pregledalo i ocijenilo zaprimljene ponude i predložilo odgovornoj osobi da donese Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Ugovor o javnoj nabavi nabave i ugradnje plutajućeg pontona u luci Omišalj (Pesja) sklopljen je s tvrtkom G.A.M.I.K. d.o.o. iz Podstrane. Ugovor je potpisan dana 07. veljače 2023. godine u iznosu 156.362,69 eura bez PDV-a, odnosno 195.453,37 eura s PDV-om. Rok za izvođenje svih radova je 5 mjeseci od dana uvođenja u posao.
- Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora za nabavu i montažu plutajućeg pontona u luci Omišalj (Pesja) sklopljen je s Seacon d.o.o. iz Rijeke dana 22. veljače 2023. godine. Iznos ugovorenih usluga je 4.247,00 eura bez PDV-a, odnosno 5.308,75 eura s PDV-om sklopljen na temelju provedenog postupka jednostavne nabave u 2023. godini.
- usluge projektantskog nadzora sklopljen je ugovor s tvrtkom Marecon d.o.o. iz Rijeke u iznosu 1.200,00 eura bez PDV-a, odnosno 1.500,00 s PDV-om.

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za nabavu i montažu plutajućeg pontona ostvareni su u iznosu od 203.804,74 eura što je 100,47% planiranog iznosa od 202.846,00 eura za radove i usluge koje se odnose na:

- ✚ Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za postavljanje plutajućeg pontona u iznosu od 106,18 eura što je 79,83% planiranog iznosa od 133,00 eura
- ✚ rashode za nabavu i montažu plutajućeg pontona u iznosu od 194.523,56 eura što je 99,52% planiranog iznosa od 195.454,00 eura
- ✚ usluge geodetskih radova za iskolčenje za postavljanje plutajućeg pontona u iznosu od 250,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 250,00 eura
- ✚ usluge stručnog nadzora u iznosu od 5.308,75 eura što je 100% planiranog iznosa od 5.309,00 eura
- ✚ usluge projektantskog nadzora u iznosu od 1.500,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 1.500,00 eura
- ✚ usluge izrade projekta sidrenja gatova od Hrvatskog registra brodova u iznosu od 2.116,25 eura, a u planu nisu planirana financijska sredstva.


U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2023. godine, a odnose se na slijedeće:

- ✚ upravna pristojba za uporabnu dozvolu za postavljanje plutajućeg pontona u iznosu od 200,00 eura.

Temeljem sklopljenog Ugovora s Primorsko-goranskom županijom u 2023. godini dobivena su sredstva za sufinanciranje usluge nabave i montaže plutajućeg pontona u iznosu od 59.700,00 eura, kao što je navedeno u izvršenju prihoda.

Izvor sredstava	Iznos	Struktura
Primorsko-goranska županija	59.700,00	29,29%
Županijska lučka uprava Krk	144.104,74	70,71%
UKUPNO	203.804,74	

Izvori su/financiranja u 2023. godini

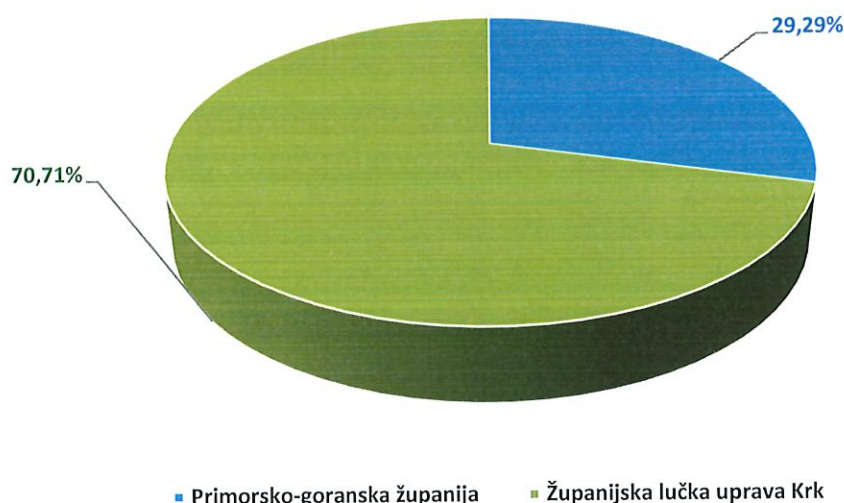

4.1.2. Naziv projekta: Nabava i montaža plutajućeg pontona (drugi) u luci Omišalj

Opis projekta: Projektom se planira postavljanje jednog plutajućeg gata dužine oko 60 m, širine 2,50 m u jugoistočnom dijelu luke, a približno na mjestu postojećeg gata koji je dotrajavao, a dužine je oko 33 m. Plutajući elementi gata su međusobno povezani elastičnom vezom, a njihov stalni položaj u moru je osiguran preko sidrenih lanaca pričvršćenih za sidrene betonske blokove („corpo morto“) koji se nalaze na morskom dnu. Gat se na bočnim stranicama oprema bitvama ili prstenima (anelima) za privez plovila, a nalaze se na udaljenosti od oko 2,0 ($\pm 0,5$) m, ovisno o proizvođaču pontona.

Cilj projekta: Svrha ovog projekta je sigurnost korisnika luke Omišalj.



Vrijednost projekta: Financijskim planom za 2023. godinu planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 17.497,00 eura, a koji nisu izvršene do kraja 2023. godine za slijedeće usluge :

- ✚ usluge hidroarheološkog istraživanja u iznosu od 2.500,00 eura
- ✚ usluge izrade glavnog projekta za nabavu i montažu plutajućeg pontona u iznosu od 7.963,00 eura
- ✚ usluge izrade geodetske podloge za nabavu i montažu plutajućeg pontona u iznosu od 2.256,00 eura
- ✚ usluge izrade i dopune ažuriranja maritimne studije za nabavu i montažu plutajućeg pontona u iznosu od 4.645,00 eura
- ✚ upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za nabavu i montažu plutajućeg pontona u iznosu od 133,00 eura.

4.1.3. Naziv projekta: Uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice u luci Omišalj

Opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija obalnog zida uzduž obalnog pojasa i uređenje samog obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice u luci Omišalj, a time i proširenje same obale. Obalni zid će se opremiti anelima za privez plovila.

Cilj projekta: Uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice u luci Omišalj (Pesja) poduzima se u svrhu ojačanja same obale te time i sigurnost priveza plovila.



Provedba projekta: Tijekom 2023. godine naručene su usluge izrade projektne dokumentacije koja će se nastaviti u 2024. godini.

Vrijednost projekta: Rashodi za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 11.375,00 eura što je 30,75% planiranog iznosa od 36.992,00 eura za usluge koje se odnose na:

- ✚ usluge geodetske podloge za izradu glavnog projekta za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice u iznosu od 1.500,00 eura što je 56,50% planiranog iznosa od 2.655,00 eura
- ✚ usluge izrade geotehničkih istražnih radova za potrebe izrade glavnog projekta za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice u iznosu od 9.875,00 eura što je 98,75% planiranog iznosa od 10.000,00 eura.

U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2023. godine, a odnose se na slijedeće:

- ✚ usluge izrade elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za uređenje obalnog zida u iznosu od 3.315,00 eura
- ✚ usluge izrade glavnog projekta uređenja obalnog pojasa u iznosu od 13.272,00 eura
- ✚ usluge izrade revizije glavnog projekta uređenja obalnog pojasa u iznosu od 2.000,00 eura
- ✚ usluge ažuriranja maritimne studije za uređenje obalnog pojasa u iznosu od 4.750,00 eura
- ✚ upravna pristojba za građevinsku dozvolu za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice u iznosu od 1.000,00 eura.

4.2. TEKUĆE ULAGANJE:

4.2.1. Naziv ulaganja: **Sanacija pasarele od cijevne skele u luci Omišalj**

Opis: Radovi na sanaciji pasarele od cijevne skele.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: Ostvarenje planiranih rashoda za 2023. godinu su iznosu od 67.036,41 eura što je 100% planiranog iznosa od 67.038,00 eura za slijedeće:

- ✚ radovi na sanaciji pasarele od cijevne skele u iznosu od 65.443,75 eura što je 100% planiranog iznosa od 65.445,00 eura
- ✚ usluge stručnog nadzora na radovima na sanaciji pasarele od cijevne skele u iznosu od 1.592,66 eura što je 99,98% planiranog iznosa od 1.593,00 eura.

4.2.2. Naziv ulaganja: **Sanacija dijela obalnog zida u luci Omišalj**

Opis: Radovi na sanaciji dijela obalnog zida u luci Omišalj.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: Ostvarenje planiranih rashoda za 2023. godinu su iznosu od 61.405,30 eura što je 94,93% planiranog iznosa od 64.687,00 eura za slijedeće:

- ✚ usluge izrade projekta sanacije s troškovnikom radova za sanaciju dijela obalnog zida u iznosu 3.125,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 3.125,00 eura
- ✚ radovi na sanaciji dijela obalnog zida u iznosu od 55.780,30 eura što je 94,44% planiranog iznosa od 59.062,00 eura
- ✚ usluge stručnog nadzora na radovima na sanaciji dijela obalnog zida u iznosu od 2.500,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 2.500,00 eura.

4.2.3. Naziv ulaganja: **Vađenje i deponiranje postojećeg pontona i sidrenog sustava u luci Omišalj**

Opis: Usluge vađenje i deponiranje postojećeg pontona i sidrenog sustava u luci Omišalj.

Cilj: Nabava i montaža novog pontona u luci Omišalj.

Vrijednost: Ostvarenje planiranih rashoda za 2023. godinu su iznosu od 20.643,75 eura što je 100% planiranog iznosa od 20.644,00 eura za slijedeće usluge:

- ✚ vađenja i deponiranja postojećeg pontona u iznosu od 11.443,75 eura što je 100% planiranog iznosa od 11.444,00 eura

- vađenja i deponiranje sidrenog sustava u iznosu od 9.200,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 9.200,00 eura.

5. LUKA: PUNAT

5.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

5.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija i dogradnja dva gata na području Vele vode u luci Punt**

Opis projekta: Ovim projektom planira se rekonstrukcija i dogradnja dva gata na području Vele Vode u luci Punt. Rekonstrukcijom se predviđa produženje gatova za otprilike 50 m. Širina produženih dijelova biti će približna postojećim gatovima.

Cilj projekta: Svrha ovog projekta je izgradnja novih komunalnih vezova u luci Punt.



Provedba projekta: U 2023. godini planirala se izrada projektne dokumentacije te su za istu provedeni postupci jednostavne nabave i sklopljeni ugovori za usluge.

Vrijednost projekta: Rashodi za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 26.806,71 eura što je 58,01% planiranog iznosa od 46.212,00 eura koje se odnose na:

- ✚ usluge izrade geodetskog i hidrografskog snimanja u iznosu od 3.069,21 eura što je 100% planiranog iznosa od 3.069,00 eura
- ✚ usluge geomehaničkih istražnih radova u iznosu od 21.750,00 eura što je 97,21% planiranog iznosa od 22.375,00 eura
- ✚ usluge izrade elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u iznosu od 1.987,50 eura što je 59,95% planiranog iznosa od 3.315,00 eura.


U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2023. godine, a odnose se na slijedeće:

- ✚ usluge izrade glavnog projekta u iznosu od 13.604,00 eura
- ✚ usluge revizije glavnog projekta u iznosu od 3.318,00 eura
- ✚ upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole u iznosu od 531,00 eura.

Temeljem sklopljenog Ugovora s Općinom Punat u 2023. godini dobivena su sredstva za sufinanciranje usluge izrade projektne dokumentacije u iznosu od 24.819,21 eura, kao što je navedeno u izvršenju prihoda.

Izvor sredstava	Iznos	Struktura
Općina Punat	24.819,21	92,59%
Županijska lučka uprava Krk	1.987,50	7,41%
UKUPNO	26.806,71	

Izvori su/financiranja u 2023. godini



5.1.2. Naziv projekta: **Radovi na nabavi i montaži plutajućeg pontonskog gata u luci Punat**

Opis projekta: Ovim projektom planira se postavljanje jednog plutajućeg gata dužine cca 36,00 m, širine 2,40 m. Plutajući elementi gata su međusobno povezani elastičnom vezom, a njihov stalni položaj u moru je osiguran preko sidrenih lanaca pričvršćenih za sidrene betonske blokove. Gat se na bočnim stranicama oprema bitvama ili prstenima (anelima) za privez plovila, a nalaze se na udaljenosti od oko 2,0 ($\pm 0,5$) m, ovisno o proizvođaču pontona.

Cilj projekta: Svrha ovog projekta je izgradnja novih vezova u luci Punat.

Provedba projekta: U 2023. godini planirala se izrada projektne dokumentacije te je izrađeno idejno rješenje.

Vrijednost projekta: Rashodi za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 3.250,00 eura što je 17,43% planiranog iznosa od 18.650,00 eura koje se odnose na:

- ✚ usluge izrade idejnog rješenja u iznosu od 3.250,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 3.250,00 eura.

U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2023. godine, a odnose se na slijedeće:

- ✚ usluge izrade geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole u iznosu od 2.500,00 eura
- ✚ usluge izrade maritimne studije u iznosu od 4.750,00 eura
- ✚ usluge izrade glavnog projekta u iznosu od 8.000,00 eura
- ✚ upravna pristojba za građevinsku dozvolu u iznosu od 150,00 eura.

6. LUKA: ŠILO

6.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

6.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke Šilo**

Opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija luke Šilo.

Cilj projekta: Uređenje u luci Šilo poduzima se u svrhu razvoja i sigurnosti luke.



Provedba projekta: U 2023. godini planirala se izmjena idejnog rješenja.

Vrijednost projekta: Rashodi za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 3.250,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 3.250,00 eura koje se odnose na:


- 🚧 usluge izrade izmjene i dopune idejnog rješenja u iznosu od 3.250,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 3.250,00 eura.

6.2. TEKUĆE ULAGANJE:

6.2.1. Naziv ulaganja: **Sanacija školjere i fugiranje valobranog zida u luci Šilo**

Opis: Planira se sanacija školjere i fugiranje valobranog zida u luci Šilo.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

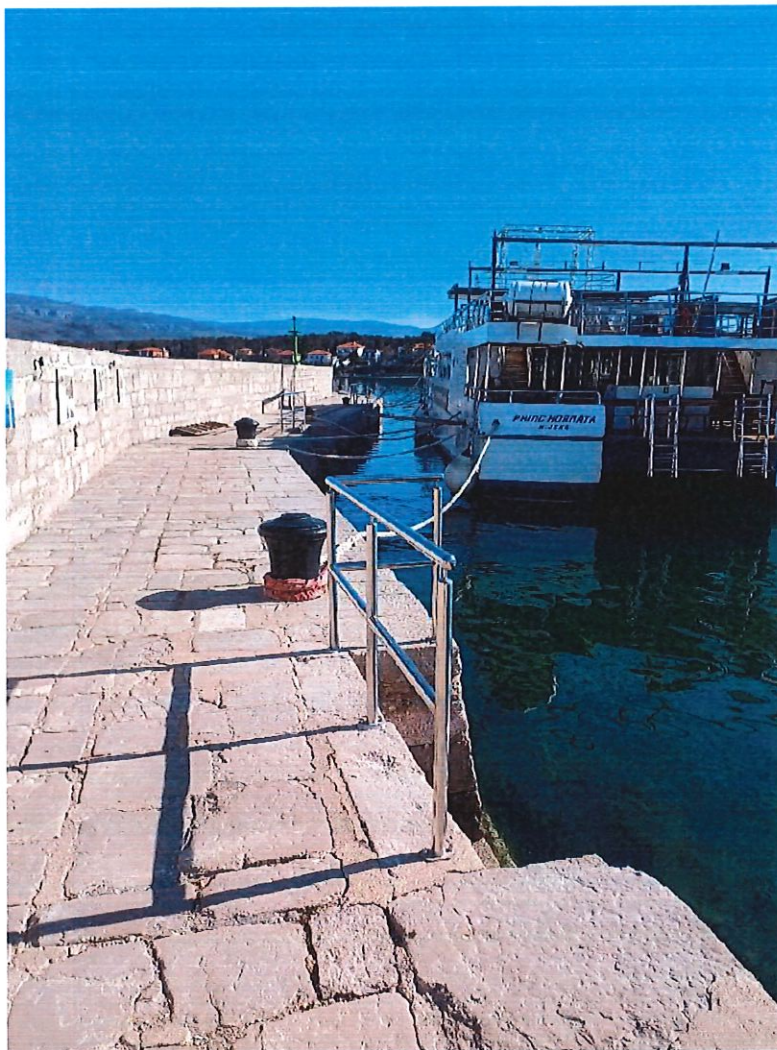

Vrijednost: Ostvarenje planiranih rashoda za 2023. godinu su iznosu od 23.920,00 eura što je 99,75% planiranog iznosa od 23.979,00 eura za slijedeće:

- ✚ usluge izrade troškovnika sa skicom tehničkog rješenja u iznosu od 1.250,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 1.250,00 eura
- ✚ radovi na sanaciji školjere i fugiranje valobranog zida u iznosu od 22.670,00 eura što je 99,74% planiranog iznosa od 22.729,00 eura.


7. LUKA: VALBISKA

7.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

7.1.1. Naziv projekta: Izrada natkrivenog prostora za prijem vozila Hitne pomoći

Opis projekta: Projektom se planira izrada natkrivenog prostora za prijem vozila Hitne pomoći.

Cilj projekta: Prostor za sigurno korištenje za vozila.

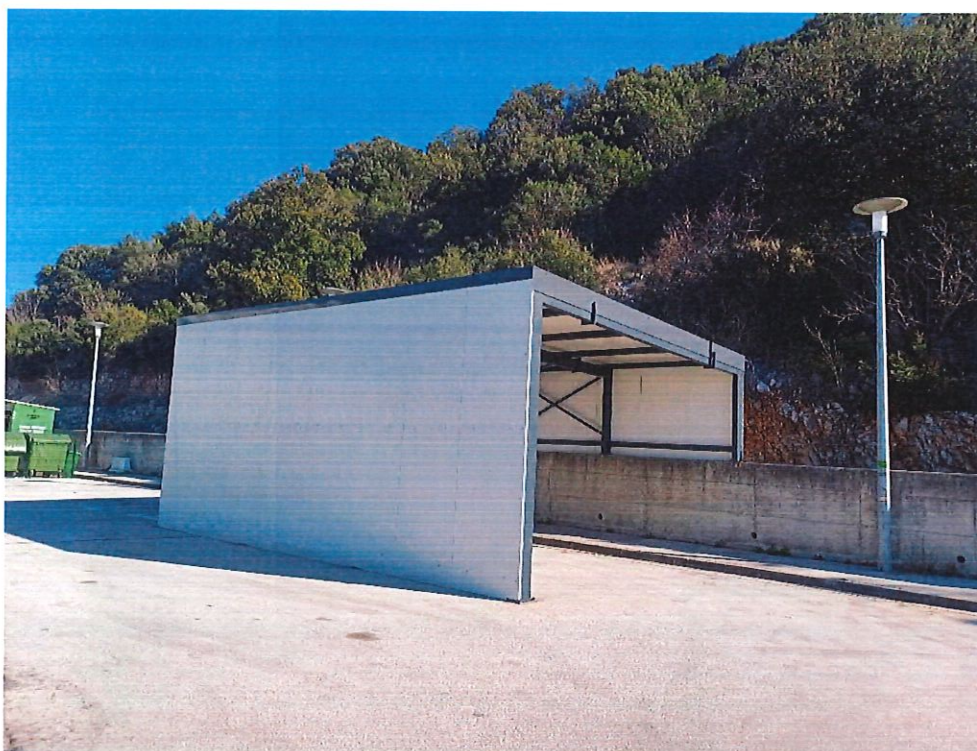

Provedba projekta: U 2023. godini izvršena je izrada projektne dokumentacije i radovi.

Vrijednost projekta: Rashodi za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 31.435,05 eura što je 100,53% planiranog iznosa od 31.268,00 eura koje se se odnose na:

- ✚ usluge izrade glavnog projekta s troškovnikom u iznosu od 2.875,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 2.875,00 eura
- ✚ usluge geodetskog snimka stvarnog stanja u svrhu projektiranja metalne nadstrešnice u iznosu od 250,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 250,00 eura
- ✚ radovi na izradi natkrivenog prostora u iznosu od 27.310,05 eura što je 101,11% planiranog iznosa od 27.010,00 eura
- ✚ usluge stručnog nadzora u iznosu od 1.000,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 1.000,00 eura.


U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2023. godine, a odnose se na slijedeće:

- ✚ upravna pristojba za potvrdu glavnog projekta u iznosu od 133,00 eura.

Temeljem sklopljenog Ugovora s Primorskom-goranskom županijom u 2023. godini dobivena su sredstva za sufinanciranje radova na izradi natkrivenog prostora u iznosu od 27.010,00 eura, kao što je navedeno u izvršenju prihoda.

Izvor sredstava	Iznos	Struktura
Primorsko-goranska županija	27.010,00	85,92%
Županijska lučka uprava Krk	4.425,05	14,08%
UKUPNO	31.435,05	


Izvori su/financiranja u 2023. godini



7.1.2. Naziv projekta: Nabava i postavljanje prijenosne kamene kućice

Opis projekta: Projektom se planira nabava i postavljanje prijenosne kamene kućice.

Cilj projekta: Nabava kamene kućice za prodaju karata za linijski obalni pomorski promet.

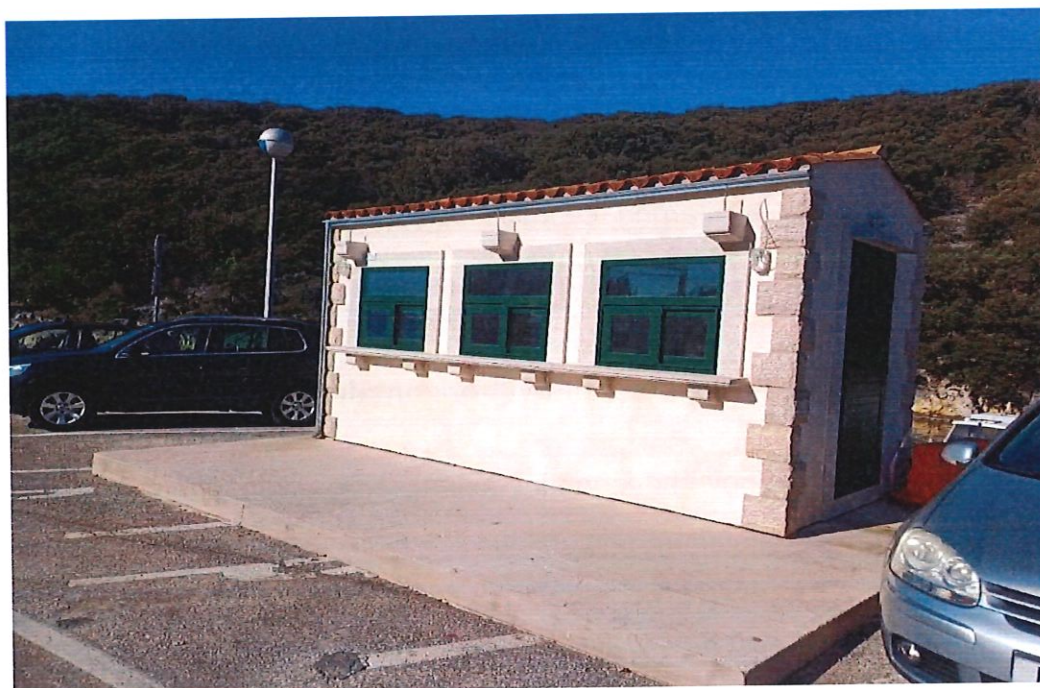

Provedba projekta: U 2023. godini izvršeni su radovi i nabava prijenosne kamene kućice.

Vrijednost projekta: Rashodi za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 27.873,75 eura što je 99,41% planiranog iznosa od 28.038,00 eura koje se odnose na:

-  radovi na uređenju platoa za montažnu kućicu u iznosu od 10.623,75 eura što je 98,51% planiranog iznosa od 10.784,00 eura
-  nabava i montaža prijenosne kućice u iznosu od 17.250,00 eura što je 99,98% planiranog iznosa od 17.254,00 eura.

U 2023. godini stavljena je u uporabu investicija u iznosu od 27.873,75 eura.

7.2. TEKUĆE ULAGANJE:

7.2.1. Naziv ulaganja: **Radovi na čeličnoj rampi za trajekt**

Opis: Potrebno je izvršiti sanaciju na čeličnoj rampi za trajekt u luci Valbiska

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost projekta: U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2023. godine, a odnose se na slijedeće:

-  radovi na čeličnoj rampi za trajekt u iznosu od 6.636,00 eura.

7.2.2. Naziv ulaganja: **Radovi na sanaciji sanitarnog čvora**

Opis: Potrebno je izvršiti sanaciju sanitarnog čvora u luci Valbiska

Cilj: Održavanje sanitarnog čvora.

Vrijednost projekta: Rashodi za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 34.906,28 eura što je 100% planiranog iznosa od 34.907,00 eura koje se odnose na:

-  radovi na sanaciji sanitarnog čvora u iznosu od 34.906,28 eura što je 100% planiranog iznosa od 34.907,00 eura.

7.2.3. Naziv ulaganja: **Radovi na obnovi horizontalne signalizacije u luci Valbiska**

Opis: Potrebno je izvršiti obnovu horizontalne signalizacije u luci Valbiska

Cilj: Održavanje reda na trajektnom pristaništu.

Vrijednost projekta: Rashodi za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 8.841,46 eura što je 100% planiranog iznosa od 8.842,00 eura koje se odnose na:

- radovi na obnovi horizontalne signalizacije u iznosu od 8.841,46 eura što je 100% planiranog iznosa od 8.842,00 eura.


8. LUKA: VRBNIK

8.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

8.1.1. Naziv projekta: **Dogradnja luke – faza L1 i faza L2**

Opis projekta: Faza L1: izvedba novog lukobrana, koji je planiran ispred postojećeg lukobrana Novi porat, na zapadnoj obali luke te zgrade vidikovca s utilitarnim suterenskim prostorijama u korijenu lukobrana. Lukobran je predviđen kao nasuti tipa "Jetty": masivni betonski zid na temeljnom nasipu s unutarne strane, te kamena obalozaštita - školjera s vanjske strane lukobrana. Pruža se u smjeru približno sjever - jug. Širina partera lukobrana iznosi 4,0 m, a širina valobranog zida 1,6 m.

Cilj projekta: Sigurnost i zaštita luke.

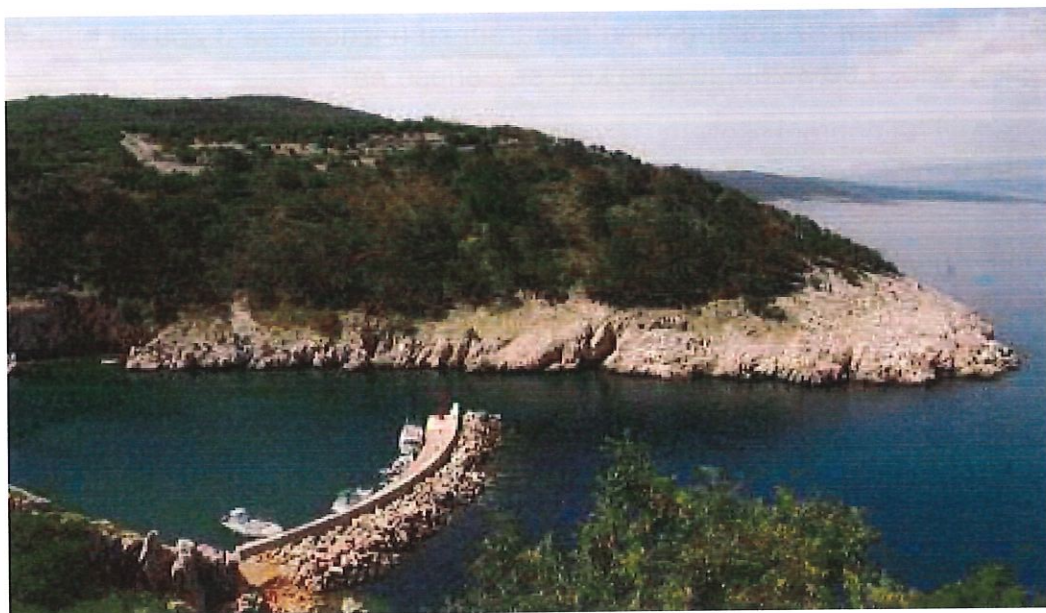

Provedba projekta: U 2023. godini dobivene su građevinske dozvole za L1 i L2 fazu.

Vrijednost projekta: Rashodi za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 2.083,75 eura što je 7,16% planiranog iznosa od 29.084,00 eura koje se odnose na:

- upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za fazu L1 – izgradnja novog lukobrana u iznosu od 1.844,85 što je 100% planiranog iznosa od 1.845,00 eura

- ✚ upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za fazu L2 – izgradnja nove betonske pasarele u iznosu od 238,90 eura što je 100% planiranog iznosa od 239,00 eura.

U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2023. godine, a odnose se na slijedeće:

- ✚ studija izvodljivosti za pripremu projekta Rekonstrukcije luke Vrbnik – Faza L1 na natječaj – zaštita lučkog akvatorija i izgradnja komunalnih vezova u iznosu od 27.000,00 eura.

8.2. TEKUĆE ULAGANJE:

8.2.1. Naziv ulaganja: **Radovi na dohrani školjere u luci Vrbnik bazen Sv. Marak**

Opis: Potrebno je izvršiti dohrane školjere u luci Vrbnik bazen Sv. Marak.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: Rashodi za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 3.250,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 3.250,00 eura koje se odnose na:

- ✚ radovi na dohrani školjere u iznosu od 3.250,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 3.250,00 eura.

9. LUKA: GLAVOTOK

9.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

9.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija operativnog gata u luci Glavotok**

Opis projekta: Projektnim rješenjem predviđena je rekonstrukcija operativnog gata u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Glavotok. Rekonstrukcija je planirana uglavnom u nadmorskom dijelu gata. Predviđa se preslaganje u pravcu postojeće kamene obloge zida koliko je to moguće više prema morskom rubu postojeće betonske plombe, izvedba nad morem novog armirano-betonskog zida (serklaža) po obodu cijelog gata, uređenje podloge armiranobetonske ploče i izvođenje same ploče s funkcijom podloge za slaganje kamene obloge, kao završnog uređenja partera. Sa sjeverne strane gata, u njegovom korijenu, planira se na dijelu gdje nema betonske plombe izvesti novu betonsku oblogu obale. Gat se planira opremiti novim, lijevano-željeznim bitvama te priveznim prstenovima - anelima.

Cilj projekta: Održavanje i sigurnost u luci.



Provedba projekta: Projekt Rekonstrukcija operativnog gata u luci Glavotok započeo je u 2022. godini, te je završen u 2023. godini.

- Nakon provedenog postupka javne nabave radi odabira izvođača radova potpisan je Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji operativnog gata u luci Glavotok Ev. broj nabave: EV-M-27/22 s ALPHA SUB iz Rijeke. Ugovor je potpisan dana 28. rujna 2022. godine u iznosu 1.969.744,00 kuna (261.429,96 eura) bez PDV-a, odnosno 2.462.180,00 kuna (326.787,44 eura) s PDV-om. Rok za izvođenje svih radova je 4 mjeseci od dana uvođenja u posao.
- Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora za rekonstrukciju operativnog gata u luci Glavotok sklopljen je s Marecon d.o.o. iz Rijeke dana 02. rujna 2022. godine. Iznos ugovorenih usluga je 55.000,00 kuna (7.299,75 eura) bez PDV-a, odnosno 68.750,00 kuna (9.124,69) eura s PDV-om sklopljen na temelju provedenog postupka jednostavne nabave u 2022. godini.

U mjesecu lipnju obavljen je tehnički pregled te je dobivena uporabna dozvola za rekonstrukciju operativnog gata u luci Glavotok prema građevinskoj dozvoli od 2022. godine.


Vrijednost projekta: Ukupni rashodi u 2023. godini za Rekonstrukciju operativnog gata u luci Glavotok ostvareni su u iznosu od 140.036,87 eura što je 99,97% planiranog iznosa od 140.077,00 eura za radove i usluge koje se odnose na:

- ✚ rashode za radove u iznosu od 136.997,97 eura što je 100% planiranog iznosa od 136.999,00 eura
- ✚ usluge stručnog nadzora u iznosu od 2.281,18 eura što je 100% planiranog iznosa od 2.281,00 eura
- ✚ snimak izvedenog stanja, izjava ovlaštenog inženjera geodezije o usklađenosti izvedenog stanja i geodetskog projekta, hidrografska izmjera nakon izvedenih radova u iznosu od 625,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 625,00 eura
- ✚ upravna pristojba za uporabnu dozvolu u iznosu od 132,72 eura što je 100% planiranog iznosa od 133,00 eura.

Temeljem sklopljenog Ugovora s Gradom Krkom u 2023. godini dobivena su sredstva za sufinanciranje radova i usluga rekonstrukcije luke Glavotok u iznosu od 84.718,21 eura, kao što je navedeno u izvršenju prihoda.

Izvor sredstava	Iznos	Struktura
Grad Krk	84.718,21	60,50%
Županijska lučka uprava Krk	55.318,66	39,50%
UKUPNO	140.036,87	

Izvori su/financiranja u 2023. godini

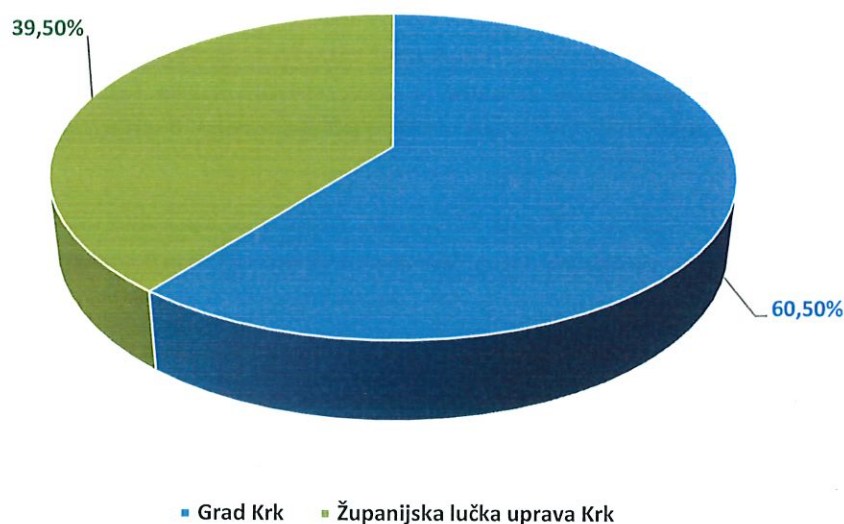

U 2023. godini investicija je stavljena u uporabu u iznosu od 313.343,76 eura.

Rashodi cjelokupne investicije odnose se na slijedeće:


Rashodi	Iznos	Struktura
Radovi	288.627,73	92,11%
Usluge	23.901,27	7,63%
Ostali rashodi	814,76	0,26%
UKUPNO	313.343,76	



Izvori su/financiranja cjelokupnog projekta su slijedeći:

Izvor sredstava	Iznos	Struktura
Primorsko-goranska županija	119.450,53	38,12%
Grad Krk	148.876,20	47,51%
Županijska lučka uprava Krk	45.017,03	14,37%
UKUPNO	313.343,76	

Izvori su/financiranja projekta



10. LUKA: KLIMNO

10.1. TEKUĆE ULAGANJE:

10.1.1. Naziv ulaganja: **Radovi na produbljivanju akvatorija luke Klimno**

Opis: Ovim projektom planira se produbljivanje akvatorija krajnjeg jugozapadnog dijela luke. Lokacija zahvata je privezište na jugozapadnom dijelu luke Klimno. Tlocrtna površina zahvata na podmorskom iskopu iznosi 2.416,21 m². Radovi na produbljivanju akvatorija luke Klimno odnose se na podmorski iskop muljevitog materijala do dubine -2,00 m.n.m te transport i odlaganje materijala iz podmorskog iskopa na deponiju.

Cilj: Svrha ovog projekta je osigurati dovoljnu dubinu dna akvatorija luke Klimno radi sigurnosti uplovljavanja i isplovljavanja plovnih objekata.



Provedba projekta: Planirana sredstva nisu izvršena jer je u prosincu 2023. godine dobiveno rješenje da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš koje je izdalo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Vrijednost: U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2023. godine, a odnose se na slijedeće:

- ✚ Idejni projekt za produbljivanje morskog dna u iznosu od 3.302,00 eura
- ✚ Upravna pristojba za ishodovanje lokacijske dozvole u iznosu od 265,00 eura.

11. LUKA: LOKVIŠĆA

11.1. TEKUĆE ULAGANJE:

11.1.1. Naziv ulaganja: **Radovi na sanaciji kamenog opločenja na rubu rive u luci Lokvišća**

Opis: Potrebno je izvršiti radove na sanaciji kamenog opločenja na rubu rive u luci Lokvišća duljine 180, m'.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: Rashodi za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 5.700,00 eura što je 66,07% planiranog iznosa od 8.627,00 eura koje se odnose na:

- ✚ radovi na sanaciji kamenog opločenja na rubu rive u iznosu od 5.700,00 eura što je 66,07% planiranog iznosa od 8.627,00 eura.

12. LUKA: NJIVICE

12.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

12.1.1. Naziv ulaganja: **Izrada sidrenog sustava u luci Njivice**

Opis: Izrada sidrenog sustava u luci Njivice za 10 novih vezova ispred hotela Jadrana.

Cilj: Korištenje novih vezova.

Provedba projekta: U 2023. godini izvršeni su radovi na izradi sidrenog sustava u luci Njivice za 10 novih vezova.

Vrijednost: Rashodi za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 9.887,50 eura što je 99,33% planiranog iznosa od 9.954,00 eura koje se odnose na:

- ✚ Izradi sidrenog sustava u iznosu od 9.887,50 eura što je 99,33% planiranog iznosa od 9.954,00 eura.

U 2023. godini investicija je stavljena u uporabu u iznosu od 9.887,50 eura.

13. LUKA: PORAT

13.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

13.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke Porat – I faza – 2. uporabna cjelina**

Opis projekta: Ovim zahvatom obuhvaćena je izvedba armiranobetonskog valobranog zida s vanjske strane lukobrana i rekonstrukciju obrambenog valobranog kamenometa. Radovi također obuhvaćaju kameno opločenje šetnice i asfaltiranje kolnika lukobrana.

Cilj projekta: : Bolja zaštićenost akvatorija luke od vjetrova i valova te povećanje broja vezova i standarda u luci.



Provedba projekta: Projekt Rekonstrukcija luke Porat – 2. Uporabna cjelina započeo je u 2022. godini, te je završen u 2023. godini.

- U 2022. godini proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača radova u kojem procijenjena vrijednost radova iznosi 5.500.000,00 kuna sa PDV-om. Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji luke Porat – I faza – 2. uporabna cjelina sklopljen je dana 20. rujna 2022. godine s izvođačem G.A.M.I.K. d.o.o. u iznosu 3.531.150,00 kuna (468.664,14 eura) bez PDV-a, odnosno 4.413.937,50 kuna (585.830,18 eura) s PDV-om. Rok za izvođenje svih radova je 5 mjeseci od dana uvođenja u posao. Dodatak 1. Ugovora sklopljen je dana 16. veljače 2023. godine

zbog produljenja roka zbog nepovoljnih vremenskih prilika te je rok izvođenja radova produžen do 07. travnja 2023. godine.

- Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova za rekonstrukciju luke Porat sklopljen je s Seacon d.o.o. iz Rijeke dana 02. rujna 2022. godine. Iznos ugovorenih usluga je 116.000,00 kuna (15.395,85 eura) bez PDV-a, odnosno 145.000,00 kuna (19.244,81 eura) s PDV-om sklopljen na temelju provedenog postupka jednostavne nabave u 2022. godini.
- Ugovor o pružanju usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova i usluge izrade plana izvođenja radova na rekonstrukciji luke Porat sklopljen je s TIM d.o.o. iz Rijeke dana 02. rujna 2022. godine. Iznos ugovorenih usluga je 23.000,00 kuna (3.052,62 eura) bez PDV-a, odnosno 28.750,00 kuna (3.815,78 eura) s PDV-om sklopljen na temelju provedenog postupka jednostavne nabave u 2022. godini.
- Ugovor za uslugu projektantskog nadzora nad izvođenjem radova sklopljen je s Seacon d.o.o. iz Rijeke dana 28. rujna 2022. godine. Iznos ugovorenih usluga je 19.900,00 kuna (2.641,18 eura) bez PDV-a, odnosno 24.875,00 kuna (3.301,48 eura) s PDV-om

U mjesecu lipnju obavljen je tehnički pregled te je dobivena uporabna dozvola za rekonstrukciju luke Porat 1. faza – 2. uporabna cjelina prema građevinskoj dozvoli od 2021. godine i izmjeni i dopuni građevinske dozvole iz 2023. godine.

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi u 2023. godini za Rekonstrukciju luke Porat 1. faza – 2. uporabna cjelina ostvareni su u iznosu od 92.650,55 eura što je 96,37% planiranog iznosa od 96.144,00 eura za radove i usluge koje se odnose na:

- ✚ rashode za radove u iznosu od 78.821,46 eura što je 100% planiranog iznosa od 78.822,00 eura
- ✚ usluge stručnog nadzora u iznosu od 7.697,93 eura što je 100% planiranog iznosa od 7.698,00 eura
- ✚ usluge koordinatora zaštite na radu u iznosu od 1.327,22 eura što je 99,79% planiranog iznosa od 1.330,00 eura
- ✚ usluge projektantskog nadzora u iznosu od 1.320,59 eura što je 98,77% planiranog iznosa od 1.337,00 eura
- ✚ usluge izrade parcelacijskog elaborata nakon građevinske dozvole, snimak izvedenog stanja, izjava ovlaštenog inženjera geodezije o usklađenosti izvedenog stanja i geodetskog projekta, hidrografska izmjera nakon izvedenih radova u iznosu od 3.250,00 eura što je 54,41% planiranog iznosa od 5.973,00 eura
- ✚ upravna pristojba za uporabnu dozvolu u iznosu od 233,35 eura što je 100% planiranog iznosa od 234,00 eura.


U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena, a odnose se na slijedeće:

🚧 usluge izrade geodetskog elaborata za formiranje čestice u iznosu od 750,00 eura.

U 2023. godini investicija je stavljena u uporabu u iznosu od 653.891,16 eura.

Rashodi cjelokupne investicije odnose se na sljedeće:


Rashodi	Iznos	Struktura
Radovi	565.921,75	86,55%
Usluge	83.765,82	12,81%
Ostali rashodi	4.203,59	0,64%
UKUPNO	653.891,16	

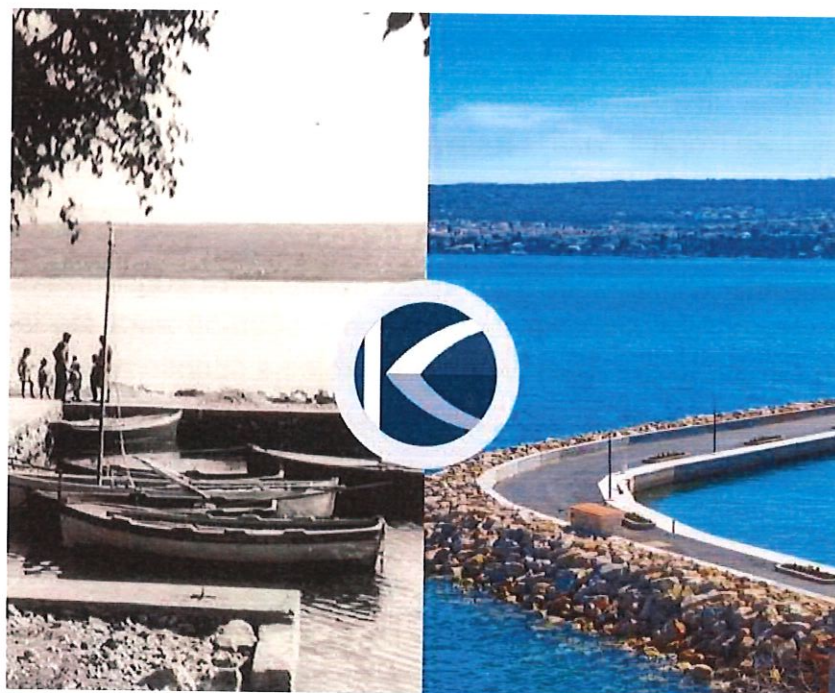

Izvori su/financiranja cjelokupnog projekta su sljedeći:

Izvor sredstava	Iznos	Struktura
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	474.264,33	72,53%
Općina Malinska-Dubašnica	66.361,40	10,15%
Županijska lučka uprava Krk	113.265,42	17,32%
UKUPNO	653.891,16	

Izvori su/financiranja projekta



13.1.2. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke Porat – I faza – 3. uporabna cjelina (valobran)**

Opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija u luci Porat na I fazi – 3. uporabna cjelina 3 u svrhu montaže valobrana za zaštitu luke. I faza je podijeljena na 3 uporabne cjeline od kojih su 2 uporabne cjeline već napravljene. Izrada projektne dokumentacije je planirana u 2023. godini i planira se nastaviti u 2024. godini.

Cilj projekta: Postavljanje valobrana radi sigurnosti luke.

Provedba projekta: U 2023. godini pokrenuti su postupci izmjene projektne dokumentacije radi I faze – 3. uporabne cjeline.

Vrijednost projekta: U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja godine, a odnose se na slijedeće:

-  usluge izrade izmjene idejnog projekta u iznosu od 6.250,00 eura
-  geodetski elaborat za provedbu lokacijske dozvole u iznosu od 2.500,00 eura
-  usluge izrade ažuriranja maritimne studije u iznosu od 4.750,00 eura.

14. LUKA: SVETA FUSKA

14.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

14.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke Sveta Fuska**

Opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija luke Sveta Fuska.

Cilj projekta: Uređenje u luci Sveta Fuska poduzima se u svrhu razvoja i sigurnosti luke.

Vrijednost projekta: U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja godine, a odnose se na slijedeće:


🚧 usluge izrade projektne dokumentacije u iznosu od 6.636,00 eura.

14.1.2. Naziv ulaganja: **Nabava i montaža dizalice**

Opis projekta: Ovim zahvatom planirana je nabava i montaža dizalice u luci Sveta Fuska

Cilj projekta: Pružanje usluga korisnicima.

Provedba projekta: Projekt nabave i montaže dizalice je započeo u 2023. godini, te će biti završen u 2024. godini.

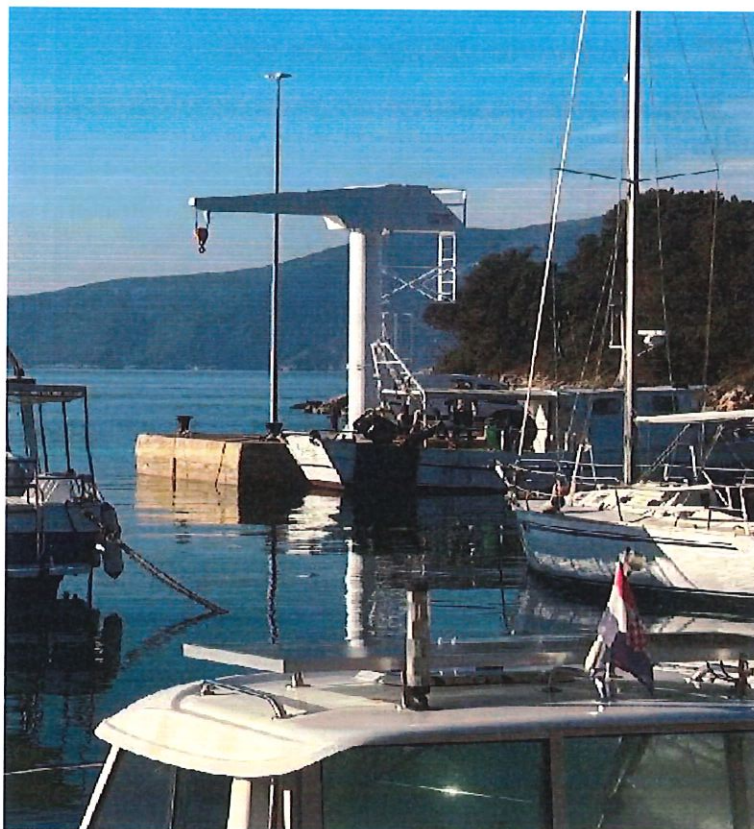

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 57.063,23 eura što je 95,62% planiranog iznosa od 59.675,00 eura za radove i usluge koje se odnose na:

- ✚ usluge izrade geodetske podloge za nabavu i montažu dizalice u iznosu od 1.125,00 eura što je 96,90% planiranog iznosa od 1.161,00 eura
- ✚ usluge izrade glavnog projekta temelja za montažu dizalice u iznosu od 6.370,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 6.371,00 eura
- ✚ nabava i montaža dizalice u iznosu od 36.187,50 eura što je 95,07% planiranog iznosa od 38.063,00 eura
- ✚ rashode za radove za temelje radi montažu dizalice u iznosu od 11.522,73 eura što je 99,36% planiranog iznosa od 11.597,00 eura
- ✚ usluge stručnog nadzora za radove na temeljima za postavljanje dizalice u iznosu od 1.858,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 1.858,00 eura


U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena, a odnose se na sljedeće:

- ✚ usluge atestiranja dizalice i izdavanje dozvole za rad dizalice u iznosu od 625,00 eura.

Temeljem sklopljenog Ugovora s Primorsko-goranskom županijom u 2023. godini dobivena su sredstva za sufinanciranje nabave i montaže dizalice u iznosu od 13.250,00 eura, kao što je navedeno u izvršenju prihoda.

Izvor sredstava	Iznos	Struktura
Primorsko-goranska županija	13.250,00	23,22%
Županijska lučka uprava Krk	43.813,23	76,78%
UKUPNO	57.063,23	

Izvori su/financiranja u 2023. godini



15. LUKA: VANTAČIĆI

15.1. TEKUĆE ULAGANJE:

15.1.1. Naziv ulaganja: **Sanacija obalnog zidića u luci Vantačići**

Opis: Planira se sanacija obalnog zidića u luci Vantačići.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Provedba projekta: U 2023. godini izvršeni su radovi na sanaciji obalnog zidića.

Vrijednost: Rashodi za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 27.118,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 27.118,00 eura koje se odnose na:

-  radovi na sanaciji u iznosu od 25.618,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 25.618,00 eura
-  usluge stručnog nadzora nad radovima u iznosu od 1.500,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 1.500,00.

16. LUKA: VELA JANA

16.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

16.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke Vela Jana**

Opis projekta: U sklopu rekonstrukcije luke Vela Jana planira se ojačanje konstrukcije izvedenih spremišta, uklanjanje dva sjeveroistočna gata te izgradnja novih na tom dijelu, proširenje i produženje postojećeg istezališta za plovila, proširenje kolne površine sa zapadne strane istezališta radi omogućavanja lakšeg okretanja vozila te izvedbe novog obalnog zida u tom dijelu, izvedba spojne ceste u korijenu uvale kako bi se mogle prometno spojiti dvije strane uvale koje u današnjem stanju to nisu, uređenje novog obalnog platoa u dijelu na divlje uređenih mulića koji čine manje mandračke na istočnoj strani uvale, te uklanjanje dva izvedena gata na istočnoj strani uvale i izgradnja dva nova gata na približnim položajima izvedenih gatova.

Cilj projekta: Projekt je planiran radi proširenja lučkih kapaciteta i povećanja broja komunalnih i nautičkih vezova.



Vrijednost projekta: U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja godine, a odnose se na slijedeće:

- 🚧 usluge geodetskih radova za potrebe izrade idejnog i glavnog projekta za građenje luke Vela Jana u iznosu od 4.375,00 eura.

16.2. TEKUĆE ULAGANJE:

16.2.1. Naziv ulaganja: **Sanacija oštećenja na dijelu područja komunalnih vezova**

Opis: Planira se sanacija oštećenja na dijelu područja komunalnih vezova luke Vela Jana.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja godine, a odnose se na slijedeće:

- 🚧 Radovi na sanaciji oštećenja na dijelu područja komunalnih vezova u iznosu od 4.645,00 eura.

17. LUKA: VOZ

17.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:


17.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija operativnog gata u luci Voz**

Opis projekta: Rekonstrukcija operativnog gata u luci Voz – „ribarska luka” - Unutar zahvata u prostoru smješten je postojeći operativni gat koji je dio luke otvorene za javni promet lokalnog značaja. Rekonstrukcija podrazumijeva uklanjanje kompletnog postojećeg operativnog gata te na njegovom mjestu izgradnja novog operativnog gata dužine 35,00 m i širine 6,50 m. Konstrukcija novog gata planirana je kao raščlanjena konstrukcija temeljena na dva reda „Benotto” pilota. Također se planira dogradnja masivnog obalnog zida u korijenu gata, izvedba zaštitne betonske obloge postojećeg zida u korijenu gata te uklapanje novog gata u postojeći teren.

Od opreme na operativnom gatu planirano je montiranje novih polera, mornarskih ljestvi te energetskih ormarića za opskrbu brodica vodom i strujom.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 682.116,80 eura bez PDV-a odnosno 852.646,00 eura sa PDV-om.

Cilj projekta: Rekonstrukcija operativnog gata u luci Voz – „ribarska luka” poduzima se u cilju omogućavanja sigurnog ukrcajno iskrcajnog mjesta za ribare i za privez ribarskih brodova.

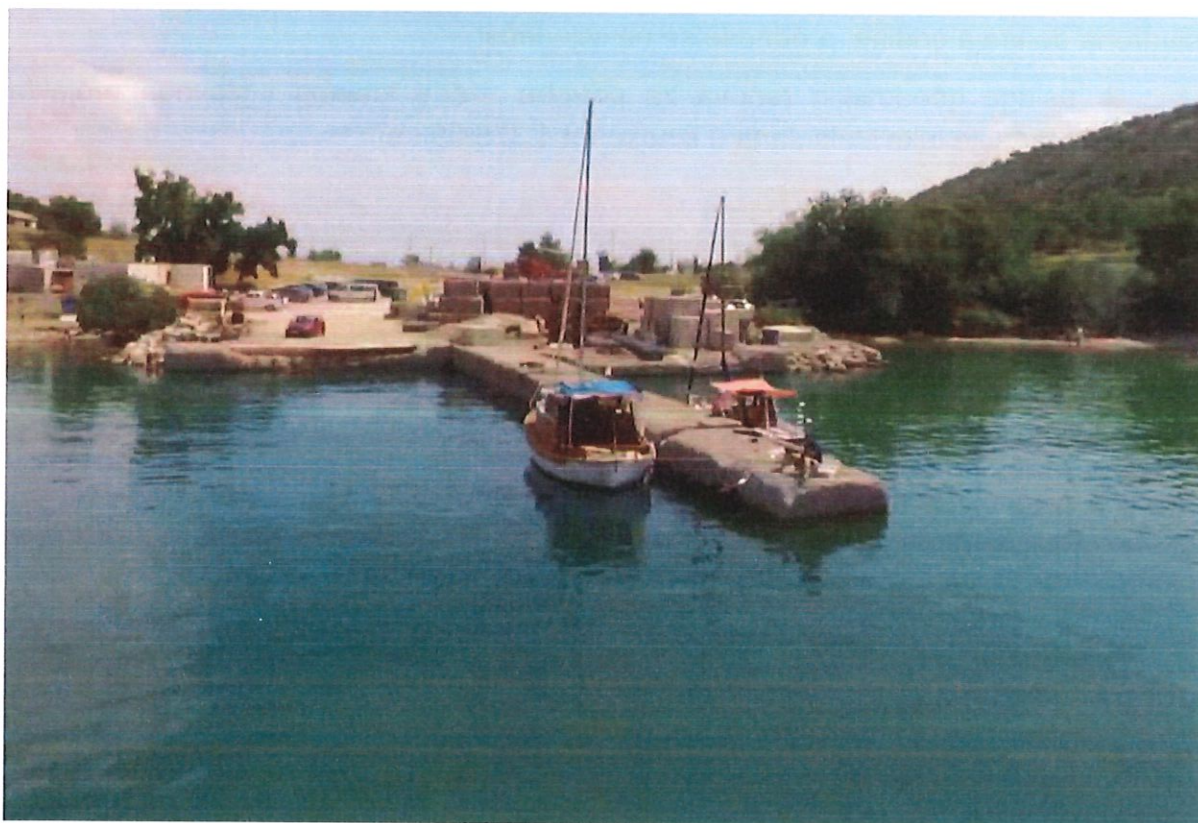

Provedba projekta: Ugovorene i izvršene su usluge izrade glavnog projekta, geodezije, maritimne studije te revizija prema Financijskom planu za 2023. godinu za planirani projekt.

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za Rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz ostvareni su u iznosu od 26.429,35 eura što je 46,15% planiranog iznosa od 57.271,00 eura za usluge koje se odnose na:

- ✚ usluge izrade glavnog projekta u iznosu od 11.537,50 eura što je 100% planiranog iznosa od 11.547,00 eura
- ✚ usluga izrade geodezije u iznosu od 1.858,13 eura što je 100% planiranog iznosa od 1.858,00 eura
- ✚ usluga izrade geomehaničkih istražnih radova u iznosu od 3.235,11 eura što je 97,50% planiranog iznosa od 3.318,00 eura
- ✚ usluge izrade maritimne studije u iznosu od 7.548,61 eura što je 99,78% planiranog iznosa od 7.565,00 eura
- ✚ usluge revizije glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija i geotehničkih konstrukcija u iznosu od 2.250,00 što je 89,21% planiranog iznosa od 2.522,00 eura.

U Financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva za usluge koje nisu ostvarene u 2023. godini, a odnose se na slijedeće:

- ✚ usluge izrade izvedbenog projekta u iznosu od 11.116,00 eura
- ✚ usluge revizije izvedbenog projekta u iznosu od 2.489,00 eura
- ✚ usluge izrade pripreme poslovnog plana za prijavu na natječaj Ministarstva poljoprivrede, Uprava za ribarstvo u iznosu od 16.590,00 eura
- ✚ upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju operativnog gata u iznosu od 266,00 eura.

Temeljem sklopljen Ugovora s Primorsko-goranskom županijom u 2023. godini dobivena su sredstva za sufinanciranje usluga izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije operativnog gata u iznosu od 26.429,35 eura, kao što je navedeno u izvršenju prihoda.

Izvor sredstava za izradu projektne dokumentacije	Iznos	Struktura
Primorsko-goranska županija	26.429,35	100%
UKUPNO	26.429,35	

U 2023. godini su se slijedeće investicije stavile u uporabu u iznosu od eura 1.004.996,17 eura:

- ✚ Rekonstrukcija luke Porat – I faza – 2. Uporabna cjelina u iznosu 653.891,16 eura
- ✚ Sidreni sustav u luci Njivice u iznosu 9.887,50 eura
- ✚ Rekonstrukcija operativnog gata u iznosu 313.343,76 eura
- ✚ Montažna kućica u luci Valbiska u iznosu od 27.873,75 eura

KOMUNALNA OPREMA

U lukama na području Županijske lučke uprave Krk ostvareni su slijedeći rashodi u ukupnom iznosu od 45.245,16 eura za nabavu slijedeće komunalne opreme:

- ✚ kolica za brodice na istezalištu (2 komada) u luci Omišalj u iznosu od 1.250,00 eura što je 26,91% planiranog iznosa od 4.645,00 eura
- ✚ ormarići za struju i vodu (12 komada) u iznosu od 20.399,98 eura što je 99,98% planiranog iznosa od 20.405,00 eura
- ✚ ormarić za struju i vodu - jači (1 komad) u luci Malinska u iznosu od 1.900,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 1.900,00 eura
- ✚ usporivači za kolnik u luci Valbiska u iznosu od 937,33 eura što je 99,72% planiranog iznosa od 940,00 eura
- ✚ lučko svjetlo u luci Vrbnik i solarna lampa u iznosu od 12.815,19 eura što je 99,99% planiranog iznosa od 12.816,00 eura
- ✚ agregat u iznosu od 1.470,70 eura što je 98,05% planiranog iznosa od 1.500,00 eura
- ✚ inox polirani stupići (5 komada) u iznosu od 2.006,25 eura što je 99,96% planiranog iznosa od 2.007,00 eura
- ✚ interpretacijske ploče za luke Porat i Glavotok u iznosu od 889,17 što je 71,13% planiranog iznosa od 1.250,00 eura
- ✚ koševi za otpatke i klupe u luci Porat u iznosu od 2.908,55 što je 99,95% planiranog iznosa od 2.910,00 eura
- ✚ solarna rampa i rasvjetni stup u luci Klimno u iznosu od 667,99 eura što je 100% planiranog iznosa od 668,00 eura

U lukama na području Županijske lučke uprave Krk do kraja 2023. godine nisu ostvareni su slijedeći planirani rashodi u ukupnom iznosu od 28.103,00 eura za nabavu slijedeće komunalne opreme:

- ✚ ormarić za vodu sa dvije špine u luci Čižići u iznosu od 372,00 eura
- ✚ solarna lampa za valobran u luci Malinska u iznosu od 664,00 eura

-  ograda na kuli lučkog svjetla u Klimnu u iznosu od 1.825,00 eura
-  betonske klupice i betonski stol u luci Vela Jana u iznosu od 1.400,00 eura
-  nabava i montaža kamenih klupica u luci Glavotok u iznosu od 3.000,00 eura
-  ormarići za struju („pametni“) u luci Malinska i Omišalj u iznosu od 17.500,00 eura
-  rampa u luci Valbiska u iznosu od 3.342,00 eura.

PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM PROMETU

U 2023. godini nabavljen je motor Yamaha za plovilo u luci Baška u iznosu od 3.298,16 eura što je 99,95% planiranog iznosa od 3.300,00 eura.

SKLADIŠTA, SILOSI, GARAŽE I SL.

U 2023. godini nije izvršena nabava planiranih brodskih kontejnera u Valbiski i Omišlju u iznosu od 8.000,00 eura već će biti u 2024. godini.

SUSTAV VIDEONADZORA

U luci Malinska postavljene su kamere za sustav videonadzora te su ostvareni rashodi u iznosu od 12.471,25 eura što je 99,77% planiranog iznosa od 12.500,00 eura.

ODRŽAVANJE POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE U LUKAMA NA PODRUČJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK

Na području luka Županijske lučke uprave Krk ostvareni su rashodi za održavanje ostale postojeće infrastrukture koje nisu navedene pojedinačno po lukama u iznosu od 5.188,53 eura što je 19,55% planiranog iznosa 26.545,00 eura. Za čišćenje lučkog područja u lukama te sanitarnog čvora u Valbiski ostvareni su rashodi u iznosu 70.673,40 eura što je 89,20% planiranog iznosa od 79.229,00 eura.

VODNI DOPRINOS

U 2023. godini ostvareni su rashodi za vodni doprinos po građevinskim dozvolama za plutajući gat u luci Omišalj i za sekundarni lukobran u luci Krk u iznosu od 345,90 eura te komunalni doprinos po građevinskoj dozvoli za rekonstrukciju istezališta u luci Krk u iznosu od 241,77 eura. Ukupno rashodi iznose 587,67 eura što je 22,13% planiranog iznosa od 2.655,00 eura.

6. IZVJEŠĆE O PREDSTAVKAMA

U 2023. godini zaprimljeno je ukupno 5 predstavki od kojih ih je svih 5 riješeno.

Redni broj	Zaprimljena predstavka od	Predstavka u rješavanju (Da/Ne)	Riješena predstavka (Da/Ne)	Predmet Inspekcijskog Nadzora (Da/Ne)	Način na koji je riješena
1.	Ante Gršković	Ne	Da	Ne	Dopis od 21.02.2023.
2.	Renato Poropat	Ne	Da	Ne	Dopis od 22.05.2023.
3.	Renato Poropat	Ne	Da	Ne	Dopis od 06.06.2023.
4.	Adrijana Žic	Ne	Da	Ne	Dopis od 20.03.2023.
5.	Nenad Zeman	Ne	Da	Ne	Dopis od 06.11.2023.

7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA NABAVE

U 2023. godini ravnatelj je donio Plan nabave i XV. izmjena i dopuna Plana nabave Županijske lučke uprave za 2023. godinu.

Plan nabave nije u cijelosti izvršen pod slijedećim evidencijskim brojevima:

- EV-M-52/23 – Nabava radova na sanaciji oštećenja rive na području komunalnih vezova u luci Vela Jana – nije se proveo postupak zbog planiranja uređenja luke u 2024. godini
- EV-M-92/23 - Nabava usluge izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju luke Krk - uporabna cjelina 3- gatovi – nije se proveo postupak iz razloga što nije izvršena usluga izrade idejnog i glavnog projekta te ishoda građevinske dozvole do kraja 2023. godine.

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Status nabave
1.	EV-M-01/23	Nabava usluge čišćenja lučkog područja u luci Njivice	Izvršeno
2.	EV-M-02/23	Nabava usluge čišćenja lučkog područja u luci Omišalj	Izvršeno
3.	EV-M-03/23	Nabava usluge čišćenja lučkog područja u luci Malinska, Vantačići, Porat i Rova	Izvršeno
4.	EV-M-04/23	Nabava usluge čišćenja lučkog područja u luci Krk, Glavotok, Vela Jana i Sveta Fuska	Izvršeno


5.	EV-M-05/23	Nabava usluge čišćenja lučkog područja u luci Punat	Izvršeno
6.	EV-M-06/23	Nabava usluge čišćenja lučkog područja u luci Baška	Izvršeno
7.	EV-M-07/23	Nabava usluge čišćenja lučkog područja u luci Šilo, Klimno, Lokvišća, Soline i Čižići	Izvršeno
8.	EV-M-08/23	Nabava usluge održavanja hortikulture u lukama Čižići i Klimno	Izvršeno
9.	EV-M-09/23	Nabava usluga promidžbe i informiranja	Izvršeno
10.	EV-M-10/23	Nabava odvjetničkih usluga i usluga pravne pomoći vezano za sve aspekte Opće uredbe o zaštiti podataka	Izvršeno
11.	EV-M-11/23	Nabava usluge pravne pomoći vezano za sve aspekte Opće uredbe o zaštiti podataka i savjetovanje iz područja radnog prava	Brisano
12.	EV-M-12/23	Nabava pružanja usluga računovodstvenog servisa	Izvršeno
13.	EV-M-13/23	Nabava nadogradnje i održavanja prostornih i neprostornih baza podataka putem postojećeg sustava za upravljanje prostorom - ATLAS 14	Izvršeno
14.	EV-M-14/23	Nabava usluge revizije	Izvršeno
15.	EV-M-15/23	Nabava osobnog automobila putem financijskog leasinga	Izvršeno
16.	EV-M-16/23	Nabava osobnog automobila putem financijskog leasinga	Izvršeno
17.	EV-M-17/23	Nabava usluge izrade glavnog projekta sanacije istezališta u luci Sveta Fuska	Brisano
18.	EV-M-18/23	Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju luke Sveta Fuska	Brisano
19.	EV-M-19/23	Nabava usluge hidrografske izmjere za III. i IV. fazu rekonstrukcije luke Baška prije početka radova	Brisano
20.	EV-M-20/23	Nabava usluge hidrografske izmjere za III. fazu rekonstrukcije luke Baška nakon završetka radova	Brisano
21.	EV-M-21/23	Nabava usluge izrade projekta sidrenog sustava rekonstrukcije luke Baška - III. faza	Izvršeno
22.	EV-M-22/23	Nabava usluge izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju luke Baška-IV. faza	Izvršeno
23.	EV-M-23/23	Nabava usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji luke Baška - III. faza	Izvršeno
24.	EV-M-24/23	Nabava usluge koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova na rekonstrukciji luke Baška - III. faza	Izvršeno
25.	EV-M-25/23	Nabava usluge projektantskog nadzora nad radovima na rekonstrukciji luke Baška - III. faza	Izvršeno
26.	EV-M-26/23	Nabava radova na rekonstrukciji luke Baška - IV. Faza	Izvršeno
27.	EV-M-27/23	Nabava usluge geomehaničkih istražnih radova za rekonstrukciju i dogradnju dva gata na području Vele vode u luci Punat	Izvršeno
28.	EV-M-28/23	Nabava usluge ažuriranja i dopune maritimne studije za rekonstrukciju i dogradnju dva gata na području Vele vode u luci Punat	Brisano
29.	EV-M-29/23	Nabava usluge izrade glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju dva gata na području Vele vode u luci Punat	Izvršeno

30.	EV-M-30/23	Nabava usluge izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju dva gata na području Vele vode u luci Punat	Brisano
31.	EV-M-31/23	Nabava usluge izrade glavnog projekta za nabavu i montažu plutajućeg pontona u luci Omišalj (Pesja)	Izvršeno
32.	EV-M-32/23	Nabava usluge koordinatora zaštite na radu za postavljanje pontona u luci Omišalj (Pesja)	Izvršeno
33.	EV-M-33/23	Nabava usluge izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz	Izvršeno
34.	EV-M-34/23	Nabava usluga izrade izvedbenog projekta rekonstrukcije luke Vela Jana	Brisano
35.	EV-M-35/23	Nabava usluge prijave na natječaj za financiranje projekta, Ministarstva poljoprivrede – Uprava za ribarstvo – Ribarska luka Krk	Brisano
36.	EV-M-36/23	Nabava usluge izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 5 – Obala Marina	Brisano
37.	EV-M-37/23	Nabave usluge izrade glavnog projekta za rekonstrukciju luke Krk – uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran	Izvršeno
38.	EV-M-38/23	Nabava usluge izrade izvedbenog projekta rekonstrukcije luke Krk - Uporabna cjelina 2 - sekundarni lukobran	Izvršeno
39.	EV-M-39/23	Nabava usluge prijave na natječaj za financiranje projekta, zaštita lučkog akvatorija	Izvršeno
40.	EV-M-40/23	Nabava usluge ažuriranja i dopune maritimne studije za rekonstrukciju luke Krk - Uporabna cjelina 3 - gatovi	Izvršeno
41.	EV-M-41/23	Nabava usluge izrade idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju luke Krk - Uporabna cjelina 3 - gatovi	Izvršeno
42.	EV-M-42/23	Nabava usluge izrade glavnog projekta uređenja obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice u luci Omišalj	Izvršeno
43.	EV-M-43/23	Nabava električnih ormarića za struju i vodu	Izvršeno
44.	EV-M-44/23	Nabava izvođenja podvodnih radova u svim lukama na području Županijske lučke uprave Krk	Izvršeno
45.	EV-M-45/23	Nabava radova na iscrtavanju horizontalne signalizacije u luci Valbiska	Izvršeno
46.	EV-M-46/23	Nabava radova na izradi sidrenog sustava za deset novih vezova ispred hotela Jadran u luci Njivice	Izvršeno
47.	EV-M-47/23	Nabava radova na sanaciji obalnog zida u luci Omišalj	Izvršeno
48.	EV-M-48/23	Nabava radova na provjeri i zamjeni lanaca i gambeta na plastičnom pontonu u luci Malinska	Izvršeno
49.	EV-M-49/23	Nabava radova na sanaciji betonskog pontona u luci Malinska	Brisano
50.	EV-M-50/23	Nabava radova na sanaciji obalnog zidića u luci Vantačići	Izvršeno
51.	EV-M-51/23	Nabava radova na sanaciji istezališta u luci Sveta Fуска	Brisano
52.	EV-M-52/23	Nabava radova na sanaciji oštećenja rive na području komunalnih vezova u luci Vela Jana	Nije izvršeno
53.	EV-M-53/23	Nabava radova na sanaciji školjere i fugiranje valobranog zida u luci Šilo	Izvršeno

54.	EV-M-54/23	Nabava radova na sanaciji kamenog opločenja na rubu rive u luci Lokvišća	Izvršeno
55.	EV-M-55/23	Nabava radova na izradi natkrivenog prostora za hitnu pomoć u luci Valbiska	Izvršeno
56.	EV-M-56/23	Nabava radova na sanaciji sanitarnog čvora u luci Valbiska	Izvršeno
57.	EV-M-57/23	Nabava radova na izmještanju naplatnih kućica u luci Valbiska	Brisano
58.	EV-M-58/23	Nabava radova na produbljivanju luke Klimno	Brisano
59.	EV-M-59/23	Nabava radova na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk	Izvršeno
60.	EV-M-60/23	Nabava usluge izrade geotehničkih istražnih radova za rekonstrukciju luke Krk – uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran	Izvršeno
61.	EV-M-61/23	Nabava usluge izrade geodezije za rekonstrukciju luke Krk - uporabna cjelina 2 - sekundarni lukobran	Izvršeno
62.	EV-M-62/23	Nabava radova na sanaciji sanitarnog čvora u luci Valbiska	Izvršeno
63.	EV-M-63/23	Nabava i montaža dizalice u luci Sveta Fuska	Izvršeno
64.	EV-M-64/23	Nabava radova na ispitivanju vodonepropusnosti kanalizacijskog kolektora u luci Baška	Izvršeno
65.	EV-M-65/23	Nabava osobnog automobila putem financijskog leasinga	Izvršeno
66.	EV-M-66/23	Nabava radova na sanaciji školjere i fugiranje valobranog zida u luci Šilo	Izvršeno
67.	EV-M-67/23	Nabava radova na rekonstrukciji luke Baška - IV. Faza	Izvršeno
68.	EV-M-68/23	Nabava radova na uređenju platoa za montažu kućice u luci Valbiska	Izvršeno
69.	EV-M-69/23	Nabava usluge čišćenja sanitarnog čvora u luci Valbiska	Izvršeno
70.	EV-M-70/23	Nabava i montaža naplatne kućice u luci Valbiska	Izvršeno
71.	EV-M-71/23	Nabava usluge premije osiguranja	Izvršeno
72.	EV-M-72/23	Nabava radova na temelju za postavljanje dizalice u luci Sveta Fuska	Izvršeno
73.	EV-M-73/23	Nabava usluge izrade glavnog projekta za temelje na montaži dizalice u luci Sveta Fuska	Izvršeno
74.	EV-M-74/23	Nabava radova na izradi pasarele u luci Malinska	Izvršeno
75.	EV-M-75/23	Nabava usluge vađenja i deponiranja postojećeg sidrenog sustava dotrajalog plutajućeg pontona u luci Omišalj	Izvršeno
76.	EV-M-76/23	Nabava radne odjeće	Izvršeno
77.	EV-M-77/23	Nabava usluge kontrole analize cijena - Dogradnja luke Baška - I. i II. faza	Izvršeno
78.	EV-M-78/23	Nabava radova na sanaciji platoa dizalice u luci Malinska	Izvršeno
79.	EV-M-79/23	Nabava usluge premije osiguranja	Izvršeno
80.	EV-M-80/23	Nabava usluge izrade geotehničkih istražnih radova na uređenju obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice u luci Omišalj	Izvršeno
81.	EV-M-81/23	Nabava i ugradnja plutajućeg pontona u luci Malinska	Izvršeno

82.	EV-M-82/23	Nabava usluge izrade geodetskih radova za potrebe izrade glavnog projekta rekonstrukcije luke Vela Jana	Izvršeno
83.	EV-M-83/23	Nabava usluge najma video nadzora u lukama pod nadležnošću Županijske lučke uprave Krk	Izvršeno
84.	EV-M-84/23	Nabava radne robe i obuča	Izvršeno
85.	EV-M-85/23	Nabava usluge izrade geodezije za rekonstrukciju luke Krk - uporabna cjelina 3- gatovi	Izvršeno
86.	EV-M-86/23	Nabava usluge izrade geotehničkih istražnih radova za rekonstrukciju luke Krk - uporabna cjelina 3 - gatovi	Izvršeno
87.	EV-M-87/23	Nabava kontejnera za skladištenje opreme	Izvršeno
88.	EV-M-88/23	Nabava radova na izradi i ugradnji sidrenog sustava plovila na rekonstrukciji luke Baška – 3. faza	Izvršeno
89.	EV-M-89/23	Nabava i postavljanje kamera u luci	Izvršeno
90.	EV-M-90/23	Nabava pružanja usluga računovodstvenog servisa	Izvršeno
91.	EV-M-91/23	Nabava i postavljanje energetskog (pametnog) ormarića za struju i vodu u luci Omišalj	Izvršeno
92.	EV-M-92/23	Nabava usluge izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju luke Krk - uporabna cjelina 3- gatovi	Nije izvršeno
93.	EV-M-93/23	Nabava usluge izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za dobavu i montažu plutajućeg pontona za ribare u luci Malinska	Izvršeno
94.	EV-M-94/23	Nabava usluge izrade projekta sidrenja za plutajući ponton za ribare u luci Malinska	Izvršeno
95.	EV-M-95/23	Nabava usluge ažuriranja maritimne studije za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice u luci Omišalj	Izvršeno
96.	EV-M-96/23	Nabava usluge izrade izmjene idejnog projekta rekonstrukcije luke Porat	Izvršeno
97.	EV-M-97/23	Nabava usluge ažuriranja maritimne studije za rekonstrukciju luke Porat	Izvršeno

Prikaz provedbe Plana nabave

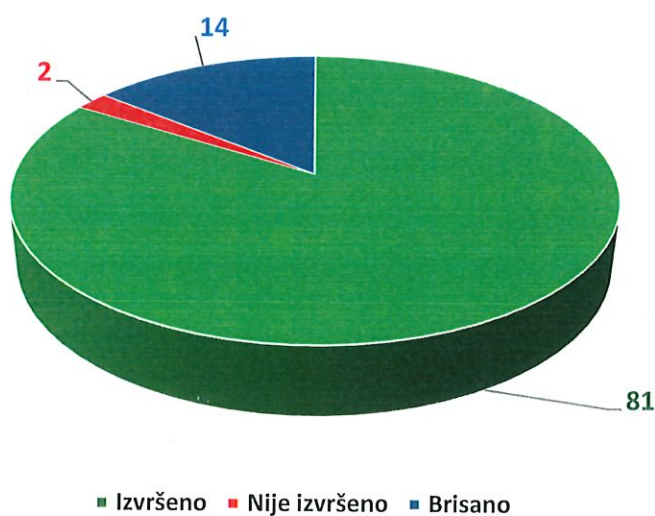

8. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA DAVANJA KONCESIJA

Županijska lučka uprava je u 2023. godini imala sklopljeno 53 ugovora o koncesiji od kojih je:

- 12 višegodišnjih ugovora koji su sklopljeni proteklih godina
- 40 ugovora sklopljenih u 2023. godini u trajanju do kraja 2023. godine
- 1 ugovor sklopljen u 2022. godinu u trajanju od jedne godine odnosno do 30. lipnja 2023. godine.

Redni broj	Naziv koncesije	Koncesionar	Područje koncesije	Iznos stalnog dijela u eurima	Iznos varijabilnog dijela u eurima	Trajanje koncesije
1.	Ugovor o koncesiji za obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica, koja zahtjeva izgradnju objekata lučke infrastrukture, na dijelu lučkog područja luke Krk	VECLA d.o.o.	Luka Krk	8.096,09	3.765,59	27.05.2014. - 26.05.2024.
2.	Ugovor o koncesiji za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti u funkciji lučkih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Baška	T.D. BAŠKA d.o.o.	Luka Baška	5.189,46	1.074,80	09.06.2014. - 08.06.2024.
3.	Ugovor o koncesiji za pružanje usluga ostalih gospodarskih djelatnosti, s pravom na gradnju, na dijelu lučkog područja luke otvorene za javne promet lokalnog značaja Njivice	OTO NAUTIKA d.o.o.	Luka Njivice	1.263,52	1.617,47	29.05.2017. - 28.05.2029.
4.	Ugovor o koncesiji za izgradnju i gospodarsko korištenje dijela lučkog područja luke otvorene za javne promet lokalnog značaja, luke Dunat, Grad Krk	VECLA d.o.o.	Luka Dunat	7.299,75	8.798,91	02.06.2017. - 01.06.2037.
5.	Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje luke Omišalj radi obavljanja ugostiteljskih djelatnosti	FISH HOUSE OMIŠALJ d.o.o.	Luka Omišalj	11.307,98	2.013,91	11.06.2018. - 10.06.2028.
6.	Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje luke Krk radi obavljanja ugostiteljskih djelatnosti	Krčke vile d.o.o.	Luka Krk	5.255,82	2.625,54	13.06.2018. - 12.06.2028.
7.	Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra	K.D. Dubašnica d.o.o.	Luka Malinska	23.624,66	5.012,35	24.06.2019. - 23.06.2029.

	koje predstavlja dio lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Malinska, Općine Malinska - Dubašnica					
8.	Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra radi obavljanja gospodarskih djelatnosti opskrbe plovniha objekata gorivom na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Krk, Grad Krk	FLASH ENERGY d.o.o	Luka Krk	8.494,26	37.698,44	04.08.2020. - 03.08.2025.
9.	Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela podmorskog dobra radi obavljanja gospodarske djelatnosti opskrbe brodova, jahti i brodicama gorivom na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet, luke Krk, Grad Krk	INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d.	Luka Krk	7.963,46	27.559,09	13.05.2021. - 12.05.2026.
10.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Valbiska	JAVNA USTANOVA PRIRODA	Luka Valbiska	132,72	-	01.07.2022. - 30.06.2023.
11.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Valbiska	ADRIA YACHTING d.o.o.	Luka Valbiska	796,34	190,00	01.05.2022. - 01.05.2024.
12.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Valbiska	INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d.	Luka Valbiska	1.327,23	38.383,09	16.08.2022. - 16.08.2024.
13.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje	Dezinsekcija d.o.o.	Luka Krk	663,61	65,96	02.01.2023. - 31.12.2027.

	i nadgradnje na lučkom području luka otoka Krka pod nadležnošću Županijske lučke uprave Krk					
14.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Njivice	ADRIATIC EXCURSIONS d.o.o	Luka Njivice	66,36	-	01.06.2023. - 31.12.2023.
15.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Baška	EXPLORER j.d.o.o	Luka Baška	66,36	-	24.05.2023. - 31.12.2023.
16.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Baška	Franc, obrt za ugostiteljstvo, vl. Franjo Dujmović	Luka Baška	2.866,68	129,60	25.05.2023. - 31.12.2023.
17.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Baška	Maretta, obrt za ugostiteljstvo, vl. Zoran Gerovski	Luka Baška	2.070,38	200,00	01.06.2023. - 31.12.2023.
18.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	MARLIN TOURS d.o.o.	Luka Krk	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.
19.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	MATEO, obrt za usluge, vl. Dragan Aladžić	Luka Krk	66,36	48,10	26.05.2023. - 31.12.2023.

20.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	MCP KRK d.o.o.	Luka Krk	66,36	-	01.06.2023. - 31.12.2023.
21.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Malinska	Mihaela, obrt za trgovinu, vl. Mihaela Zec Malnar	Luka Malinska	796,34	220,41	26.05.2023. - 31.12.2023.
22.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Baška	More, obrt za usluge, vl. Mario Šešević	Luka Baška	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.
23.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Glavotok	Mrgari, obrt za ugostiteljstvo, vl. Bruno Bavrka	Luka Glavotok	796,34	118,78	24.05.2023. - 31.12.2023.
24.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Njivice	Obrt za usluge i trgovinu "Dema", vl. Anica Marjanić	Luka Njivice	796,34	58,78	25.05.2023. - 31.12.2023.
25.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	Phoenix, obrt za usluge, ugostiteljstvo i trgovinu, vl. Tomislav Kirinčić	Luka Krk	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.
26.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i	Robi, obrt za usluge, vl. Robert Skomeršić	Luka Krk	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.

	drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk					
27.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Baška	TiV, obrt za usluge, vl. Tatjana Mohar	Luka Baška	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.
28.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	Prijevoz putnika Mario Krk, vl. Mario Volarić	Luka Krk	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.
29.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	Prijevoz putnika Mario Krk, vl. Mario Volarić	Luka Krk	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.
30.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	Prijevoz putnika morem Portopizzana, vl. Alen Depikolzvane	Luka Krk	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.
31.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	Obrt za nautički i izletnički turizam "Tajana"	Luka Krk	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.
32.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	Obrt za nautički i izletnički turizam "Tajana"	Luka Krk	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.

33.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Njivice	Obrt za nautički i izletnički turizam "Tajana"	Luka Njivice	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.
34.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Punat	One4all, obrt za usluge, vl. Kristijan Mihajić	Luka Punat	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.
35.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Baška	Ugostiteljsko turistički obrt Angelina, vl. Rino Radulić	Luka Baška	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.
36.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Baška	Ugostiteljsko turistički obrt Angelina, vl. Rino Radulić	Luka Baška	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.
37.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Porat	EOL, vl. Renata Staničić i Andreja Maček	Luka Porat	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.
38.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	Rib.-ug.obrt MIKI, vl. Nikica Depikolzvane	Luka Krk	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.
39.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili	F.L.L. obrt za dj., vl. Ines Legac	Luka Krk	66,36	-	25.05.2023. - 31.12.2023.

	izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk					
40.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	Obrt za ribarstvo i turizam Denis, vl. Denis Stolfa	Luka Krk	66,36	-	26.05.2023. - 31.12.2023.
41.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	Obrt za ribarstvo i turizam Denis, vl. Denis Stolfa	Luka Krk	66,36	-	26.05.2023. - 31.12.2023.
42.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	Obrt za ribarstvo i turizam Denis, vl. Denis Stolfa	Luka Krk	66,36	-	26.05.2023. - 31.12.2023.
43.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	DIVER KRK, obrt vl. Vlado Kirinčić	Luka Krk	66,36	-	24.05.2023. - 31.12.2023.
44.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	Obrt za usluge VOJGA, vl. Ivan Morožin	Luka Krk	66,36	-	26.05.2023. - 31.12.2023.
45.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	Obrt za ribarstvo, trgovinu i usluge Sveta Fuska, vl. Anton Mrakovčić	Luka Krk	66,36	-	27.06.2023. - 31.12.2023.

46.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Krk	Zajednički turističko uslužni obrt ADRIATIC, vl. Zlatko Žužić i Goran Jurešić	Luka Krk	66,36	-	27.06.2023. - 31.12.2023.
47.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Sveta Fуска	Obrt za usluge IM Nautika, vl. Ivan Mršić	Luka Krk	66,36	-	28.06.2023. - 31.12.2023.
48.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Malinska	Prijevoz putnika čamcem vl. Ivan Drinjak	Luka Malinska	66,36	-	27.06.2023. - 31.12.2023.
49.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Njivice	Prijevoz putnika čamcem vl. Ivan Drinjak	Luka Njivice	66,36	-	27.06.2023. - 31.12.2023.
50.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Porat	PICCOLA VENEZIA j.d.o.o.	Luka Porat	3.185,20	369,04	27.06.2023. - 31.12.2023.
51.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Njivice	Obrt za turizam, ugostiteljstvo, izradu i trgovinu Aquavision Aquarius, vl. Tibor Koči	Luka Njivice	66,36	-	28.06.2023. - 31.12.2023.
52.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i	Obrt za turizam, ugostiteljstvo, izradu i trgovinu Aquavision	Luka Malinska	66,36	-	28.06.2023. - 31.12.2023.

	drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Malinska	Aquarius, vl. Tibor Koči				
53.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Baška	Ankora, obrt, vl. Snježana Rode	Luka Baška	2.388,90	7,68	26.06.2023. - 31.12.2023.

9. ZAKLJUČAK

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. alineje 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 15. stavka 1. alineje 1. Statuta Županijske lučke uprave Krk i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Krk, usvojilo je na:

- 20. sjednici Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk održanoj dana 12. prosinca 2022. godine Godišnji program rada i plan razvoja Županijske lučke uprave Krk za 2023. godinu
- 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 09. svibnja 2023. godine I. izmjene Godišnjeg programa rada i plan razvoja luka Županijske lučke uprave Krk.

Na temelju članka 117. stavka 2. točke 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/2023), članka 7. stavka 1. točke 3. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk („Službene novine“ broj 38/23), članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Krk, usvojilo je na:

- 43. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 19. prosinca 2023. godine II. Izmjene Godišnjeg plana rada luke Županijske lučke uprave Krk za 2023. godinu.

Sukladno člancima 10.-19. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk donijelo je na:

- 20. sjednici Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk održanoj dana 12. prosinca 2022. godine Financijski plan
- 30. sjednici Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk održanoj dana 09. svibnja 2023. godine I. izmjene Financijskog plana
- 43. sjednici dana 19. prosinca 2023. godine II. izmjene Financijskog plana.

- ✚ Županijska lučka uprava Krk je neprofitna ustanova i svoje poslovne knjige kao i financijska izvješća obvezna je voditi i iskazivati u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine obuhvaćaju:

- Bilancu na Obrascu: BIL-NPF na dan 31.12.2023. godine
- Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF i
- Bilješke uz financijske izvještaje

U financijskim pokazateljima Bilance (BIL-NPF) prikazana je imovina na dan 01. siječnja u iznosu od 15.800.933,94 eura te na dan 31. prosinca 2023. godine u iznosu od 18.850.513,65 eura. Iz navedenog je vidljivo povećanje imovine u navedenom razdoblju u iznosu od 3.049.579,71 eura.

U financijski pokazateljima Izvještaja o prihodima i rashodima (PR-RAS-NPF) prikazani su:

- prihodi u iznosu od 3.185.635,40 eura za 2023. godine dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 3.024.654,60 eura. Uspoređujući prihode 2023. i 2022. godine isti su povećani za 160.980,80 eura.
- ukupni rashodi u iznosu od 2.159.400,52 eura za 2023. godine dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 1.758.603,87 eura. Uspoređujući rashode 2023. i 2022. godine isti su povećani za 400.796,65 eura.
- višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.026.234,88 eura dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 1.266.050,73 eura.

- ✚ Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za 2023. godinu sastoji se od slijedećih prihoda i rashoda:

- sveukupni prihodi poslovanja, ostale kratkoročne obveze, odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja u iznosu od 5.691.547,97 eura
- sveukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.563.132,58 eura
- višak prihoda u iznosu 1.128.415,39 eura koji će se prenijeti izmjenom plana za 2024. godinu.

KLASA: 023-01/21-01/14

URBROJ: 2107-1-5-02-24-310

U Krku, 28. ožujka 2024. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Upravno vijeće

Predsjednica Upravnog vijeća
Nada Milošević, dipl.iur.



Prilog:

1. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za 2023. godinu
2. Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine koji obuhvaćaju Bilancu na Obrascu: BIL-NPF na dan 31.12.2023. godine, Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke uz financijske izvještaje
3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2023. godinu

