



**Županijska lučka uprava Krk
Upravno vijeće**

**IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE
S FINACIJSKIM IZVJEŠTAJEM
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK
ZA 2024. GODINU**

Predsjednica Upravnog vijeća:



Nada Milošević

Ravnatelj:



Alfred Franković



Pripremio:



Alfred Franković



ožujak, 2025. godine

Na temelju članka 117. stavka 2. točke 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/2023), članka 12. stavka 1. točke 3. Statuta Županijske lučke uprave Krk, članka 8. stavka 1. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Krk, na 20. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2025. godine donijelo je:

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2024. GODINU

Godišnji plan rada luke Županijske lučke uprave Krk za 2024. godinu usvojen je na 43. sjednici Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk održanoj dana 19. prosinca 2023. godine, na 2. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2024. godine usvojene su I. izmjene Godišnjeg plana rada luke Županijske lučke uprave Krk za 2024. godinu, na 14. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2024. godine usvojene su II. izmjene Godišnjeg plana rada luke Županijske lučke uprave Krk za 2024. godinu.

1. USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Temeljem Zakona o morskim lukama i čl. 7 Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 08. travnja 1999. godine osnovalo Županijsku lučku upravu Krk kao jednu od osam lučkih uprava, radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luke županijskog značaja Valbiska i luka lokalnog značaja: Baška, Klimno, Šilo, Krk, Glavotok, Malinska, Njivice, Omišalj, Voz, Punat, Stara Baška i Vrbnik. Nakon izmjena i dopuna odluke o osnivanju Županijska lučka uprava Krk upravlja s 23 (dvadeset i tri) luke otvorene za javni promet odnosno 9 (devet) luka otvorenih za javni promet županijskog značaja i 14 (četrnaest) luka otvorenih za javni promet lokalnog značaja.

Sjedište Županijske lučke uprave Krk je u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 5.

Tijela lučke uprave čine Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće ima 5 (pet) članova, u sljedećem sastavu:

-  Nada Milošević, predsjednica, predstavnik osnivača;
-  Vlado Šušak, predstavnik osnivača;
-  Miroslav Topić, predstavnik osnivača;
-  Franjo Volarić, predstavnik lokalne samouprave;
-  Vladimir Malnar, predstavnik nadležne lučke kapetanije.

Ravnatelj Županijske lučke uprave Krk je Alfred Franković na mandat od 07. rujna 2022. godine do 06. rujna 2026. godine.

Godišnji izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana rada luke Županijske lučke uprave Krk za 2024. godinu obuhvaća ostvarenje programa koji su provedeni putem pripadajućih aktivnosti i projekata, a temeljene su na sljedećim:

- ✚ ovlastima i nadležnostima propisanim zakonskim i podzakonskim aktima
- ✚ zaključcima Županijske skupštine i Župana Primorsko-goranske županije
- ✚ Prostornom planu Primorsko-goranske županije te Prostornom planu Grada Krka, Općine Omišalj, Općine Malinska-Dubašnica, Općine Punat, Općine Baška, Općine Vrbnik i Općine Dobrinj.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Krk, ustrojavaju se službe kao unutarnje ustrojstvene jedinice.

U Županijskoj lučkoj upravi Krk ustrojene su sljedeće službe:

1. Služba lučkog redarstva
2. Služba financijskih i općih poslova
3. Služba razvoja i održavanja.

2. DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK

Županijska lučka uprava Krk je neprofitna pravna osoba upisana u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci. Temeljem članka 116. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23 – dalje u tekstu: ZPDML) djelatnost županijske lučke uprave je upravljanje i korištenje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, obavlja se kao javna djelatnosti.

Djelatnost županijske lučke uprave je:

1. građenje, održavanje, upravljanje, zaštita i unaprjeđenje lučkog područja
2. građenje i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje
3. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu
4. provođenje reda u luci, koje osim ostaloga uključuje ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila
5. osiguranje pružanja osnovnih lučkih djelatnosti, i to:
 - a) privez i odvez plovni i plutajućih objekata
 - b) ukrcaj i iskrcaj tereta
 - c) opskrba plovni objekata vodom i energijom
 - d) usluga dizanja i spuštanja plovni objekata more
 - e) lučko tegljenje i potiskivanje
6. osiguravanje prihvata i predaje svih vrsta otpada s pomorskih objekata osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuju gospodarenje otpadom
7. osiguravanje opskrbe plovni objekata gorivom

8. usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području
9. davanje koncesija i posebne upotrebe
10. obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim Zakonom.

Županijska lučka uprava dužna je osigurati uslugu priveza i odveza plovnih i plutajućih objekata u svim lukama u kojima postoji operativni dio luke i nautički dio luke.

Financiranje županijske lučke uprave propisano je člankom 123. ZPDML te su prihodi županijske lučke uprave:

1. lučke tarife
2. prihod od koncesije na lučkom području
3. prihod od posebne upotrebe na lučkom području
4. sredstva iz proračuna osnivača
5. sredstva iz državnog proračuna
6. bespovratne potpore iz strukturnih fondova Europske unije
7. ostali prihodi u skladu s ovim Zakonom i općim aktima županijske lučke uprave.

Sredstvima pod točkom 5. županijska lučka uprava može financirati samo izgradnju i održavanje lučke podgradnje.

Sredstva iz točaka 1. do 4., 6. i 7. pripadaju u cijelosti županijskoj lučkoj upravi na čijem području se ubiru i namijenjena su za:

1. izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje
2. opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova
3. održavanje dubine u luci i na sidrištu luke
4. troškove poslovanja županijske lučke uprave.

Županijska lučka uprava Krk je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama. Na financijsko poslovanje primjenjuju se Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14, 114/22), Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 1/15, 25/17, 96/18, 103/18, 134/22) i Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 31/15, 67/18, 115/18, 21/21).

3. LUČKO PODRUČJE

Županijska lučka uprava Krk upravlja s lukama otvorenim za javni promet:

 *županijskog značaja:*

1. Baška
2. Krk
3. Malinska
4. Omišalj
5. Punat
6. Surbova-Baška
7. Šilo
8. Valbiska
9. Vrbnik

 *lokalnog značaja:*

1. Čižići
2. Dunat
3. Glavotok
4. Klimno
5. Lokvišća
6. Njivice
7. Porat
8. Rova
9. Soline
10. Stara Baška
11. Sveta Fuska
12. Vantačići
13. Vela Jana
14. Voz.


Ukupna površina lučkog područja iznosi 1.081.975 m² koje zauzima 951.996 m² površine morskog akvatorija i 129.930 m² kopnenog dijela. Županijska lučka uprava Krk raspolaže dizalicama u luci Omišalj, Malinska, Baška i Sveta Fuska.

Županijska lučka uprava Krk na području luka raspolaže s 3.683 veza za brodice, od čega je 2.668 stalna veza u komunalnom dijelu luke te 1.015 u nautičkom dijelu luke.

Na području luke Dunat je zaključen ugovor o koncesiji u kojima se nalazi 166 nautičkih vezova.

Prema lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja, broj vezova iskazuje se kako slijedi:

REDNI BROJ	LUKA	KOMUNALNI VEZ	NAUTIČKI VEZ	UKUPNO
1.	Krk	380	112	492
2.	Baška	350	91	441
3.	Punat	438	53	491
4.	Njivice	113	58	171
5.	Malinska	257	92	349
6.	Šilo	52	-	52
7.	Lokvišća	77	47	124
8.	Klimno	98	66	164
9.	Stara Baška	43	25	68
10.	Vrbnik	108	20	128
11.	Glavotok	24	-	24
12.	Valbiska	50	-	50
13.	Porat	39	120	159
14.	Rova	24	-	24
15.	Vantačići	34	25	59
16.	Čižići	63	100	163
17.	Soline	29	7	36
18.	Omišalj	186	153	339
19.	Vela Jana	146	6	152
20.	Sv. Fuska	126	40	166
21.	Dunat	31	-	31
22.	Voz	-	-	-
23.	Surbova	-	-	-
UKUPNO		2.668	1.015	3.683

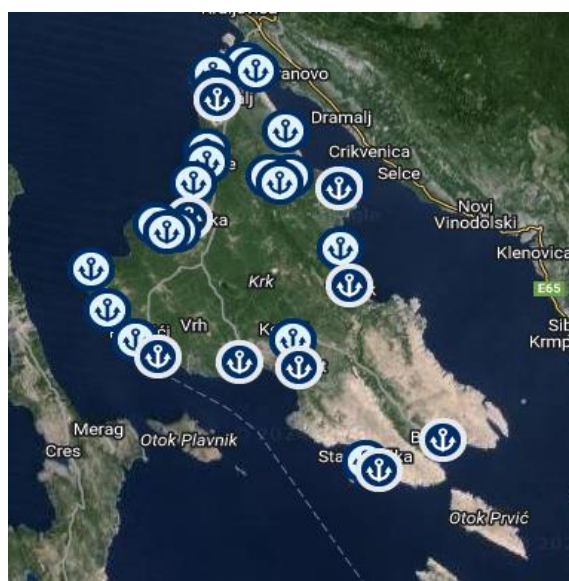



Luka Krk



Luka Baška


4. OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA

U 2024. godini, Županijska lučka uprava Krk, temeljem zakonskih ovlasti i sklopljenih ugovora, ostvarila je ukupne prihode od 5.813.685,93 eura, što predstavlja 91,24% planiranog iznosa od 6.372.047,00 eura, uključujući obveze za kredite i zajmove, odgođeno plaćanje rashoda, prihode budućih razdoblja te preneseni višak prihoda.

u EUR

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2024. godini	Ostvareno u 2024. godini	Index
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	3.321.870,00	3.375.810,83	101,62
3112	Prihodi od pružanja usluga	3.321.870,00	3.375.810,83	101,62
31121	Lučke pristojbe	2.634.028,00	2.668.195,46	101,30
31122	Lučke naknade	432.000,00	448.512,47	103,82
31123	Naknade za koncesiju	228.292,00	231.568,22	101,44
31124	Ostali prihodi poslovanja	600,00	120,00	20,00
31125	Neizravna naknada za prihvrat otpada	26.950,00	27.414,68	101,72
34	Prihodi od imovine	5.700,00	7.473,06	131,11
35	Prihodi od donacija	539.998,00	516.253,74	95,60
36	Ostali prihodi	30.050,00	43.416,48	144,48
UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA		3.897.618,00	3.942.954,11	101,16
24	Ostale kratkoročne obveze	0,00	0,00	-
26	Obveze za kredite i zajmove	24.060,00	16.119,80	67,00
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska ograničenja)	1.321.954,00	726.197,02	54,93
291	Odgođeno plaćanje rashoda	474.751,00	0,00	0,00
29220	Odgođeni prihodi – donacija iz državnog proračuna RH	436.041,00	436.040,20	100,00
29221	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna PGŽ	280.000,00	280.000,00	100,00
29222	Odgođeni prihodi – donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave	124.580,00	19.305,00	15,50
29223	Odgođeni prihodi donacije od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – EU fondovi (Baška)	6.582,00	-9.148,18	-138,99
52	Preneseni višak prihoda	1.128.415,00	1.128.415,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA, OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE, ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I PRENESENI VIŠAK PRIHODA		6.372.047,00	5.813.685,93	91,24

Prikaz plana i ostvarenja prihoda i primitaka za 2024. godinu

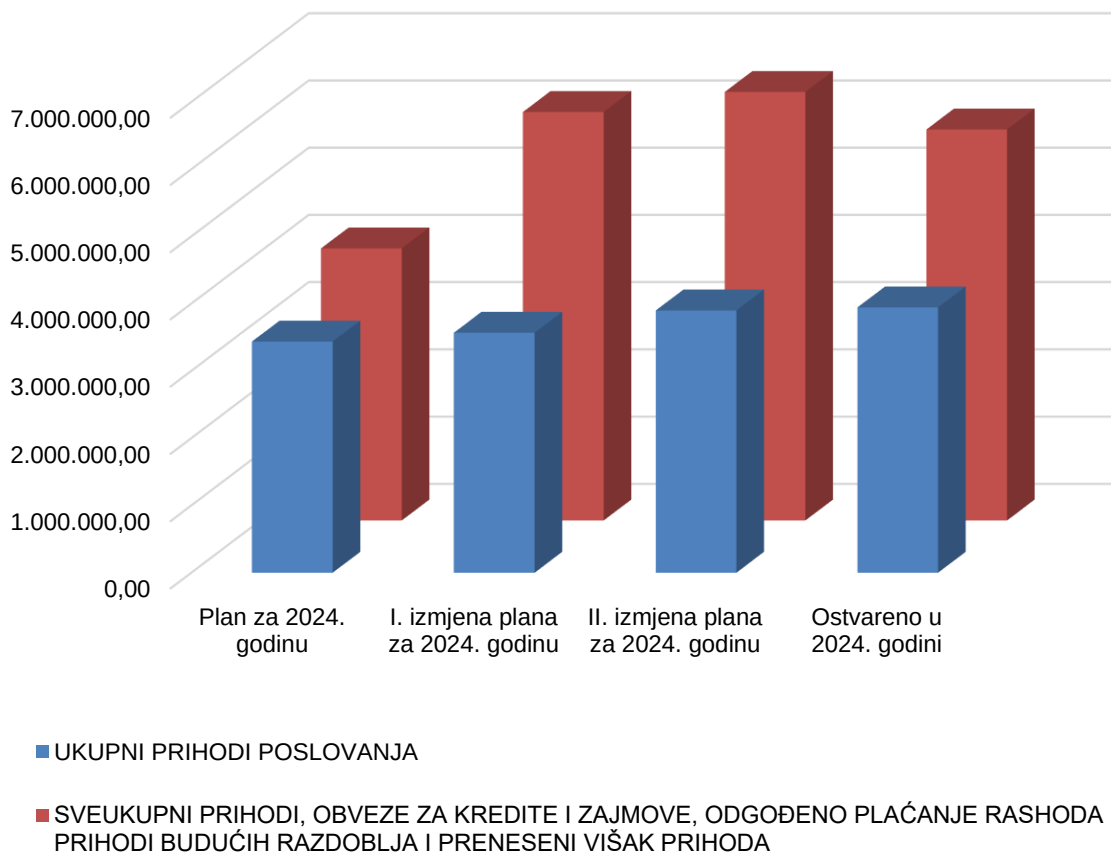

Ostvareni prihodi Županijske lučke uprave Krk u ukupnom iznosu od 5.813.685,93 eura obuhvaćaju:

- ✚ Prihode poslovanja – 3.942.954,11 eura
- ✚ Obveze za kredite i zajmove – 16.119,80 eura
- ✚ Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska ograničenja) – 726.197,02 eura
- ✚ Preneseni višak prihoda – 1.128.415,00 eura.

Analizirajući prihode poslovanja Županijske lučke uprave Krk, ostvareni prihodi iznose 3.942.954,11 eura, što predstavlja 101,16% planiranog iznosa od 3.897.618,00 eura.

Najveći prihod Županijska lučka uprava Krk ostvaruje od lučkih pristojbi (konto 31121), koji su u 2024. godini ostvareni u iznosu od 3.375.810,83 eura, što predstavlja 101,62% planiranog iznosa od 3.321.870,00 eura. Prihodi od lučkih pristojbi ostvareni su za 53.940,83 eura više od planiranih sredstava prema II. izmjeni plana za 2024. godinu.

Prihodi od lučkih naknada za isporučene usluge (konto 31122) ostvareni su u iznosu od 448.512,47 eura, što predstavlja 103,82% planiranog iznosa od 432.000,00 eura. Navedeni prihodi ostvareni su za 16.512,47 eura više od planiranih sredstava prema II. izmjeni plana za 2024. godinu.

Prihodi od naknada za koncesiju (konto 31123) ostvareni su u iznosu od 231.568,22 eura, što predstavlja 101,44% od planiranog iznosa od 228.292,00 eura. Ovi prihodi su veći od planiranih za 3.276,22 eura u odnosu na II. izmjenu plana za 2024. godinu. Prihodi od naknada za koncesiju obuhvaćaju fiksni i varijabilni dio koncesijske naknade za obavljanje lučkih djelatnosti, ostvarene u iznosu od 23.893,53 eura, te prihode od drugih gospodarskih djelatnosti ostvarene u iznosu od 162.351,69 eura. Prihodi su planirani u iznosu od 16.930,00 eura za lučke djelatnosti i 166.039,00 eura za ostale gospodarske djelatnosti, što predstavlja povećanje prihoda od navedenih koncesija za 1,44% u odnosu na II. izmjenu plana za 2024. godinu. Svi prihodi ostvareni su temeljem ugovora o koncesijama na lučkom području Županijske lučke uprave Krk. Također, obuhvaćaju prihode od dozvola na pomorskom dobru (konto 311233), koji su ostvareni u iznosu od 45.323,00 eura, što predstavlja 100% planiranog iznosa.

Ostali prihodi poslovanja (konto 31124) ostvareni su u iznosu od 120,00 eura što predstavlja 20% planiranog iznosa od 600,00 eura.

Prihodi od neizravne naknade za prihvrat otpada (konto 31125) ostvareni su u iznosu od 27.414,68 eura što predstavlja 101,72% planiranog iznosa od 26.950,00 eura. Neizravna naknada odnosi se na brodice za koje je zaključen ugovor o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke (5% od pristojbe), kao i na brodice i jahte u tranzitu (1% od pristojbe).

Prihodi od imovine (konto 34) ostvareni su iz financijske i nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 7.473,06 eura, što predstavlja 131,11% planiranog iznosa od 5.700,00 eura.

Prihodi od donacija iz proračuna (konto 351 - sučeljavanje) udjela u investiciji ostvareni su u iznosu od 501.524,71 eura, što predstavlja 95,89% planiranog iznosa od 522.998,00 eura, a odnose se na sljedeće:

- ✚ prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske (konto 3511) u iznosu 145.572,11 eura
- ✚ prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (konto 3512) u iznosu 104.569,75 eura
- ✚ prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave (konto 3513) u iznosu 167.664,33 eura:
 - Općina Omišalj (konto 35131) u iznosu 34.991,66 eura
 - Općina Vrbnik (konto 35132) u iznosu 445,20 eura
 - Općina Baška (konto 35133) u iznosu 7.830,76 eura
 - Grad Krk (konto 35134) u iznosu 23.243,44 eura
 - Općina Malinska - Dubašnica (konto 35135) u iznosu 17.436,66 eura
 - Općina Punat (konto 35136) u iznosu 83.716,61 eura
- ✚ EU – bespovratna sredstva (konto 3514) u iznosu 83.718,52 eura.

Navedeni prihodi odnose se na završene investicije u lukama Valbiska, Njivice, Vrbnik, Baška, Krk, Malinska, Punat, Klimno, Porat, Glavotok i Sveta Fuska u proteklim godinama, te sufinanciranje Općine Punat u 2024. godini u ukupnom iznosu od 64.416,19 eura. Sufinanciranje obuhvaća sanaciju hodne površine Vele Vode (32.000,00 eura) i sanaciju hodne površine Pod Gušternu (32.416,19 eura). Planirana sredstva za sufinanciranje navedenih sanacija iznose 96.000,00 eura, a preostali iznos za sufinanciranje biti će ostvarena u 2025. godini prema upućenom zahtjevu lokalnoj samoupravi.

EU bespovratna sredstva (konto 3514) u iznosu od 83.718,52 eura odnose se na sredstva ostvarena po kreditu koji je korišten za investiciju u luci Valbiska u iznosu od 1.679,96 eura, te na sredstva za investiciju Dogradnje luke Baška - I. i II. faza koja je završena u 2024. godini i stavljena u uporabu u iznosu od 82.038,56 eura. Navedeni iznosi ostvareni su udjelom u investiciji sučeljavanja u amortizaciji.

Ostali prihodi od donacija (konto 355) ostvareni su u iznosu od 14.729,03 eura, što predstavlja 86,64% planiranog iznosa od 17.000,00 eura. Ovi prihodi odnose se na prihode temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske za električnu energiju.

Prihodi od naknade štete i refundacija (konto 361) ostvareni su u iznosu od 42.416,45 eura, što predstavlja 146,01% planiranog iznosa od 29.050,00 eura. Ovi prihodi obuhvaćaju sljedeće:

- ✚ prihode od naknade šteta (konto 3611) u iznosu od 28.476,20 eura, što predstavlja 98,02% planiranog iznosa od 29.050,00 eura, ostvarene u lukama Krk, Sveta Fuska i Stara Baška
- ✚ prihodi od ostalih refundacija (konto 3613) u iznosu od 13.940,25 eura koji nisu bili planirani, a odnose se na prefakturirane račune za luku Dunat i Klimno.

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine (konto 362) ostvareni su u iznosu od 1.000,00 eura, što je u skladu s planiranim iznosima.

Ostali nespomenuti prihodi (konto 363) ostvareni su u iznosu od 0,03 eura koji nisu bili planirani, a odnose se na otpis obveza.

Obveze prema leasing kućama (konto 2621) ostvareni su u iznosu od 16.119,80 eura, što predstavlja 67,00% planiranog iznosa od 24.060,00 eura. U 2024. godini sklopljen je ugovor o financijskom leasingu s UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za nabavu vozila čija je nabavna vrijednost iznosila 24.059,40 eura. Prema uvjetima ugovora o financijskom leasingu, u 2024. godini otplaćeno je 7.939,60 eura, a obveza na dan 31.12.2024. godine iznosi 16.119,80 eura.

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja) na kontu 29 ostvareni su u iznosu od 726.197,02 eura, što predstavlja 54,93% planiranog iznosa od 1.321.954,00 eura. Ovaj iznos obuhvaća odgođeno plaćanje rashoda koji nisu fakturirani, a koji terete tekuće razdoblje (za sudske sporove u tijeku – konto 2911), kao i odgođene prihode od donacija (konto 2922).

Rashodi koji nisu fakturirani, a koji terete tekuće razdoblje zbog sudskih sporova u tijeku (konto 2911), nisu ostvareni jer sudski spor još traje. Ovi rashodi odnose se na tekući sudski spor za koji su planirana odnosno rezervirana sredstva, uključujući iznos glavnice, uvećan za troškove poreza na dodanu vrijednost i troškove postupka. S obzirom na neizvjesnost ishoda i trajanja spora, planirano je odgođeno plaćanje rashoda.

Odgođeni prihodi od donacija (konto 2922) ostvareni su u iznosu od 726.197,02 eura, što predstavlja 85,72% planiranog iznosa od 847.203,00 eura. Navedeni prihodi odnose se na sljedeće:

✚ iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – konto 29220) ostvareno je 436.040,20, što predstavlja 100,00% planiranog iznosa od 436.041,00 eura. Temeljem prijavljenog projekta na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje izgradnje, sanacije, i rekonstrukcije objekta podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture u 2024. godini odobrena su sredstva i sklopljen je:

- Ugovor i Dodatak Ugovoru o sufinanciranju radova na Dogradnja luke Baška – 3. faza u iznosu od 436.040,20 eura.

✚ iz Proračuna Primorsko-goranske županije (konto 29221) ostvareno je 280.000,00 eura, što predstavlja 100% planiranog iznosa od 280.000,00 eura, a odnosi se na sljedeće:

- sufinanciranje radova na rekonstrukciji istezališta – odvodnja i zbrinjavanje otpadne vode u luci Krk ostvareno je u iznosu od 105.000,00 eura, što predstavlja 100% planiranog iznosa od 105.000,00 eura. Ugovor o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za poticanje rada županijskih lučkih uprava u 2024. godini sklopljen je 24. svibnja 2024. godine,
- sufinanciranje radova na izradi i ugradnji sidrenog sustava plovila na Rekonstrukciji luke Baška – 3. faza ostvareno je u iznosu od 120.000,00 eura, što predstavlja 100% planiranog iznosa od 120.000,00 eura. Ugovor o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za poticanje rada županijskih lučkih uprava u 2024. godini sklopljen je 24. svibnja 2024. godine,
- sufinanciranje usluge izrade izmjene idejnog i glavnog projekta za Rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 3 – rekonstrukcija uvale Portapižana ostvareno je u iznosu od 20.000,00 eura, što predstavlja 100% planiranog iznosa od 20.000,00 eura. Ugovor o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za poticanje rada županijskih lučkih uprava u 2024. godini sklopljen je 24. svibnja 2024. godine,
- sufinanciranje usluge izrade izvedbenog projekta za Rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran ostvareno je u iznosu od 35.000,00 eura, što predstavlja 100% planiranog iznosa od 35.000,00 eura. Ugovor o

korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za poticanje rada županijskih lučkih uprava u 2024. godini sklopljen je 24. svibnja 2024. godine.

✚ iz Proračuna jedinica lokalne samouprave (konto 29222) ostvareno je 19.305,00 eura, što predstavlja 15,50% planiranog iznosa od 124.580,00 eura, a odnosi se na sljedeće:

- iz Proračuna Općine Malinska ostvareno je 9.000,00 eura, što predstavlja 100% planiranog iznosa 9.000,00 eura. Odnosi se na sljedeće:
 - sufinanciranje nabave i montaže pristupnog mostića za ponton za ribare u luci Malinska ostvareno je 9.000,00 eura što je 100% planiranog iznosa od 9.000,00 eura. Ugovor o sufinanciranju nabave i montaže pristupne pasarele za prilaz plutajućem pontonu u luci Malinska sklopljen je 29. srpnja 2024. godine.
- Iz Proračuna Općine Baška nisu ostvarena planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 eura koja se odnose na:
 - sufinanciranje radova na Rekonstrukciji luke Baška – 4. faza prema Ugovoru o sufinanciranju radova na projektu rekonstrukcije luke Baška – 4. faza sklopljen je 09. svibnja 2024. godine. U 2024. godini nisu izvršeni navedeni radovi, te će se u 2025. godini ostvariti ugovoreno sufinanciranje.
- iz Proračuna Općine Punat ostvareno je u iznosu od 10.305,00 eura, što predstavlja 66,14% planiranog iznosa od 15.580,00 eura. Odnosi se na sljedeće:
 - sufinanciranje usluge izrade idejnog projekta za nabavu i montažu plutajućeg pontona u luci Punat ostvareno u iznosu od 10.305,00 eura što predstavlja 93,68% planiranog iznosa od 11.000,00 eura. Preostali iznos biti će ostvaren u 2025. godini prema upućenom zahtjevu lokalnoj samoupravi. Ugovor o sufinanciranju usluga i radova na projektima koji se provode na području luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Punat sklopljen je 28. ožujka 2024. godine,
 - sufinanciranje usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju obalnog zida i projektiranje novih mulova od gata K do hotela Falkensteiner nije ostvareno u planiranom iznosu od 4.580,00 eura. U 2024. godini nisu izvršene navedene usluge, te će se u 2025. godini ostvariti ugovoreno sufinanciranje prema Ugovoru o sufinanciranju usluga i radova na projektima koji se provode na području luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Punat sklopljenog 28. ožujka 2024. godine.

✚ Odgođeni prihodi – EU projekt Baška (konto 29223) ostvaren je povrat bespovratnih sredstava za projekt „Dogradnja luke Baška“ u iznosu od 9.148,18 eura. Prema Odluci o povratu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture završni ZNS iznosi 6.581,12 eura,

a Ispravak statusa projekta iznosi 15.726,72 eura koji se odnosi na dio stavki troškovnika koje su neprihvatljive. Prema navedenom Županijska lučka uprava Krk je izvršila povrat sredstava u iznosu od 9.148,18 eura.

Ukupno dobivena bespovratna sredstva sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova od 2019. godine je 3.937.830,60 eura i to:

- u 2021. godini iznos od 1.177.298,20 eura
- u 2022. godini iznos od 1.343.817,04 eura
- u 2023. godini iznos od 1.425.863,54 eura
- u 2024. godini izvršen povrat od 9.148,18 eura.

Preneseni višak prihoda (konto 522) ostvaren je u iznosu od 1.128.415,00 eura, što je u skladu s planiranim iznosom. Planirani višak prihoda nastao je temeljem izvršenja financijskog plana za 2023. godinu.

Županijska lučka uprava Krk se u 2024. godini prijavila na natječaje za sufinanciranje projekata iz Proračuna Republike Hrvatske, Proračuna Primorsko-goranske županije i Europskih fondova:

1. Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u 2024. godini namijenjenih za prihvrat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet, od županijskog i lokalnog značaja
2. Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava za poticanje rada županijskih lučkih uprava u 2024. godini
3. Poziv u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. za izgradnju i dogradnju komunalnih vezova s ciljem pružanja dostatne zaštite plovilima unutar luke i rješavanje problema nedostatnog broja vezova za potrebe lokalnog stanovništva.

Osim navedenih natječaja zaključeni su ugovori o sufinanciranju s lokalnim samoupravama.

Temeljem prijave za navedene natječaje i sklopljenih ugovora s lokalnim samoupravama za sufinanciranje projekata Županijskoj lučkoj upravi Krk dodijeljena su sredstva u sveukupnom iznosu od 936.735,20 eura i to za:

1. Dogradnja luke Baška – 3. faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri gata okomita na njega prema sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju broj: 9 – POM/2024 od 13. ožujka 2024. godine i Dodatak Ugovoru broj: 9 – POM/2024 od 03. siječnja 2025. godine u iznosu od 436.040,20 eura (Proračun Republike Hrvatske)
2. Rekonstrukcija istezališta – odvodnja i zbrinjavanje otpadne vode na istezalištu u luci Krk prema sklopljenom Ugovoru br. 031/07/2024 o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za poticanje rada županijskih lučkih uprava u

2024. godini od 24. svibnja 2024. godine u iznosu od 105.000,00 eura (Proračun Primorsko-goranske županije)

3. Rekonstrukcija luke Baška – radovi na izradi i ugradnji sidrenog sustava plovila – 3. faza prema sklopljenom Ugovoru br. 031/07/2024 o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za poticanje rada županijskih lučkih uprava u 2024. godini od 24. svibnja 2024. godine u iznosu od 120.000,00 eura (Proračun Primorsko-goranske županije)
4. Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – gatovi – usluga izrade idejnog i glavnog projekta prema sklopljenom Ugovoru br. 031/07/2024 o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za poticanje rada županijskih lučkih uprava u 2024. godini od 24. svibnja 2024. godine u iznosu od 20.000,00 eura (Proračun Primorsko-goranske županije)
5. Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran – usluga izrade izvedbenog projekta prema sklopljenom Ugovoru br. 031/07/2024 o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za poticanje rada županijskih lučkih uprava u 2024. godini od 24. svibnja 2024. godine u iznosu od 35.000,00 eura (Proračun Primorsko-goranske županije)
6. Nabava i montaža pristupne pasarele za prilaz plutajućem pontonu u luci Malinska prema sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju nabave i montaže pristupne pasarele za prilaz plutajućem pontonu u luci Malinska od 29. srpnja 2024. godine u iznosu od 9.115,00 eura (Proračun Općine Malinska-Dubašnica)
7. Rekonstrukcija luke Baška – 4. faza – radovi prema sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju radova na projektu rekonstrukcije luke Baška – 4. faza od 09. svibnja 2024. godine u iznosu od 100.000,00 eura (Proračun Općine Baška)
8. Projekti za izvršene usluge i radove u luci Punat prema Ugovoru o sufinanciranju usluga i radova na projektima koji se provode na području luke otvorene za javni promet županijskog značaja - luka Punat od 28. ožujka 2024. godine u iznosu od 111.580,00 eura (Proračun Općine Punat).


Od ukupno dodijeljenih sredstava ostvareno je 799.761,39 eura.

Kreditno zaduženje

Županijska lučka uprava Krk nije se kreditno zadužila u 2024. godini.


Prema vrsti prihoda, grafički se iskazuje kako slijedi:

Prikaz ostvarenih prihoda ŽLU Krk u 2024. g.

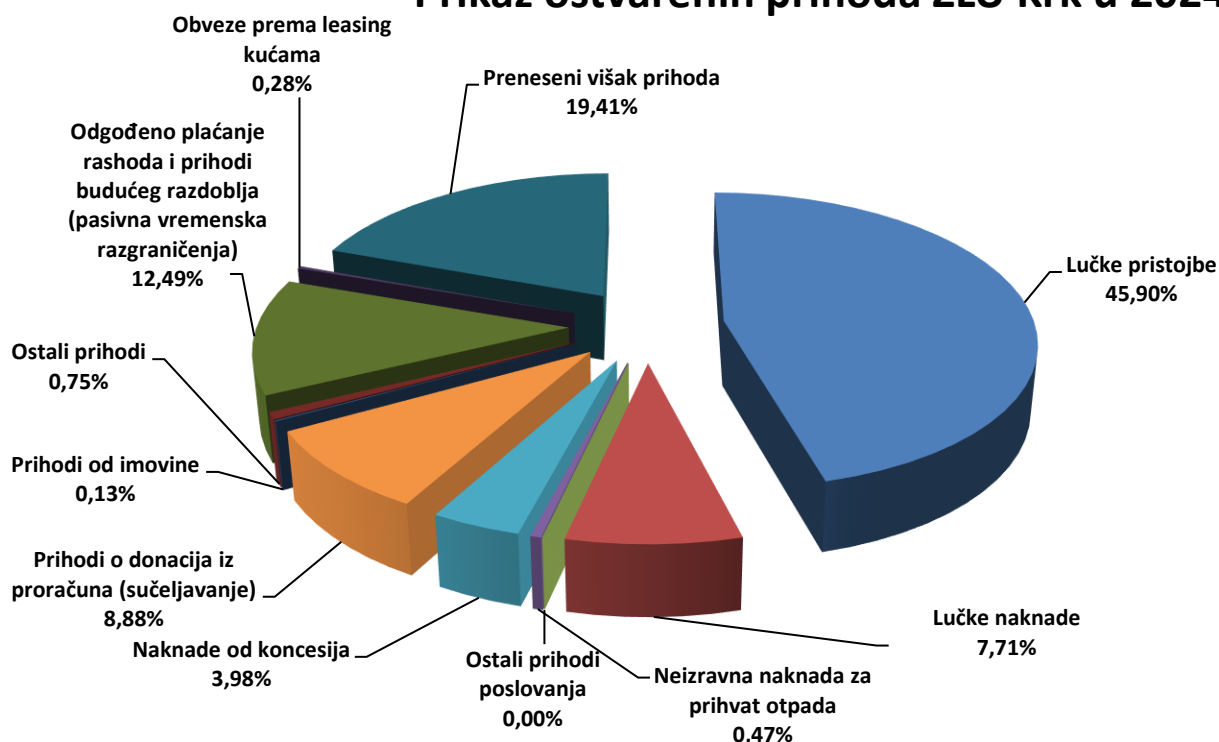


Detaljni prikaz izvršenja prihoda prikazan je u Izvještaju o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za 2024. godinu koji je sastavni dio ovog plana rada.

Prikaz planiranih i ostvarenih prihoda ŽLU Krk za 2024. godinu

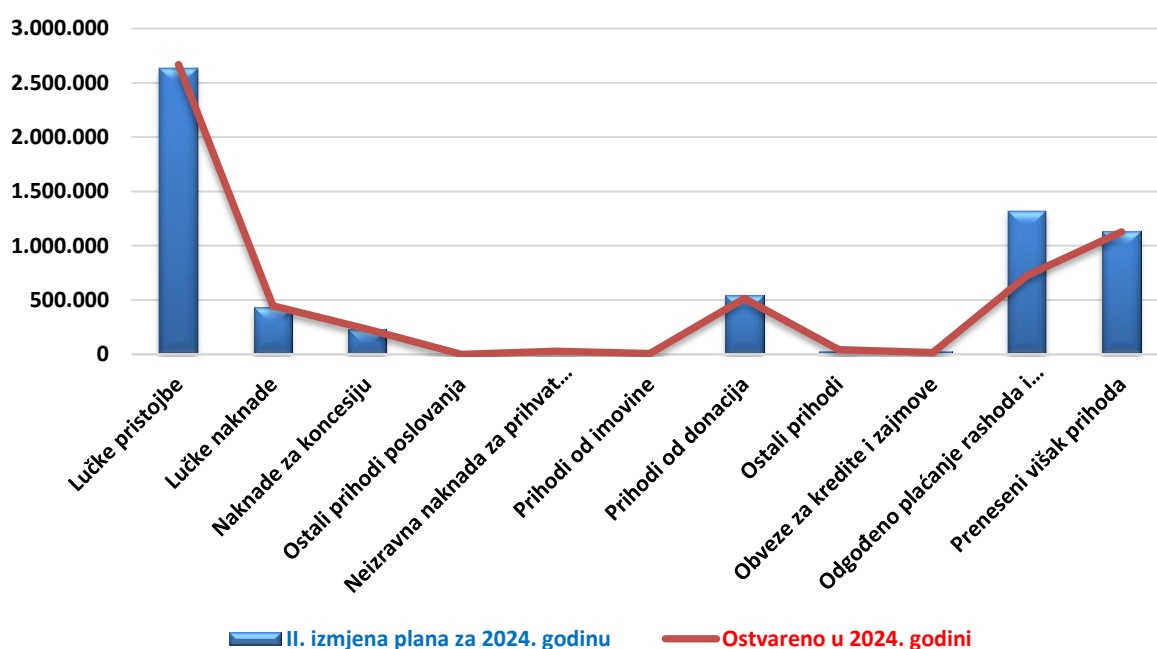


✚ Usporedba ostvarenih prihoda o pružanja usluga za razdoblje 2022. – 2024. godine (u EUR)

Konto	Naziv	Ostvareno u 2022. godini	Ostvareno u 2023. godini	Ostvareno u 2024. godini
3112	Prihodi od pružanja usluga	2.736.063,73	2.850.819,82	3.375.810,83

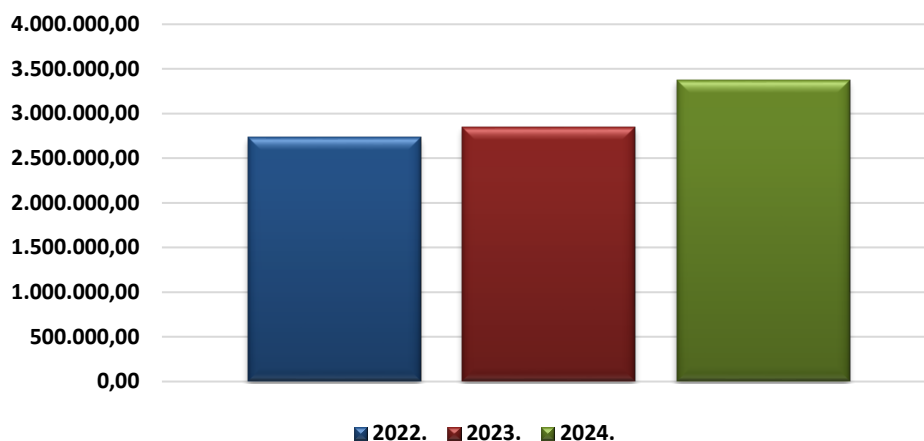


✚ Usporedba ostvarenih prihoda od lučkih pristojbi za razdoblje 2022. – 2024. godine (u EUR)

Konto	Naziv	Ostvareno u 2022. godini	Ostvareno u 2023. godini	Ostvareno u 2024. godini
311211	Pristojba za uporabu obale	448.067,23	512.888,18	568.411,37
311212	Brodsko ležarina	127.016,42	135.136,15	159.965,01
311213	Pristojba za vez	1.523.973,63	1.555.462,40	1.939.819,08

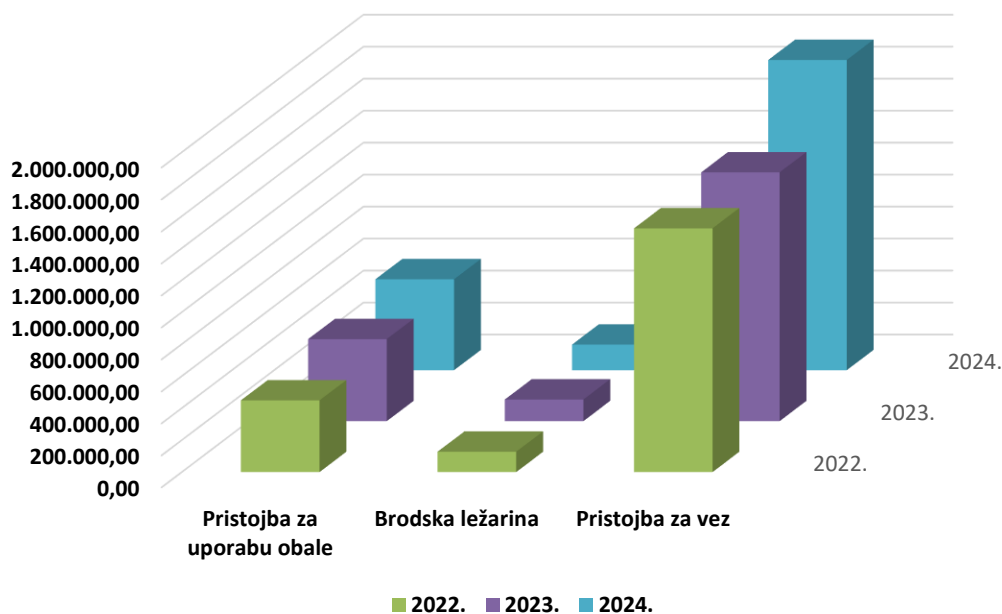


✚ Usporedba ostvarenih prihoda od pristojbi za vez za razdoblje 2022. – 2024. godine (u EUR)

Konto	Naziv	Ostvareno u 2022. godini	Ostvareno u 2023. godini	Ostvareno u 2024. godini
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	208.518,15	202.091,18	200.318,21
3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.315.455,48	1.353.371,22	1.739.500,87

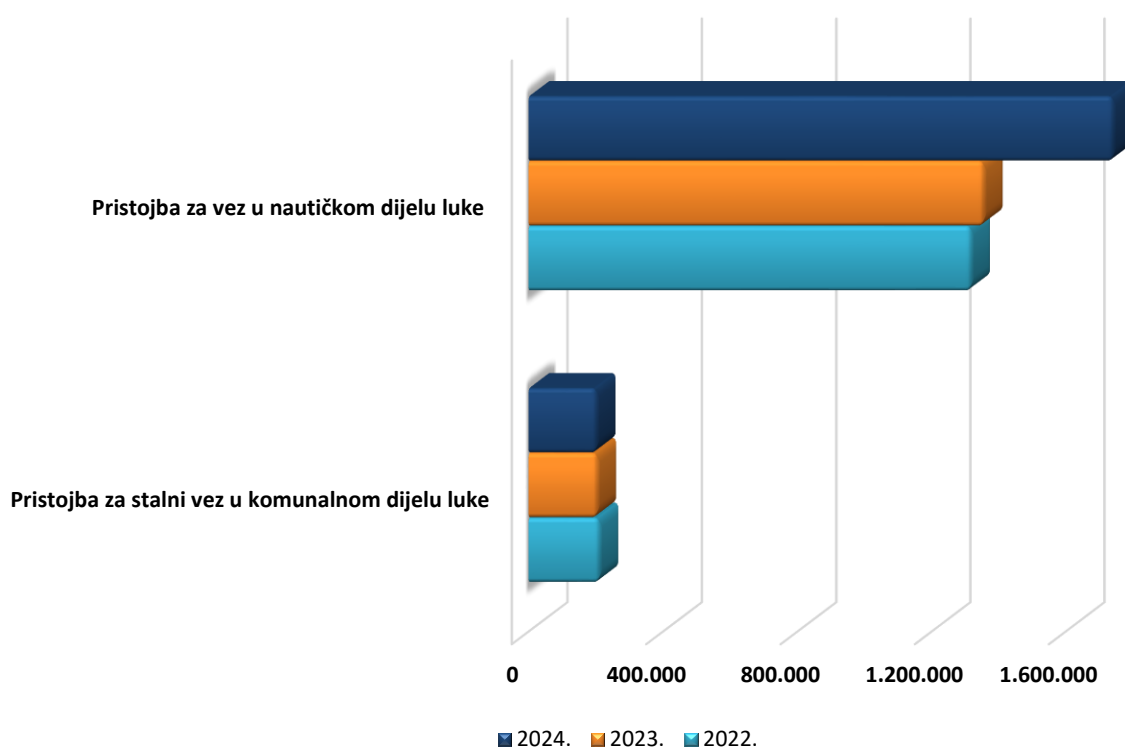


Usporedba ostvarenih prihoda od lučkih naknada za razdoblje 2022. – 2024. godine (u EUR)

Konto	Naziv	Ostvareno u 2022. godini	Ostvareno u 2023. godini	Ostvareno u 2024. godini
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	303.181,37	307.776,51	321.905,90
311224	Usluge opskrbe vodom	6.890,22	13.788,44	15.354,94
311225	Usluge opskrbe električnom energijom	31.265,54	40.897,68	55.060,38
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	36.461,61	34.228,18	56.191,25

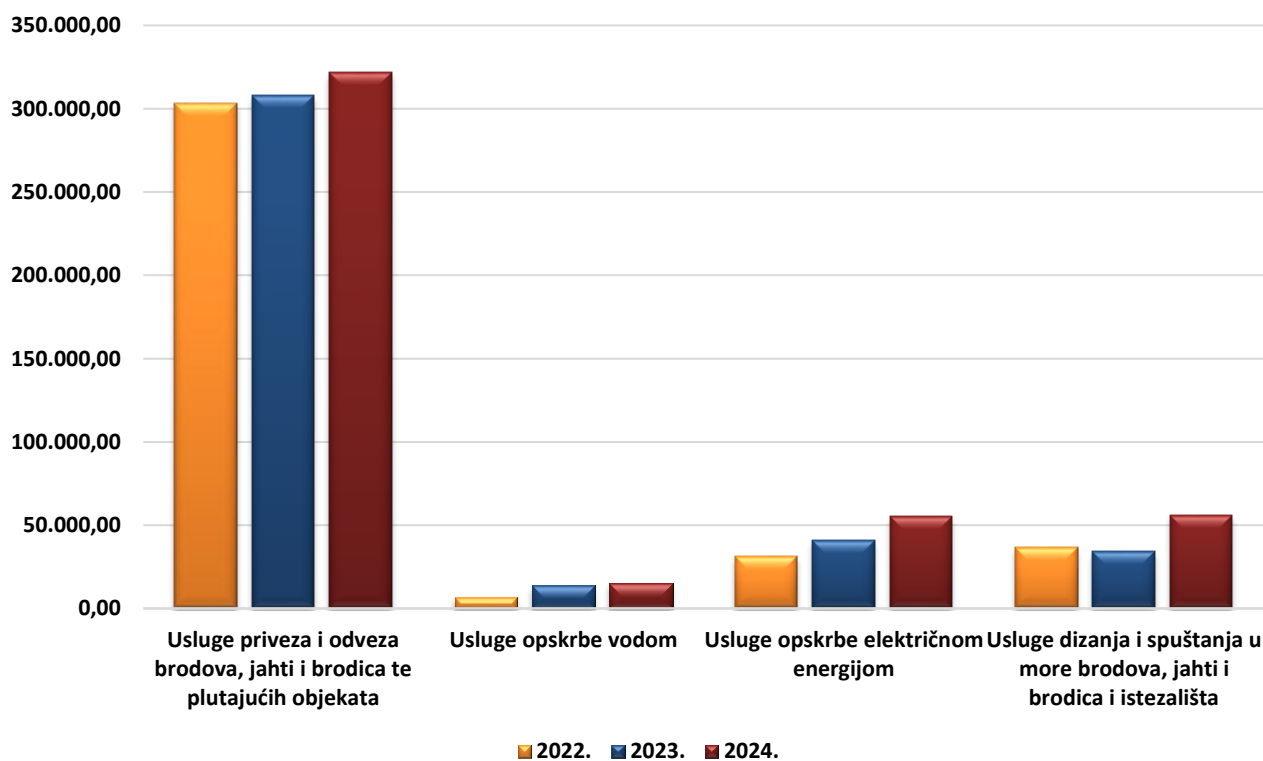


✚ Usporedba ostvarenih prihoda od naknada za koncesiju za razdoblje 2022. – 2024. godine (u EUR)

Konto	Naziv	Ostvareno u 2022. godini	Ostvareno u 2023. godini	Ostvareno u 2024. godini
311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	31.188,83	34.224,60	23.893,53
311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	227.933,94	192.237,90	162.351,69
311233	Dozvole na pomorskom dobru	0,00	0,00	45.323,00

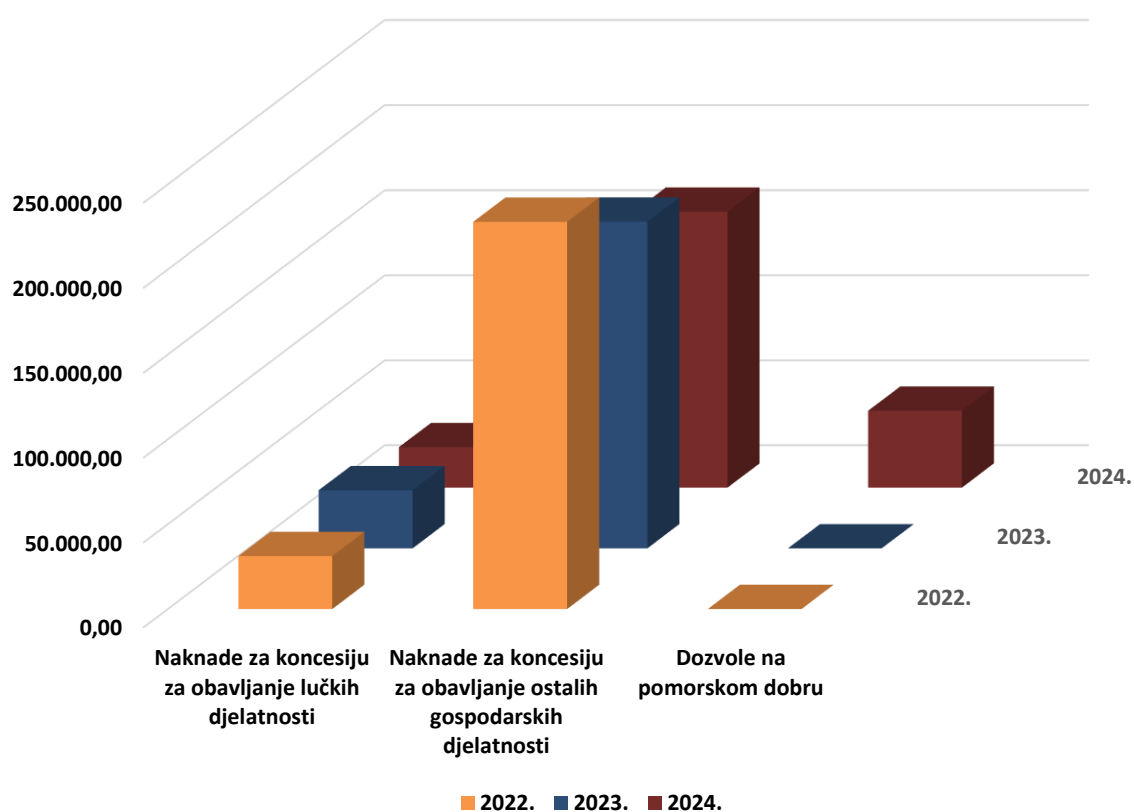


✚ **Usporedba ostvarenih prihoda od naknada za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti za razdoblje 2022. – 2024. godine (u EUR)**

Konto	Naziv	Ostvareno u 2022. godini	Ostvareno u 2023. godini	Ostvareno u 2024. godini
3112311	Fiksni dio koncesijske naknade	20.585,31	20.585,30	12.965,14
3112312	Promjenjivi dio koncesijske naknade	10.603,52	13.639,20	10.928,39

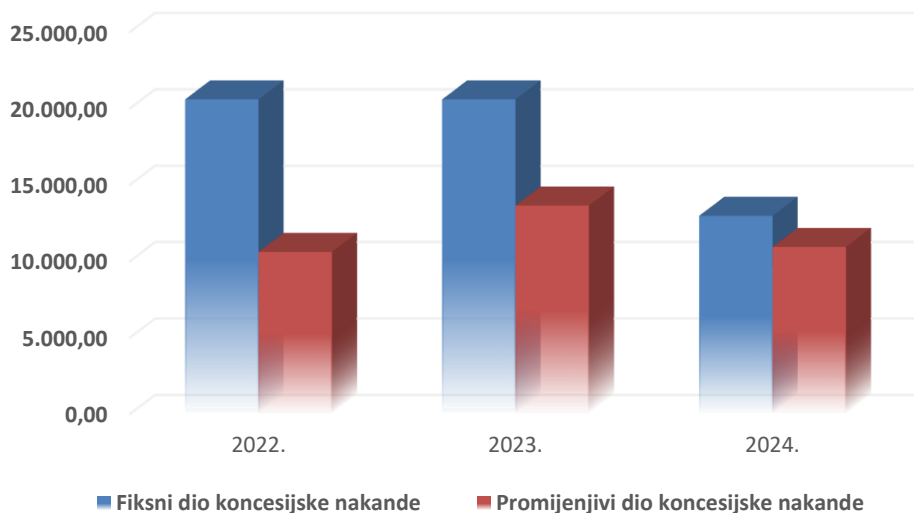


✚ **Usporedba ostvarenih prihoda od naknada za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti za razdoblje 2022. – 2024. godine (u EUR)**

Konto	Naziv	Ostvareno u 2022. godini	Ostvareno u 2023. godini	Ostvareno u 2024. godini
3112321	Fiksni dio koncesijske naknade	74.665,97	75.919,66	61.183,06
3112322	Promjenjivi dio koncesijske naknade	153.267,97	116.318,24	101.168,63

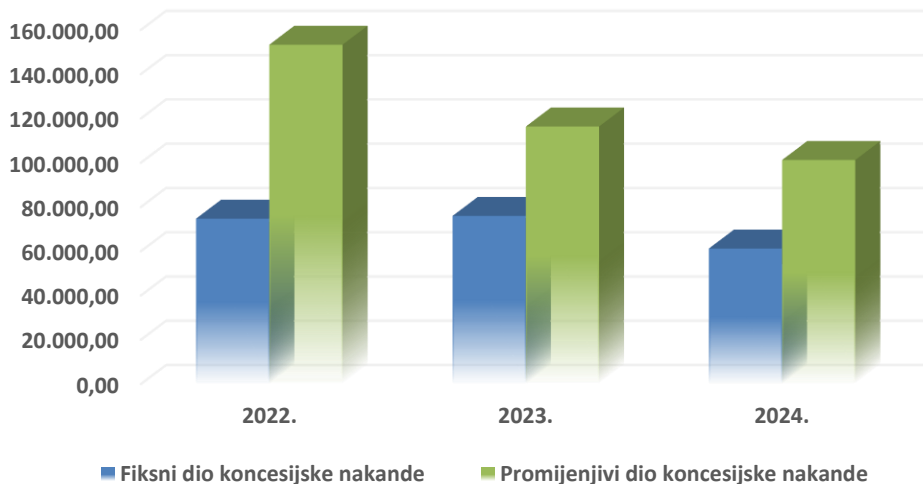


✚ Usporedba ostvarenih prihoda od dozvola na pomorskom dobru za razdoblje 2022. – 2024. godine (u EUR)

Konto	Naziv	Ostvareno u 2022. godini	Ostvareno u 2023. godini	Ostvareno u 2024. godini
311233	Dozvole na pomorskom dobru	0,00	0,00	45.323,00



✚ Usporedba ostvarenih prihoda od ostalih prihoda poslovanja za razdoblje 2022. – 2024. godine (u EUR)

Konto	Naziv	Ostvareno u 2022. godini	Ostvareno u 2023. godini	Ostvareno u 2024. godini
31124	Ostali prihodi poslovanja i rezervacije	84,94	614,79	120,00





Luka Baška



Luka Krk


5. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA

U 2024. godini Županijska lučka uprava Krk ostvarila je ukupne rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode budućih razdoblja i nedospjelu naplatu prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) te obveze za kredite i zajmove u iznosu od 4.407.665,26 eura, što predstavlja 79,45% planiranog iznosa od 5.547.883,00 eura.

u EUR

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2024. godini	Ostvareno u 2024. godini	Index
41	Rashodi za radnike	756.602,00	770.938,28	101,89
42	Materijalni rashodi	1.503.859,00	1.336.300,43	88,86
43	Rashodi amortizacije	779.651,00	795.428,10	102,02
44	Financijski rashodi	14.330,00	11.507,07	80,30
45	Donacije	0,00	0	-
46	Ostali rashodi	10.000,00	1.881,52	18,82
UKUPNI RASHODI POSLOVANJA		3.064.442,00	2.916.055,40	95,16
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	1.993.675,00	1.476.442,38	74,06
051	Građevinski objekti	1.301.018,00	1.026.168,78	78,87
052	Postrojenja i oprema u pripremi	91.407,00	78.613,74	86,00
053	Prijevozna sredstva u pripremi	26.745,00	26.739,83	99,98
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	566.505,00	344.920,03	60,89
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	8.000,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.993.675,00	1.476.442,38	74,06
19	Rashodi budućih razdoblja	474.751,00	0,00	0,00
RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)		474.751,00	0,00	0,00
262	Obveze prema leasing kućama	15.015,00	15.167,48	101,02
OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE		15.015,00	15.167,48	101,02
52	Preneseni manjak prihoda			-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA, RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE, RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA) I OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE		5.547.883,00	4.407.665,26	79,45

Prikaz plana i ostvarenja rashoda i izdataka za 2024. godinu

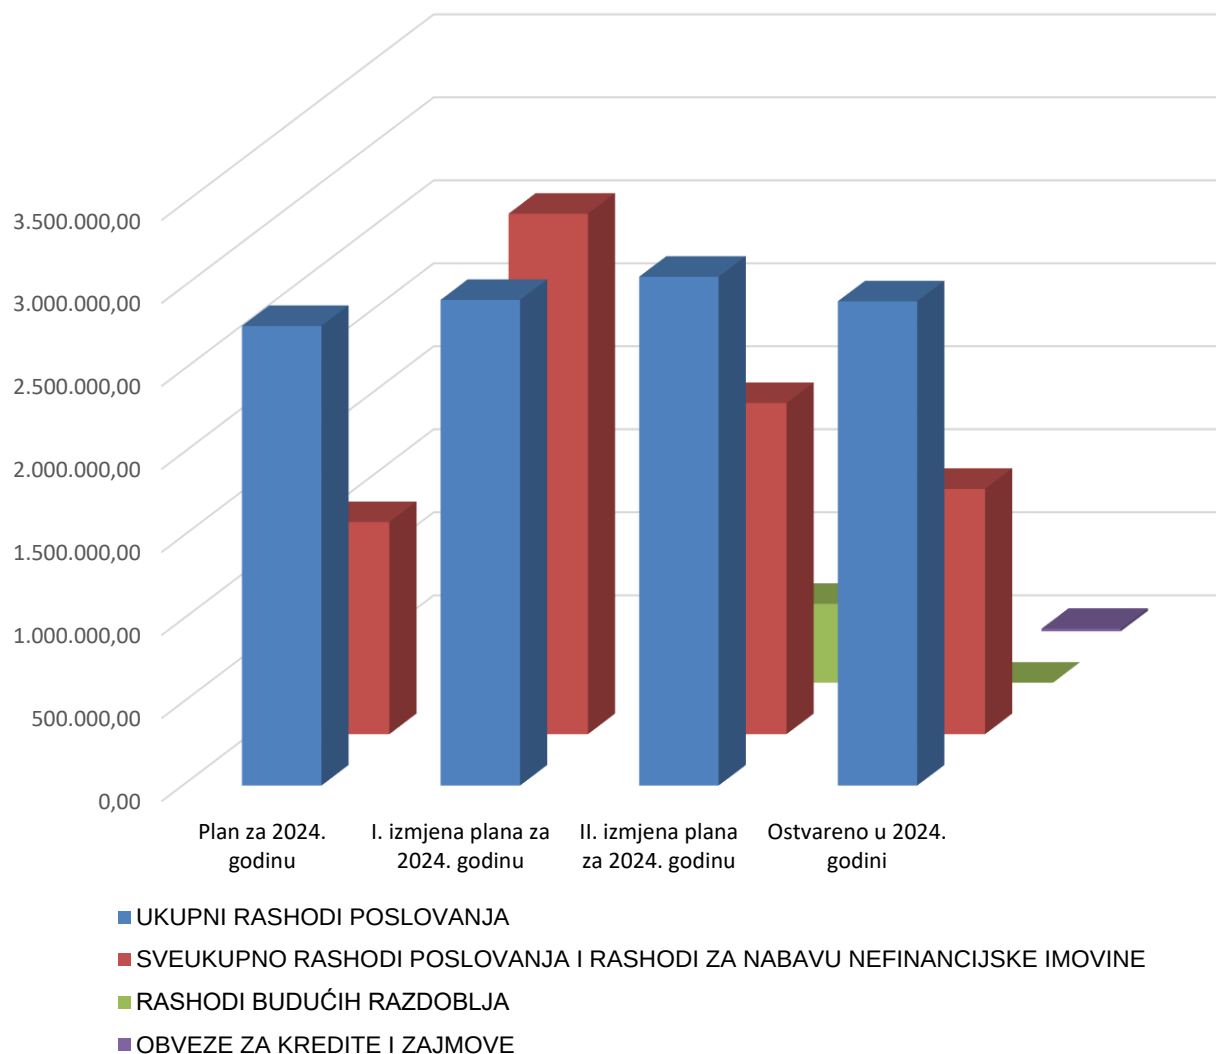

Ostvareni rashodi Županijske lučke uprave Krk u ukupnom iznosu od 4.407.665,26 eura obuhvaćaju:

- ✚ Rashode poslovanja – 2.916.055,40 eura
- ✚ Rashode za nabavu nefinancijske imovine – 1.476.442,38 eura
- ✚ Obveze za kredite i zajmove – 15.167,48 eura.

Rashodi poslovanja Županijske lučke uprave Krk ostvareni su u iznosu od 2.916.055,40 eura, što predstavlja 95,16% planiranog iznosa od 3.064.442,00 eura.

Rashodi za radnike (konto 41) ostvareni su u iznosu od 770.938,28 eura, što predstavlja 101,89% planiranog iznosa od 756.602,00 eura. Ovi rashodi obuhvaćaju plaće za redovni rad u bruto iznosu (konto 411), ostale rashode za radnike (konto 412) te doprinose na plaće (konto 413).

Materijalni rashodi (konto 42) ostvareni su u iznosu od 1.336.300,43 eura, što predstavlja 88,86% planiranog iznosa od 1.503.859,00 eura. Ovi rashodi obuhvaćaju: naknade troškova radnicima (konto 421), naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. (konto 422), rashode za usluge (konto 425), rashode za materijal i energiju (konto 426) te ostale nespomenute materijalne rashode (konto 429).

Rashodi za usluge (konto 425) ostvareni su u iznosu od 1.097.332,71 eura, što predstavlja 91,51% planiranog iznosa od 1.199.107,00 eura. Ovi rashodi obuhvaćaju: usluge telefona, pošte i prijevoza (konto 4251), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (konto 4252), usluge promidžbe i informiranja (konto 4253), komunalne usluge (konto 4254), zakupnine i najamnine (konto 4255), zdravstvene i veterinarske usluge (konto 4256), intelektualne i osobne usluge (konto 4257), računalne usluge (konto 4258) te ostale usluge (konto 4259).

Rashodi za materijal i energiju (konto 426) ostvareni su u iznosu od 156.642,48 eura, što predstavlja 80,03% planiranog iznosa od 195.725,00 eura. Ovi rashodi obuhvaćaju: uredski materijal i ostali materijalni rashodi – materijal za čišćenje i održavanje (konto 4261), materijal i sirovine – materijal u slučaju onečišćenja mora (konto 4262), energija (konto 4263), sitni inventar i autogume (konto 4264), gorivo za vozila i plovila (konto 4265), materijal za tekuće održavanje (konto 4267) te potrošni materijal - nabava kartica za otpad za korisnike luke (konto 4268).

Ostali nespomenuti materijalni rashodi (konto 429) ostvareni su u iznosu od 36.141,65 eura, što predstavlja 86,34% planiranog iznosa od 41.862,00 eura. Ovi rashodi obuhvaćaju: premije osiguranja (konto 4291), reprezentaciju (konto 4292), članarine (konto 4293) te ostale nespomenute materijalne rashode (konto 4295).

Rashodi amortizacije (konto 43) ostvareni su u iznosu od 795.428,10 eura, što predstavlja 102,02% planiranog iznosa od 779.651,00 eura.

Financijski rashodi (konto 44) ostvareni su u iznosu od 11.507,07 eura, što predstavlja 80,30% planiranog iznosa od 14.330,00 eura. Ovi rashodi obuhvaćaju: kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora (konto 442) te ostale financijske rashode (konto 443).

Ostali rashodi (konto 46) ostvareni su u iznosu od 1.881,52 eura, što predstavlja 18,82% planiranog iznosa od 10.000,00 eura. Ovi rashodi obuhvaćaju: kazne, penale i naknade štete (konto 461) te ostale nespomenute rashode (konto 462).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (konto 05) planirani su u iznosu od 1.476.442,38 eura, što predstavlja 74,06% planiranog iznosa od 1.993.675,00 eura. Ovi rashodi obuhvaćaju: građevinske objekte (konto 051), postrojenja i oprema u pripremi (konto 052), prijevozna sredstva u pripremi (konto 053), ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi (konto 055) te ostala nefinancijska imovina u pripremi (konto 056).

Građevinski objekti (konto 051) ostvareni su u iznosu od 1.026.168,78 eura, što predstavlja 78,87% planiranog iznosa od 1.301.018,00 eura. Ovi rashodi obuhvaćaju ulaganja u lučku

podgradnju (konto 05131), ulaganja u skladište, silose i garaže (konto 05134), EU projekt – Dogradnja luke Baška (konto 0514), EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk (konto 0515) te EU projekt – Rekonstrukcija luke Vrbnik (konto 0516).

Postrojenja i oprema u pripremi (konto 052) ostvareni su u iznosu od 78.613,74 eura, što predstavlja 86,00% planiranog iznosa od 91.407,00 eura. Ovi rashodi obuhvaćaju ulaganja u uredsku opremu i namještaj u pripremi (konto 0521), komunikacijsku opremu u pripremi (konto 0522) te komunalnu opremu u pripremi (konto 0523).

Prijevozna sredstva u pripremi (konto 053) ostvareni su u iznosu od 26.739,83 eura, što predstavlja 99,98% planiranog iznosa od 26.745,00 eura. Ovi rashodi obuhvaćaju automobile i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu (konto 0531).

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi (konto 055) ostvareni su u iznosu od 344.920,03, što predstavlja 60,89% planiranog iznosa od 566.505,00 eura. Ovi rashodi obuhvaćaju ulaganje u računalne programe (konto 0551), ulaganje u projektnu dokumentaciju (konto 0552), usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata (konto 0553) te vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata (konto 0554).

Ostala nefinancijska imovina u pripremi (konto 056) planirana je u iznosu od 8.000,00 eura, ali rashodi nisu ostvareni u 2024. godini.

Rashodi budućih razdoblja za sudske sporove u tijeku (konto 1912) planirani su u iznosu 474.751,00 eura, nisu ostvareni jer sudski spor još traje. Ovi rashodi odnose se na tekući sudski spor za koji su planirana odnosno rezervirana sredstva, uključujući iznos glavnice, uvećan za troškove poreza na dodanu vrijednost i troškove postupka. S obzirom na neizvjesnost ishoda i trajanja spora, planirani su rashodi budućih razdoblja.


Obveze za robne i ostale zajmove (konto 262) ostvarene su u iznosu od 15.167,48 eura, što predstavlja 101,02% planiranog iznosa od 15.015,00 eura. Ove obveze obuhvaćaju glavnice kredita prema leasing kućama koja se podmiruju u 2024. godini, a odnose se na automobile nabavljene u 2023. godini.

Rashodi za radnike (konto 41) ostvareni su u iznosu od 770.938,28 eura što je 101,89% planiranog iznosa od 756.602,00 eura.

Obuhvaćaju plaće za redovni rad u bruto iznosu (konto 411), ostale rashode za radnike (konto 412) te doprinose na plaće (konto 413).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2024. godini	Ostvareno u 2024. godini	Index
41 – RASHODI ZA RADNIKE		756.602,00	770.938,28	101,89
411	Plaće	580.000,00	607.101,41	104,67
412	Ostali rashodi za radnike	80.602,00	69.873,00	86,69
413	Doprinosi na plaće	96.000,00	93.963,87	97,88

Prikaz planiranih i ostvarenih Rashoda za radnike za 2024. godinu




Materijalni rashodi (konto 42) ostvareni su u iznosu od 1.336.300,43 eura što je 88,86 % planiranog iznosa od 1.503.859,00 eura.

Obuhvaćaju naknade troškova radnicima (konto 421), naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. (konto 422), rashode za usluge (konto 425), rashode za materijal i energiju (konto 426) te ostale nespomenute materijalne rashode (konto 429).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2024. godini	Ostvareno u 2024. godini	Index
42 – MATERIJALNI RASHODI		1.503.859,00	1.336.300,43	88,86
421	Naknada troškova radnicima	45.929,00	37.152,50	80,89
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	21.236,00	9.031,09	42,53
425	Rashodi za usluge	1.199.107,00	1.097.332,71	91,51
426	Rashodi za materijal i energiju	195.725,00	156.642,48	80,03
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	41.862,00	36.141,65	86,34

Prikaz planiranih i ostvarenih Materijalnih rashoda za 2024. godinu




Naknade troškova radnicima (konto 421) ostvarene su u iznosu od 37.152,50 eura što je 80,89% planiranog iznosa od 45.929,00 eura.

Obuhvaćaju službena putovanja (konto 4211), naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (konto 4212) te stručno usavršavanje radnika (konto 4213).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2024. godini	Ostvareno u 2024. godini	Index
421 – NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA		45.929,00	37.152,50	80,89
4211	Službena putovanja	15.000,00	8.339,27	55,60
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.554,00	23.907,33	97,37
4213	Stručno usavršavanje radnika	6.375,00	4.905,90	76,96

**Prikaz planiranih i ostvarenih
Naknada troškova radnicima
za 2024. godinu**




Rashodi za usluge (konto 425) ostvareni su u iznosu od 1.097.332,71 eura što je 91,51% planiranog iznosa od 1.199.107,00 eura.

Obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza (konto 4251), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (konto 4252), usluge promidžbe i informiranja (konto 4253), komunalne usluge (konto 4254), zakupnine i najamnine (konto 4255), zdravstvene i veterinarske usluge (konto 4256), intelektualne i osobne usluge (konto 4257), računalne usluge (konto 4258) te ostale usluge (4259).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2024. godini	Ostvareno u 2024. godini	Index
425 – RASHODI ZA USLUGE		1.199.107,00	1.097.332,71	91,51
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.236,00	21.035,10	99,05
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	746.590,00	700.580,87	93,84
4253	Usluge promidžbe i informiranja	37.820,00	31.478,48	83,23
4254	Komunalne usluge	98.993,00	92.654,65	93,60
4255	Zakupnine i najamnine	25.256,00	24.413,61	96,66
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.800,00	12.363,63	96,59
4257	Intelektualne i osobne usluge	190.260,00	148.644,12	78,13
4258	Računalne usluge	36.856,00	34.713,91	94,19
4259	Ostale usluge	29.296,00	31.448,34	107,35

Prikaz planiranih i ostvarenih Rashoda za usluge za 2024. godinu




Rashodi za materijal i energiju (konto 426) ostvareni su u iznosu od 156.642,48 eura što je 80,03% planiranog iznosa od 195.725,00 eura.

Obuhvaćaju uredski materijal i ostali materijalni rashodi – materijal za čišćenje i održavanje (konto 4261), materijal i sirovine – materijal u slučaju onečišćenja mora (konto 4262), energija (konto 4263), sitni inventar i autogume (konto 4264), gorivo za vozila i plovila (konto 4265) te materijal za tekuće održavanje (konto 4267).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2024. godini	Ostvareno u 2024. godini	Index
426 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		195.725,00	156.642,48	80,03
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – materijal za čišćenje i održavanje	8.000,00	7.037,21	87,97
4262	Materijal i sirovine – materijal u slučaju onečišćenja mora	10.620,00	9.283,70	87,42
4263	Energija	92.655,00	72.953,54	78,74
4264	Sitni inventar i autogume	25.700,00	12.979,17	50,50
4265	Gorivo za vozila i plovila	12.000,00	10.517,55	87,65
4267	Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.)	40.000,00	37.121,31	92,80
4268	Potrošni materijal - nabava kartica za otpad za korisnike luke	6.750,00	6.750,00	100,00

Prikaz planiranih i ostvarenih Rashoda za materijal i energiju za 2024. godinu




Ostali nespomenuti materijalni rashodi (konto 429) ostvareni su u iznosu od 36.141,65 eura što je 86,34% planiranog iznosa od 41.862,00 eura.

Obuhvaćaju premije osiguranja (konto 4291), reprezentaciju (konto 4292), članarine (konto 4293) te ostale nespomenute materijalne rashode (konto 4295).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2024. godini	Ostvareno u 2024. godini	Index
429 – OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI		41.862,00	36.141,65	86,34
4291	Premije osiguranja	25.100,00	24.779,77	98,72
4292	Reprezentacija	15.000,00	9.871,99	65,81
4293	Članarine	1.062,00	1.000,00	94,16
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi – biljezi i pristojbe	700,00	489,89	69,98


**Prikaz planiranih i ostvarenih
Ostalih nespomenutih materijalnih rashoda
za 2024. godinu**



Rashodi amortizacije (konto 43) ostvareni su u iznosu od 795.428,10 eura što je 102,02% planiranog iznosa od 779.651,00 eura.

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2024. godini	Ostvareno u 2024. godini	Index
43	Rashodi amortizacije	779.651,00	795.428,10	102,02


**Prikaz planiranih i ostvarenih
Rashoda amortizacije
za 2024. godinu**

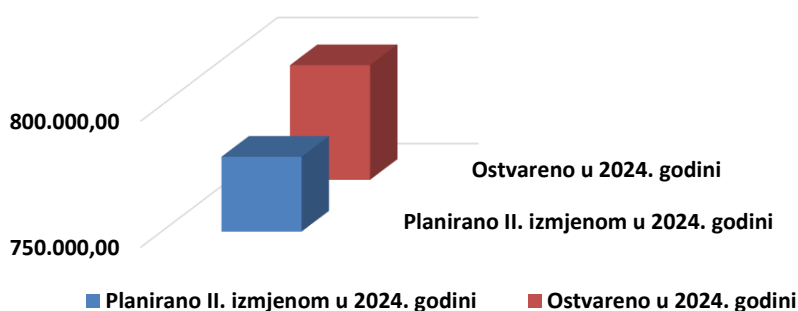

Financijski rashodi (konto 44) ostvareni su u iznosu od 11.507,07 eura što je 80,30% planiranog iznosa od 14.330,00 eura. Obuhvaćaju kamate na primljene kredite i zajmove (konto 442) te ostale financijske rashode (konto 443).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2024. godini	Ostvareno u 2024. godini	Index
44 – FINANCIJSKI RASHODI		14.330,00	11.507,07	80,30
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	3.800,00	3.704,89	97,50
443	Ostali financijski rashodi	10.530,00	7.802,18	74,09

**Prikaz planiranih i ostvarenih
Financijskih rashoda
za 2024. godinu**

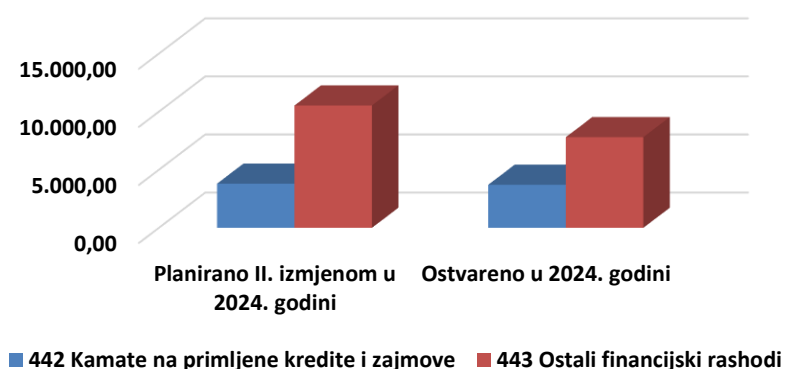


Ostali rashodi (konto 46) ostvareni su u iznosu od 1.881,52 eura što je 18,82% planiranog iznosa od 10.000,00 eura.

Obuhvaćaju kazne, penale i naknade štete (konto 461) te ostale nespomenute rashode (konto 462).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2024. godini	Ostvareno u 2024. godini	Index
46 – OSTALI RASHODI		10.000,00	1.881,52	18,82
461	Kazne, penali i naknada štete	0,00	504,34	-
462	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	1.377,18	13,77

**Prikaz planiranih i ostvarenih
Ostalih rashoda
za 2024. godinu**




Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi (konto 05) ostvareni su u iznosu od 1.476.442,38 eura što je 74,06% planiranog iznosa od 1.993.675,00 eura.

Obuhvaćaju građevinske objekte (konto 051), postrojenja i oprema u pripremi (konto 052), prijevozna sredstva u pripremi (konto 053) te ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u pripremi (konto 055).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2024. godini	Ostvareno u 2024. godini	Index
05 –	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE U PRIPREMI	1.993.675,00	1.476.442,38	74,06
051	Građevinski objekti	1.301.018,00	1.026.168,78	78,87
052	Postrojenja i oprema u pripremi	91.407,00	78.613,74	86,00
053	Prijevozna sredstva u pripremi	26.745,00	26.739,83	99,98
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	566.505,00	344.920,03	60,89
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	8.000,00	0,00	0,00

**Prikaz planiranih i ostvarenih
Rashoda za nabavu nefinancijske imovine u pripremi
za 2024. godinu**

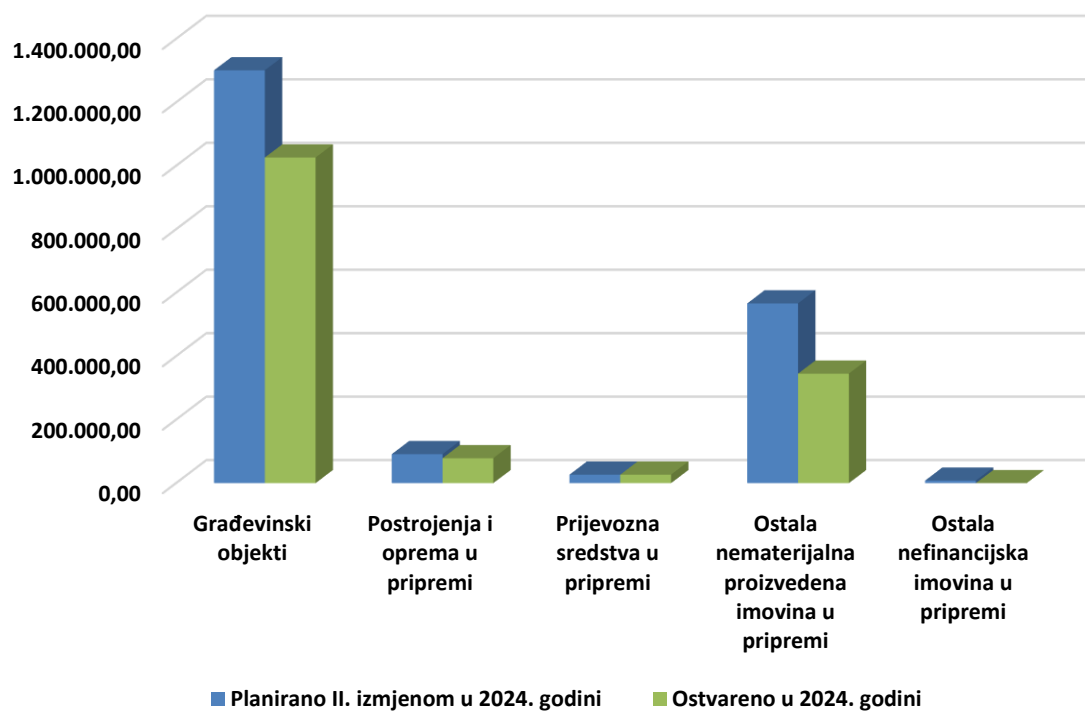


Građevinski objekti (konto 051) ostvareni su u iznosu od 1.026.168,78 eura što je 78,87% planiranog iznosa od 1.301.018,00 eura.

Obuhvaćaju ulaganja u lučku podgradnju (konto 05131), ulaganja u skladište, silose i garaže (konto 05134), EU projekt – Dogradnje luke Baška (konto 0514), EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk (konto 0515) te EU projekt – Rekonstrukcija luke Vrbnik (konto 0516).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2024. godini	Ostvareno u 2024. godini	Index
051 – GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.301.018,00	1.026.168,78	78,87
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	1.216.293,00	982.583,25	80,79
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.	41.750,00	41.750,00	100,00
0514	EU projekt – Dogradnja luke Baška	10.425,00	1.835,53	17,61
0515	EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk	30.850,00	0,00	0,00
0516	EU projekt – Rekonstrukcija luke Vrbnik	1.700,00	0,00	0,00

Prikaz planiranih i ostvarenih Građevinski objekti za 2024. godinu

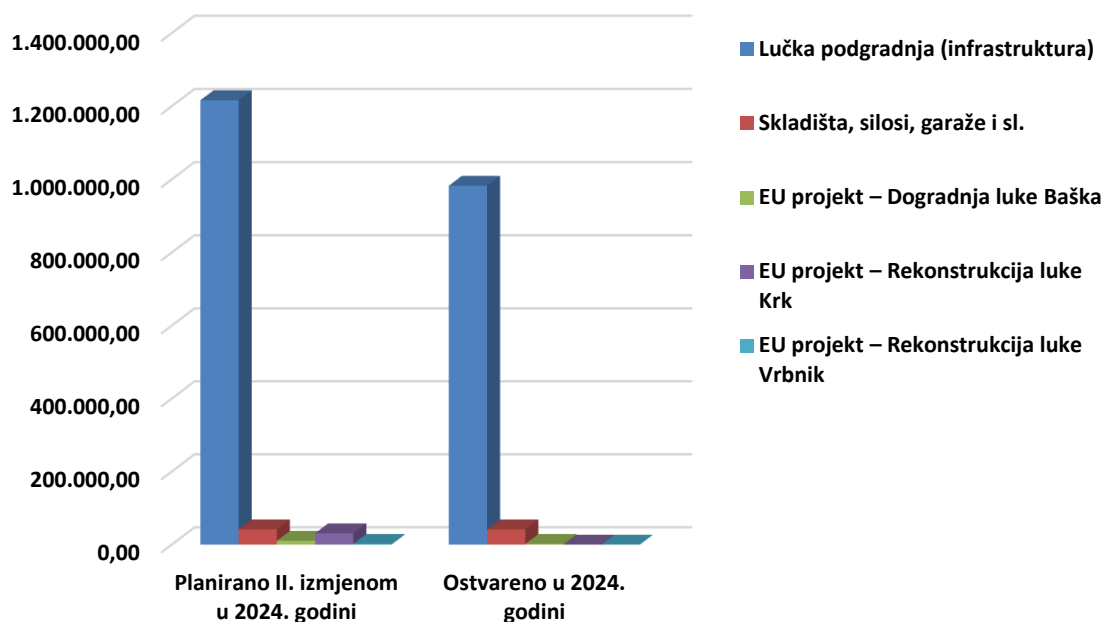


Postrojenja i oprema u pripremi (konto 052) ostvareni su u iznosu od 78.613,74 eura što je 86,00% planiranog iznosa od 91.407,00 eura.

Obuhvaćaju ulaganja u uredsku opremu i namještaj u pripremi (konto 0521), komunikacijsku opremu u pripremi (konto 0522) te komunalnu opremu u pripremi (konto 0523).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2024. godini	Ostvareno u 2024. godini	Index
052 – POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI		91.407,00	78.613,74	86,00
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	22.990,00	15.956,30	69,41
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	6.000,00	3.311,25	55,19
0523	Komunalna oprema u pripremi	62.417,00	59.346,19	95,08

**Prikaz planiranih i ostvarenih
rashoda za Postrojenja i oprema u pripremi
za 2024. godinu**

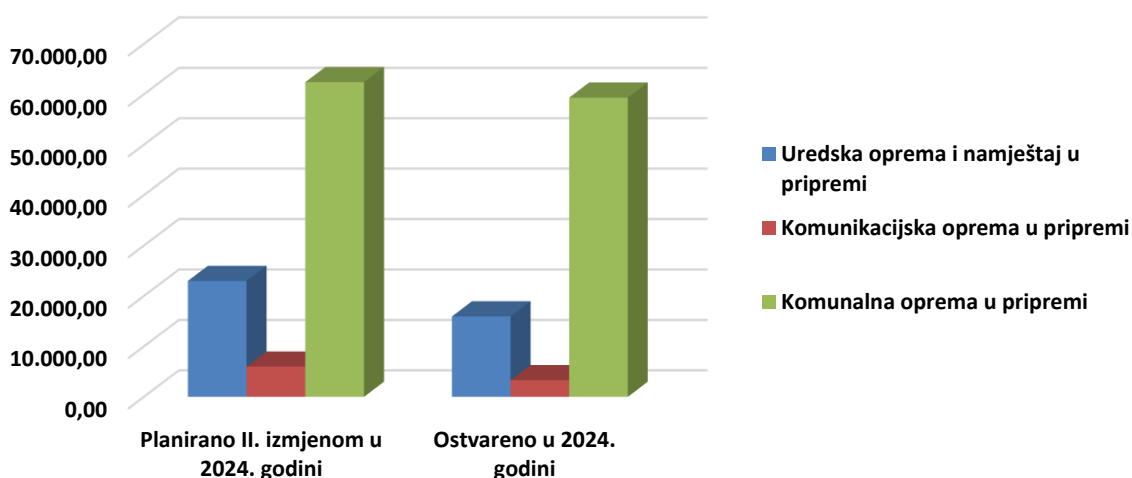


Prijevozna sredstva u pripremi (konto 053) ostvareni su u iznosu od 26.739,83 eura što je 99,98% planiranog iznosa od 26.745,00 eura.

Obuhvaćaju automobile i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu (konto 0531).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2024. godini	Ostvareno u 2024. godini	Index
053 – PRIJEVOZNA SREDSTVA U PRIPREMI		26.745,00	26.739,83	99,98
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.745,00	26.739,83	99,98


**Prikaz planiranih i ostvarenih
rashoda za Prijevozna sredstva u pripremi
za 2024. godinu**




Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi (konto 055) ostvareni su u iznosu od 344.920,03 eura što je 60,89% planiranog iznosa od 566.505,00 eura.

Obuhvaćaju ulaganje u računalne programe (konto 0551), ulaganje u projektnu dokumentaciju (konto 0552), usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata (konto 0553) te vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata (konto 0554).

Konto	Naziv	Planirano II. izmjenom u 2024. godini	Ostvareno u 2024. godini	Index
055	– OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA U PRIPREMI	566.505,00	344.920,03	60,89
0551	Ulaganje u računalne programe	14.375,00	14.375,00	100,00
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	511.977,00	297.465,01	58,10
0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	37.498,00	30.728,49	81,95
0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	2.655,00	2.351,53	88,57

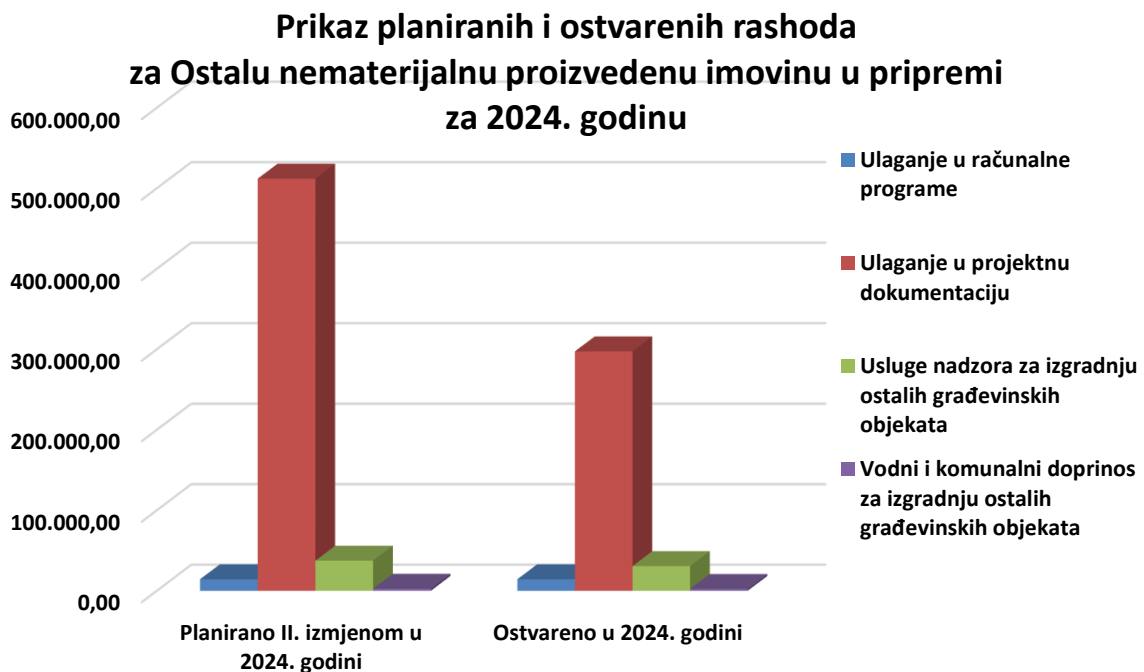

Prikaz ostvarenih rashoda ŽLU Krk u 2024. g.



Luka Porat

Ostvarenje plana rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:

1. Rashodi stručnih i administrativnih poslova
2. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe
3. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave Krk s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaj za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Krk.

Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima sistematizirano 47 radnih mjesta. Zaključno s 31.12.2024. godine uz ravnatelja bilo je popunjeno 28 radnih mjesta temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme i 3 radna mjesta temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme.

Popunjena radna mjesta zaključno s 31.12.2024. godine i zapošljavanja tijekom 2024. godine prikazana su kako slijedi:

Od 47 sistematiziranih radnih mjesta trenutno je popunjeno 31 radno mjesto i to:

Ravnatelj Županijske lučke uprave Krk – 1 izvršitelj

Služba lučkog redarstva

- Voditelj Službe lučkog redarstva – 1 izvršitelj
- Viši stručni suradnik za upravljanje vezovima – 2 izvršitelja
- Voditelj luke – 3 izvršitelja
- Lučki redar – 2 izvršitelja
- Pomoćni lučki redar – 16 izvršitelja *

Služba financijskih i općih poslova

- Voditelj Službe financijskih i općih poslova – 1 izvršitelj
- Viši stručni suradnik za financijske i opće poslove – 2 izvršitelja
- Stručni suradnik za financijske i opće poslove – 1 izvršitelj

Služba razvoja i održavanja

- Viši stručni suradnik za poslove razvoja i održavanja – 1 izvršitelj
- Stručni suradnik za poslove razvoja i održavanja – 1 izvršitelj

*Jedan (1) zaposlenik trenutno je na višemjesečnom bolovanju i vodi se pod ugovorom na neodređeno vrijeme za radno mjesto Lučki redar prema starom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta. Prema novom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i

sistematizaciji radnih mjesta predviđa se sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme za radno mjesto Pomoćni lučki redar.

NAZIV PROGRAMA:	1. RASHODI STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA
SVRHA PROGRAMA:	Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone.
CILJ PROGRAMA:	Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	Program sadrži aktivnost i to: Rashoda ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, ostale nespomenute materijalne rashode, financijske rashode, ostale rashode, uredska i računalna oprema i ostala nefinancijska imovina u pripremi. Za provedbu programa u Izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu planirana su sredstva u visini od 1.060.322,25 eura.

NAZIV PROGRAMA:	2. RASHODI EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA
SVRHA PROGRAMA:	Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama; pružanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog


CILJ PROGRAMA: REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA:	razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži. Surađivati s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranskom županijom, jedinicama lokalne samouprave i pravnim osobama nadležnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja, ekološkim udrugama i centrima radi povećanja razine zaštite od ekoloških zagađenja, te održavanje reda u trajektnim pristaništima pogotovo tokom ljetnih mjeseci. Uskladiti potrebe jedinica lokalne samouprave sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika. Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: 1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja) i mobilnim eko-spremištima 2. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava 3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama 4. Aktivnost – Promidžba Za provedbu programa u Izvršenju Finacijskog plana za 2024. godinu planirana su sredstva u visini od 40.762,18 eura.
---	---

NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA:	3. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka. Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama ZPDML i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje. Uvođenje programa utemeljeno je na ZPDML. Za provedbu programa u Izvršenju Finacijskog plana za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu 3.306.580,83 eura za
---	--

održavanje i razvoj lučke infrastrukture i suprastrukture i to kako slijedi:

Rashodi	Ostvareno u 2024. godini	Udio
Rashodi stručnih i administrativnih poslova	1.060.322,25	24,06%
Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe	40.762,18	0,92%
Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje	3.306.580,83	75,02%
Ukupno	4.407.665,26	

Izvršenje plana rashoda za 2024. godinu

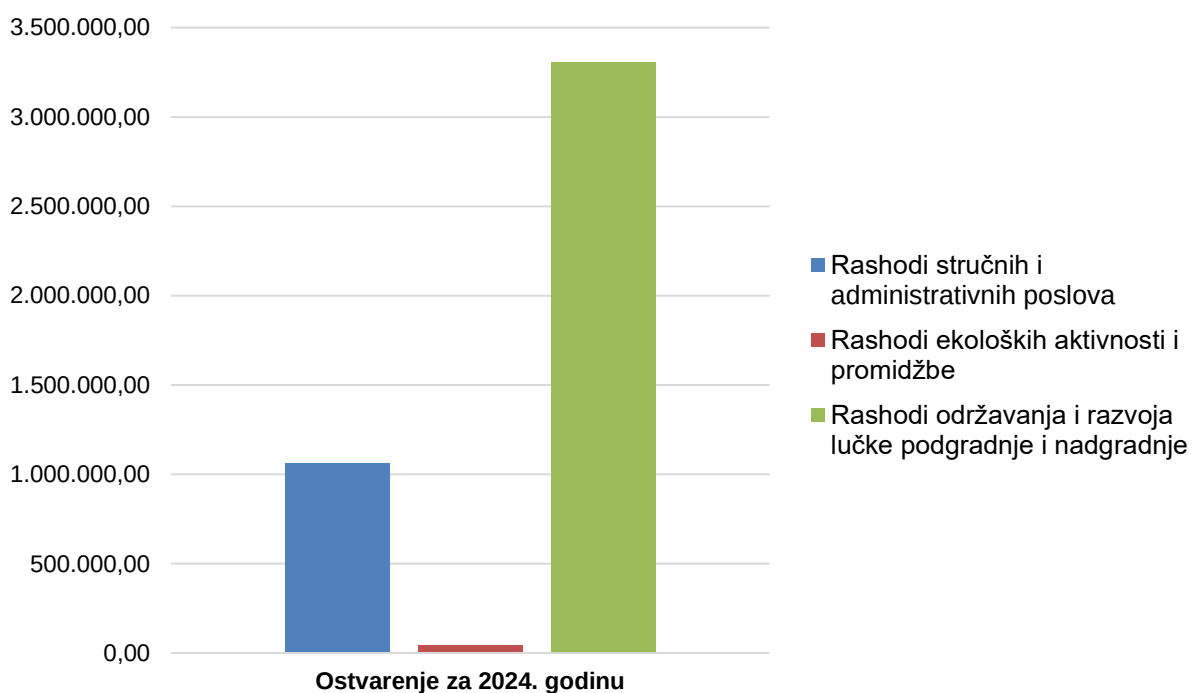



Luka Krk



Luka Porat

PLAN ULAGANJA:

Prikaz ulaganja u lučku infrastrukturu – podgradnju (05131, 05134, 05141, 05148, 05151, 05153, 05154, 05155, 05156, 05157, 05158, 05161, 05163, 05164, 05165, 05166, 05167, 05168, 05224, 05231, 0552, 05531, 05532, 05541) po lukama u ukupnom iznosu od 1.419.371,25 eura.

Opis ulaganja	Planirani iznos ulaganja (u EUR)	Preneseni višak iz 2023. godine (u EUR)	Planirani iznos ulaganja u 2024. godini I. izmjenom plana (u EUR)	Planirani iznos ulaganja u 2024. godini II. izmjenom plana (u EUR)	Ostvareni iznos ulaganja u 2024. godini (u EUR)
LUKA KRK					
Rekonstrukcija luke Krk					
Usluge izrade izmjene i dopune idejnog projekta Rekonstrukcije luke Krk te provedba upravnog postupka za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole (izmjena Uporabne cjeline 1 - 0552)		3.440,00	3.440,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija luke Krk - primarni lukobran – Uporabna cjelina 1					
Studija izvodljivosti za natječaj MMPI za investicije za zaštitu lučkog akvatorija i izgradnju komunalnih vezova - Rekonstrukcija luke Krk (0552)		26.545,00	26.545,00	26.250,00	26.250,00
Usluge pripreme Prijavnog obrasca, pripreme dokumentacije, kompletiranja prijave i unos u sustav za prijavu projekata Rekonstrukcija luke Krk za prijavu na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava (0552)			3.250,00	3.250,00	3.250,00

Upravna pristojba za izmjenu građevinske dozvole - Uporabna cjelina 1 - primarni lukobran (0552)		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Usluge 3D vizualizacije lukobrana za Rekonstrukciju luke Krk - Uporabna cjelina 1 - primarni lukobran (izrada modela i renderiranje) (0552)				500,00	1.500,00
Usluge izrade prilagodbe troškovnika za Rekonstrukciju luke Krk - Uporabna cjelina 1 - primarni lukobran (0552)				2.565,00	2.562,50
Usluge izrade projekta sidrenog sustava plovila Uporabna cjelina 1 i Uporabna cjelina 2 (0552)			16.250,00	16.250,00	0,00
Usluge izrade elaborata iskolčenja za Uporabnu cjelinu 1 i 2 (0552)			1.875,00	0,00	0,00
Nabava radova na rekonstrukciji luke Krk - Uporabna cjelina 1 - primarni lukobran (05131)	10.000,00		prijenos na investiciju EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk		
Usluge stručnog nadzora (građevinski, nadzor za geotehniku i elektronadzor) za radove (05531)	300,00		prijenos na investiciju EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk		
Usluge projektantskog nadzora (glavni projektant i elektro projektant) za radove (05532)	150,00		prijenos na investiciju EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk		
Usluge arheološkog nadzora za radove (05531)	400,00		0,00	0,00	0,00
Usluge koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova za radove (05531)	100,00		prijenos na investiciju EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk		
Rekonstrukcija luke Krk - sekundarni lukobran – Uporabna cjelina 2					
Izvedbeni projekt Rekonstrukcija luke Krk - Uporabna cjelina 2 - sekundarni lukobran (0552)		46.453,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
Usluge izrade izmjene glavnog projekta Rekonstrukcije luke Krk -			10.000,00	13.450,00	0,00

Uporabna cjelina 2 - sekundarni lukobran (0552)					
Usluge revizije izvedbenog projekta (0552)	3.318,00		3.318,00	3.318,00	0,00
Usluge izrade prilagodbe troškovnika za Rekonstrukciju luke Krk - Uporabna cjelina 2 - sekundarni lukobran (0552)				2.190,00	2.187,50
Usluge 3D vizualizacije lukobrana za Rekonstrukciju luke Krk - Uporabna cjelina 2 - sekundarni lukobran (izrada modela i renderiranje) (0552)				500,00	500,00
Nabava radova na rekonstrukciji luke Krk - Uporabna cjelina 2 - sekundarni lukobran (05131)	8.000,00		prijenos na investiciju EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk		
Usluge stručnog nadzora (građevinski, nadzor za geotehniku i elektronadzor) za radove (05531)	200,00		prijenos na investiciju EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk		
Usluge projektantskog nadzora (glavni projektant i elektro projektant) (05532)	100,00		prijenos na investiciju EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk		
Usluge koordinatora zaštite na radu za radove (05531)	200,00		prijenos na investiciju EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk		
Rekonstrukcija luke Krk - Portapižana – Uporabna cjelina 3					
Geodetska podloga za izmjenu lokacijske dozvole i za potrebe građevinske dozvole - Rekonstrukcija luke Krk - Uporabna cjelina 3 - Portapižana (geodezija) (0552)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Maritimna studija, dopuna i ažuriranje - Rekonstrukcija luke Krk - Uporabna cjelina 3 – Portapižana (0552)		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Usluge izrade geotehničkih istražnih radova za Rekonstrukciju luke Krk - Uporabna cjelina 3 – Portapižana (0552)		8.250,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00

Glavni projekt - Rekonstrukcija luke Krk - Uporabna cjelina 3 - Portapižana i izmjena idejnog projekta Rekonstrukcije luke Krk (0552)		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Revizija glavnog projekta - Rekonstrukcija luke Krk - Uporabna cjelina 3 – Portapižana (0552)		2.655,00	2.655,00	0,00	0,00
Nabava usluge projekta sidrenog sustava plovila za Rekonstrukciju luke Krk - Uporabna cjelina 3 – Portapižana (0552)			5.500,00	5.500,00	0,00
Usluge izrade prilagodbe troškovnika za Rekonstrukciju luke Krk - Uporabna cjelina 3 – gatovi (0552)				500,00	500,00
Usluge 3D vizualizacije gatova za Rekonstrukciju luke Krk - Uporabna cjelina 3 - gatovi Portapizzana (izrada modela i renderiranje) (0552)				500,00	500,00
Usluge izrade elaborata iskolčenja za Uporabnu cjelinu 3 – Portapižana (0552)			500,00	0,00	0,00
Nabava radova na rekonstrukciji luke Krk - Uporabna cjelina 3 – Portapižana (05131)	8.000,00		prijenos na investiciju EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk		
Usluge stručnog nadzora (građevinski, nadzor za geotehniku i elektronadzor) za radove (05531)	200,00		prijenos na investiciju EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk		
Usluge projektantskog nadzora (glavni projektant i elektro projektant) (05532)	100,00		prijenos na investiciju EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk		
Usluge koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova za radove (05531)	200,00		prijenos na investiciju EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk		
Rampa za osobe s invaliditetom, prilaz sekundarnom lukobranu u luci Krk					
Usluga izrade glavnog projekta prilazne rampe za osobe s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti		3.250,00	3.125,00	prijenos na usluge projektne dokumentacije (konto 42577)	

kao prilaz sekundarnom lukobranu u luci Krk (0552)					
Rekonstrukcija luke Krk - Obala Marina – Uporabna cjelina 5					
Izmjena i dopuna glavnog projekta rekonstrukcije luke Krk - Uporabna cjelina 5 - Obala Marina (ispravak mape 1, mape 2 i ispravak troškovnika) (0552)	11.500,00		11.500,00	0,00	0,00
Izrada maritimne studije za rekonstrukciju luke Krk - Uporabna cjelina 5 - Obala Marina (situacija bez izgrađenog primarnog lukobrana) (0552)	8.250,00		8.250,00	0,00	0,00
EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk					
EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk – radovi (05151)			26.000,00	26.000,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu (05153)			1.200,00	1.200,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - projektantski nadzor (05154)			350,00	350,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - voditelj projekta (05155)			500,00	500,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - administrativno vođenje projekta - neprihvatljivi troškovi (05156)			2.000,00	2.000,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - promidžba i vidljivost (05157)			500,00	500,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk - neprihvatljivi troškovi (05158)			300,00	300,00	0,00
Rekonstrukcija istezališta u luci Krk - odvodnja i zbrinjavanje otpadnih voda na istezalištu					
Radovi na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05131)	141.000,00	10.000,00	151.000,00	150.150,00	150.072,13
Elektroinstalaterski radovi na izradi uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na investiciji odvodnje i				4.810,00	4.466,88

zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05131)					
Radovi na temelju za vinč na investiciji na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05131)				8.000,00	0,00
Nabava lavandina za investiciji na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05231)				525,00	525,00
Usluge dijamantnog brušenja na investiciji na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05131)				300,00	312,50
Usluge izrade projekta potrebnih elemenata za montažu elektromotornog vitla na istezalištu u luci Krk (0552)				5.700,00	0,00
Usluge stručnog nadzora na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05531)	4.030,00	500,00	5.160,00	5.125,00	4.051,28
Usluge koordinatora zaštite na radu na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05531)	1.027,00	300,00	1.327,00	1.500,00	1.500,00
Usluge projektantskog nadzora za radove na odvodnji i zbrinjavanje otpadne vode na istezalištu u luci Krk (05532)			2.500,00	2.500,00	2.500,00
Usluge arheološkog nadzora na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05531)				3.994,00	3.750,00
Usluge nadzora nad elektroinstalaterskim radovima na izradi uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na investiciji odvodnje i zbrinjavanje otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05531)				438,00	437,50
Usluge geodezije, Izjava ovlaštenog inženjera geodezije i snimak izvedenog stanja na odvodnji i	664,00		664,00	664,00	0,00

zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (0552)					
Upravna pristojba za uporabnu dozvolu na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (0552)	239,00		0,00	0,00	0,00
Priključak vode na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk (05131)	1.991,00		1.991,00	1.991,00	769,53
Rekonstrukcija operativne obale Sv. Bernardin u luci Krk					
Nabava usluge izrade glavnog projekta na nivou izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole rekonstrukcije operativne obale Sv. Bernardin u luci Krk (0552)			12.875,00	12.850,00	0,00
Nabava usluge geodetskih radova za glavni projekt rekonstrukcije operativne obale Sv. Bernardin u luci Krk (0552)			3.250,00	3.250,00	0,00
Usluge izrade maritimne studije za rekonstrukciju operativne obale Sv. Bernardin u luci Krk (0552)			5.250,00	0,00	0,00
Nabava usluge geotehničkih istražnih radova za potrebe izrade glavnog projekta rekonstrukcije operativne obale Sv. Bernardin u luci Krk (0552)			10.000,00	0,00	0,00
LUKA BAŠKA					
Rekonstrukcija luke Baška – III. faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri okomita gata na njega					
Radovi na rekonstrukciji luke Baška – III. faza (05131)		671.000,00	671.000,00	562.080,00	562.077,05
Usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji luke Baška – III. faza (05531)		5.365,00	5.365,00	5.365,00	5.364,57
Usluge koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova - rekonstrukcija luke Baška – III. faza (05531)		2.903,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00

Usluge projektantskog nadzora nad radovima na rekonstrukciji luke Baška – III. faza (05532)		5.410,00	5.376,00	5.376,00	5.375,14
Radovi na izradi sidrenog sustava na rekonstrukciji luke Baška – III. faza (05131)		176.000,00	225.762,00	225.762,00	225.721,57
Priključak struje za III. fazu rekonstrukcije luke Baška		13.538,00	10.000,00	10.000,00	9.863,86
Hidrografska izmjera nakon izvođenja radova (0552)	5.309,00		0,00	0,00	0,00
Izrada geodetskog elaborata evidentiranja zgrada i drugih građevina i Izjava ovlaštenog inženjera geodezije – III. faza (0552)	531,00		1.625,00	1.625,00	1.625,00
Usluge stručnog nadzora nad radovima na izradi sidrenog sustava plovila (05531)	5.500,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00
Hidrantski ormarić sa opremom za III. fazu (05131)			5.370,00	2.294,00	2.293,75
Priključak vode za rekonstrukciju luke Baška – III. faza				4.521,00	4.520,95
Rekonstrukcija luke Baška – IV. Faza – izgradnja gata ispred Stare rive te gata „T“ tlocrta u akvatoriju između Garofulina i Stare rive – I. ugovor					
Nabava radova na rekonstrukciji luke Baška – IV. faza – I. ugovor (05131)	5.000,00	5.000,00	200.000,00	215.725,00	4.806,15
Usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji luke Baška – IV. faza – od 2023. godine (05531)		625,00	625,00	625,00	625,00
Usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji luke Baška – IV. faza (05531)			9.645,00	2.950,00	0,00
Usluge koordinatora za radove na rekonstrukciji luke Baška – IV. faza (05531)			1.625,00	1.000,00	0,00
Usluge projektantskog nadzora nad radovima na rekonstrukciji luke Baška – IV. faza (05532)			3.216,00	1.500,00	0,00
Nabava usluge izmjene glavnog i izvedbenog projekta na rekonstrukciji luke Baška – IV. faza (0552)			4.750,00	4.750,00	0,00

Nabava usluge izrade geodetske podloge za potrebe izrade izmjene glavnog projekta na rekonstrukciji luke Baška – IV. faza (0552)			375,00	625,00	375,00
Nabava usluge izrade izmjene idejnog projekta na rekonstrukciji luke Baška za potrebe IV. faza (0552)				1.875,00	1.875,00
Nabava radova za pojačanje ormarića za hidrantsku opremu na rekonstrukciji luke Baška – IV. faza (05231)				3.250,00	3.250,00
Nabava usluge izrade projektne dokumentacije - prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara za potrebe rekonstrukcije luke Baška - IV. faza (0552)				750,00	0,00
Nabava usluge izrade projekta sidrenog sustava plovila za rekonstrukciju luke Baška - IV. faza (0552)			4.125,00	4.125,00	4.112,50
Rekonstrukcija luke Baška – IV. Faza – izgradnja gata ispred Stare rive te gata „T“ tlocrta u akvatoriju između Garofulina i Stare rive – II. ugovor					
Nabava radova na rekonstrukciji luke Baška – IV. faza – II. ugovor (05131)				1.000,00	0,00
EU fondovi – Dogradnja luke Baška – I. i II. faza					
Radovi na Dogradnji luke Baška – I. i II. Faza (05141)			8.575,00	8.575,00	0,00
Priključak vode na Dogradnji luke Baška – I. i II. faza (05148)		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.835,53
Nabava radova za pojačanje ormarića za hidrantsku opremu na Maloj rivi u luci Baška (II. faza Dogradnje luke Baška EU projekt) - 05148			3.250,00	0,00	0,00
Nabava i montaža kućice u luci Baška					
Nabava i montaža kućice za potrebe lučkog redara u luci Baška (05134)	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Nabava radova za uređenje podloge za postavljanje kućice u luci Baška (05131)			10.000,00	10.000,00	0,00

LUKA VRBNIK					
EU Projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik – faza L1					
Studija izvodljivosti za pripremu projekta Rekonstrukcije luke Vrbnik - Faza L1 i L2 na natječaj zaštita lučkog akvatorija i izgradnja komunalnih vezova (0552)		27.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
Usluge izrade prilagodbe troškovnika za luku Vrbnik, faza L1 i L2 prema naputcima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (0552)				250,00	250,00
EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik – radovi (05161)			500,00	500,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu (05163)			300,00	300,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - projektantski nadzor (05164)			200,00	200,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - voditelj projekta (05165)			200,00	200,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - administrativno vođenje projekta (neprihvatljivi trošak) - 05166			200,00	200,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - promidžba i vidljivost (05167)			200,00	200,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija luke Vrbnik - neprihvatljivi troškovi (05168)			100,00	100,00	0,00
LUKA OMIŠALJ					
Plutajući ponton (prvi) u luci Omišalj (Pesja)					
Izrada elektro, vodovodne instalacije do pontona, dobava kabela i cijevi za instalaciju struje i vode te dobava i montaža energetske ormarića (4 kom) (05131)	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
Nabava i montaža plutajućeg pontona (drugi) u luci Omišalj (Pesja)					

Usluge izrade glavnog projekta za nabavu i montažu plutajućeg pontona u luci Omišalj (0552)		7.963,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
Usluge izrade geodetske podloge za nabavu i montažu plutajućeg pontona u luci Omišalj (0552)		2.256,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Usluge hidroarheološkog istraživanja za potrebe postavljanja pontona u luci Omišalj (0552)		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Nabava radova na nabavi i montaži plutajućeg pontona u luci Omišalj (05131)	195.500,00		195.500,00	1.000,00	0,00
Usluge stručnog nadzora za radove na nabavi i montaži plutajućeg pontona u luci Omišalj (05531)	5.900,00		5.900,00	0,00	0,00
Usluge projektantskog nadzora za radove na nabavi i montaži plutajućeg pontona u luci Omišalj (05532)	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
Usluge koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova za radove na nabavi i montaži plutajućeg pontona u luci Omišalj (05531)	3.850,00		3.850,00	0,00	0,00
Hidrografska izmjera, geodetski snimak izvedenog stanja i izjava ovlaštenog inženjera geodezije na nabavi i montaži plutajućeg pontona u luci Omišalj (0552)	450,00		450,00	0,00	0,00
Upravna pristojba za uporabnu dozvolu za drugi plutajući ponton u luci Omišalj (0552)	200,00		0,00	0,00	0,00
Uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice u luci Omišalj (Pesja)					
Izrada glavnog projekta uređenja obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice u luci Omišalj (0552)		13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.271,25
Revizija glavnog projekta za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice u luci Omišalj (0552)		2.000,00	2.000,00	1.875,00	1.875,00

Usluge ažuriranja maritimne studije za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice u luci Omišalj (0552)		4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
Usluge izrade elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice u luci Omišalj (0552)		3.315,00	4.375,00	4.375,00	3.937,50
Nabava usluge izrade izvedbenog projekta za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice u luci Omišalj (05531)	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00
Usluge revizije izvedbenog projekta za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice u luci Omišalj (0552)	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
Usluge arheoloških podvodnih radova na uređenju obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice (0552)	3.315,00		3.315,00	0,00	0,00
Nabava radova na uređenju obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice u luci Omišalj (05131)	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
Usluge stručnog nadzora za radove na uređenju obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice (građevinski, elektro nadzor, geotehnički nadzor) u luci Omišalj (05531)	4.650,00		4.650,00	0,00	0,00
Usluge projektantskog nadzora za radove na uređenju obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice u luci Omišalj (05532)	2.325,00		2.325,00	0,00	0,00
Usluge koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova za radove na uređenju obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice (05531)	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00

Upravna pristojba za UD za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice u luci Omišalj (0552)	350,00		0,00	0,00	0,00
LUKA OMIŠALJ – BAZEN LUČICA					
Rekonstrukcija bazena Lučica					
Izrada idejnog rješenja i vjetrovalne studije s numeričkim modelom deformacije valova za rekonstrukciju bazena Lučica (0552)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
Usluge geodetske podloge za izradu idejnog rješenja za rekonstrukciju luke Omišalj - bazen Lučica (0552)				2.940,00	2.937,50
LUKA MALINSKA					
Rekonstrukcija i dogradnja primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza u luci Malinska					
Glavni projekt i vođenje postupka ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju primarnog lukobrana i dogradnju sekundarnog lukobrana - I faza u luci Malinska (0552)		46.287,00	46.287,00	46.287,00	0,00
Revizija glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju primarnog lukobrana i dogradnju sekundarnog lukobrana - I faza u luci Malinska (0552)		6.626,00	6.626,00	6.626,00	6.625,00
Nabava radova na rekonstrukciji luke Malinska - rekonstrukcija i dogradnja primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana - I faza (05131)	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
Plutajući ponton za ribare u luci Malinska					
Usluge izrade geodetske podloge za potrebe izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za		2.500,00	2.500,00	625,00	625,00

dobavu i montažu plutajućeg pontona za ribare u luci Malinska (0552)					
Nabava i montaža pristupne pasarele na plutajući ponton za ribare u luci Malinska (05131)			9.115,00	9.000,00	9.000,00
Usluge izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za dobavu i montažu plutajućeg pontona za ribare u luci Malinska (0552)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Usluge izrade projekta sidrenja za plutajući ponton za ribare u luci Malinska (0552)		4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
Usluge izrade maritimne studije za postavu plutajućeg pontona za ribare u luci Malinska (0552)			5.250,00	5.250,00	5.250,00
Pregled elaborata sidrenja gata i plovila u luci Malinska za plutajući ponton za ribare - Hrvatski registar brodova (0552)				338,00	337,50
Rekonstrukcija obalnog zida u luci Malinska					
Nabava radova na rekonstrukciji obalnog zida prema Jazu u luci Malinska (05131)	10.000,00		150.000,00	1.000,00	0,00
Usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji obalnog zida prema Jazu u luci Malinska (05531)	1.000,00		5.000,00	0,00	0,00
Usluge projektantskog nadzora za radove na rekonstrukciji obalnog zida prema Jazu u luci Malinska (05532)	500,00		1.000,00	0,00	0,00
Usluge koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova za radove na rekonstrukciji obalnog zida prema Jazu u luci Malinska (05531)	500,00		1.350,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija luke Malinska – II. faza					
Usluge izrade glavnog projekta za rekonstrukciju luke Malinska – II. faza (plutajući gatovi, uklanjanje postojećeg prilaznog fiksnog gata,			19.375,00	0,00	0,00

sidreni sustav plovila, elektro instalacije, hidro instalacije, elaborat zaštite od požara i obavezni geodetski prilozi) - 0552					
LUKA PORAT					
I faza – 3. uporabna cjelina (valobran) u luci Porat					
Usluge izrade izmjene idejnog projekta rekonstrukcije luke Porat (0552)		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Usluge geodetskih radova za izradu izmjene i dopune idejnog projekta te za ishođenje izmjene i dopune lokacijske dozvole Rekonstrukcije luke Porat (0552)				625,00	0,00
Usluge izrade izmjene glavnog projekta (0552)	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00
Upravna pristojba za izmjenu lokacijske dozvole (0552)	1.200,00		0,00	0,00	0,00
Geodetski elaborat za provedbu lokacijske dozvole za rekonstrukciju luke Porat (0552)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Usluge izrade ažuriranja maritimne studije rekonstrukciju luke Porat (0552)		4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
Upravna pristojba za izmjenu građevinske dozvole (0552)	350,00		0,00	0,00	0,00
Usluge izrade izvedbenog projekta rekonstrukcije luke Porat - I. faza - 3. uporabna cjelina - nabava i montaža valobrana (0552)	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
Usluge revizije izvedbenog projekta rekonstrukcije luke Porat - I. faza - 3. uporabna cjelina - nabava i montaža valobrana (0552)	1.875,00		1.875,00	0,00	0,00
Geodetski elaborat za formiranje čestice luka Porat za I. fazu (0552)		750,00	750,00	750,00	0,00

LUKA ŠILO					
Rekonstrukcija luke Šilo					
Izrada Elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za rekonstrukciju luke Šilo (0552)	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
Geotehnički istražni radovi za potrebe izrade glavnog projekta za rekonstrukciju luke Šilo (0552)	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
Maritimna studija za rekonstrukciju bazena za rekonstrukciju luke Šilo (0552)	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
Izrada geodezija za potrebe izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju luke Šilo (0552)	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju luke Šilo (elektro projekt, projekt vode, elaborat mjera zaštite od požara, troškovnik) (0552)	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
Nabava i montaža plutajućeg pontonskog gata za brzobrodsku liniju u luci Šilo					
Geodetska podloga za potrebe izrade idejnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole za dobavu i montažu plutajućeg pontonskog gata za pristanište brzobrodске linije (0552)	2.500,00		2.500,00	1.375,00	1.375,00
Usluga izrade maritimne studije za dobavu i montažu plutajućeg pontona u luci Šilo (0552)			4.750,00	4.750,00	4.750,00
Usluga izrade idejnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole za dobavu i montažu plutajućeg pontonskog gata za pristanište brzobrodске linije (0552)	5.000,00		6.250,00	6.225,00	6.225,00

Usluga izrade projekta sidrenog sustava plovila za plutajući pontonski gat za pristanište brzobrodske linije (0552)	4.375,00		4.375,00	0,00	0,00
Upravna pristojba za lokacijsku dozvolu za dobavu i montažu plutajućeg pontonskog gata za pristanište brzobrodske linije (0552)	150,00		0,00	0,00	0,00
Radovi na nabavi i montaži plutajućeg pontonskog gata za pristanište brzobrodske linije (05131)	31.250,00		31.250,00	1.000,00	0,00
Usluge stručnog nadzora za montažu plutajućeg pontonskog gata za pristanište brzobrodske linije (05531)	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
Usluge projektantskog nadzora za montažu plutajućeg pontonskog gata za pristanište brzobrodske linije (05532)	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
Usluge koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova za montažu plutajućeg pontonskog gata za pristanište brzobrodske linije (05531)	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
Hidrografska izmjera, geodetski snimak izvedenog stanja i izjava ovlaštenog inženjera geodezije za montažu plutajućeg pontonskog gata za pristanište brzobrodske linije (0552)	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
Upravna pristojba za uporabnu dozvolu za montažu plutajućeg pontonskog gata za pristanište brzobrodske linije (0552)	150,00		0,00	0,00	0,00
LUKA STARA BAŠKA					
Rekonstrukcija luke Stara Baška					
Izrada idejnog rješenja i vjetrovalne studije s numeričkim modelom	13.750,00		13.750,00	13.750,00	0,00

deformacije valova za rekonstrukcije luke Stara Baška (0552)					
Usluge izrade geodetske podloge za izradu idejnog rješenja za rekonstrukciju luke Stara Baška (0552)				2.600,00	2.562,50
LUKA PUNAT					
Rekonstrukcija i dogradnja dva gata na području Vele vode u luci Punat					
Usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije - dogradnja dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)		13.604,00	13.500,00	13.500,00	12.825,00
Revizija glavnog projekta rekonstrukcije - dogradnja dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)		3.318,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
Usluge izrade maritimne studije za rekonstrukciju i dogradnju dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)			5.250,00	5.250,00	5.250,00
Usluge izrade elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za rekonstrukciju i dogradnju dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)		1.325,00	1.325,00	2.320,00	2.318,75
Usluga izrade izvedbenog projekta rekonstrukcije – dogradnje dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)	7.466,00		7.466,00	7.466,00	0,00
Usluge revizije izvedbenog projekta rekonstrukcije – dogradnje dva gata na području Vele vode u luci Punat (0552)	2.489,00		2.489,00	0,00	0,00
Nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji dva gata na području Vele vode u luci Punat (05131)	10.000,00		10.000,00	1.000,00	0,00

Usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji i dogradnji dva gata na području Vele vode u luci Punat (05531)	500,00		500,00	0,00	0,00
Usluge projektantskog nadzora nad radovima na rekonstrukciji i dogradnji dva gata na području Vele vode u luci Punat (05532)	200,00		200,00	0,00	0,00
Usluge koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova za radove na rekonstrukciji i dogradnji dva gata na području Vele vode u luci Punat (05531)	200,00		200,00	0,00	0,00
Nabava i montaža plutajućeg pontonskog gata u luci Punat					
Hidrografska izmjera, geodetski snimak izvedenog stanja i izjava ovlaštenog inženjera geodezije na dobavi i montaži plutajućeg pontona u luci Punat (0552)	450,00		450,00	0,00	0,00
Usluga izrade geodetske podloge za potrebe izrade idejnog projekta i ishoda lokacijske dozvole za plutajući ponton u luci Punat (0552)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Usluga izrade maritimne studije za dobavu i montažu plutajućeg pontona u luci Punat (0552)		4.750,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
Usluge izrade idejnog projekta za dobavu i montažu plutajućeg pontona u luci Punat (0552)		8.000,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
Usluge izrade elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za postavljanje plutajućeg pontona u luci Punat (0552)				665,00	662,51
Radovi na pripremljenoj instalaciji za budući plutajući ponton u luci Punat (05131)					3.020,75

Radovi na nabavi i montaži plutajućeg pontona u luci Punat (05131)	80.000,00		80.000,00	1.000,00	0,00
Usluge stručnog nadzora na montaži plutajućeg pontona u luci Punat (05531)	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00
Upravna pristojba za uporabnu dozvolu na dobavi i montaži plutajućeg pontona u luci Punat (0552)	200,00		0,00	0,00	0,00
Uređenje obalnog pojasa na području od gata K do hotela Falkensteiner u luci Punat					
Nabava usluge izrade geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole za uređenje obalnog pojasa na području od gata K do hotela Falkensteiner u luci Punat (0552)	2.700,00		3.250,00	3.250,00	0,00
Izrada Elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za uređenje obalnog pojasa na području od gata K do hotela Falkensteiner u luci Punat (0552)	3.150,00		3.150,00	0,00	0,00
Geotehnički istražni radovi za potrebe izrade glavnog projekta za uređenje obalnog pojasa na području od gata K do hotela Falkensteiner u luci Punat (0552)	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
Maritimna studija za uređenje obalnog pojasa na području od gata K do hotela Falkensteiner u luci Punat (0552)	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
Nabava usluge izrade glavnog projekta za uređenje obalnog pojasa na području od gata K do hotela Falkensteiner u luci Punat (elektro projekt, projekt vode, elaborat mjera zaštite od požara, troškovnik) (0552)	25.000,00		29.000,00	28.750,00	0,00
Revizija glavnog projekta za uređenje obalnog pojasa na području od gata K	5.500,00		3.125,00	0,00	0,00


do hotela Falkensteiner u luci Punat (0552)					
Nabava usluge izrade projekta sidrenog sustava plovila za uređenje obalnog pojasa na području od gata K do hotela Falkensteiner u luci Punat (0552)			4.375,00	0,00	0,00
Upravna pristojba za građevinsku dozvolu za uređenje obalnog pojasa na području od gata K do hotela Falkensteiner u luci Punat (0552)	1.000,00		0,00	0,00	0,00
LUKA VELA JANA					
Rekonstrukcija luke Vela Jana					
Usluga revizije glavnog projekta za rekonstrukciju luke Vela Jana (0552)			2.450,00	2.450,00	2.450,00
Nabava usluge izrade geodetskih radova za potrebe izrade glavnog projekta rekonstrukcije luke Vela Jana (0552)			4.350,00	4.350,00	4.350,00
Usluge izvedbenog projekta rekonstrukcije luke Vela Jana (0552)	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
Radovi na rekonstrukciji luke Vela Jana (05131)	284.500,00		284.500,00	0,00	0,00
Usluge stručnog nadzora na rekonstrukciji luke Vela Jana (05531)	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
Usluge koordinatora zaštite na radu na rekonstrukciji luke Vela Jana (05531)	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
Usluge projektantskog nadzora za radove na rekonstrukciji luke Vela Jana (05532)	4.500,00		4.500,00	0,00	0,00
LUKA SVETA FUSKA					
Rekonstrukcija luke Sveta Fuska					
Izrada idejnog rješenja i vjetrovalne studije s numeričkim modelom	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00

deformacije valova za rekonstrukcije luke Sveta Fуска (0552)					
Nabava i montaža dizalice u luci Sveta Fуска					
Atestiranje dizalice i izdavanje dozvole za rad dizalice u luci Sveta Fуска (0552)		625,00	625,00	625,00	625,00
LUKA VALBISKA					
Izrada natkrivenog prostora za prijem vozila Hitne pomoći u luci Valbiska					
Usluge geodetskih radova za izmjeru izvedenog stanja nadstrešnice na terenu i izjavu OIG (0552)			500,00	500,00	500,00
Nabava i postavljanje prijenosne kućice u luci Valbiska					
Nabava radova za uređenje podloge za postavljanje kućice u luci Valbiska (05131)			5.660,00	5.660,00	5.658,13
Nabava i montaža kućice u luci Valbiska (05134)			15.625,00	15.500,00	15.500,00
LUKA ČIŽIĆI					
Dogradnja primarnog lukobrana u luci Čižići					
Usluge izrade Idejnog rješenja za dogradnju primarnog lukobrana u luci Čižići			6.125,00	0,00	0,00
LUKA VOZ					
Rekonstrukcija operativnog gata u luci Voz					
Priprema poslovnog plana za javljanje na natječaj Ministarstva poljoprivrede, Uprava za ribarstvo za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (0552)		16.590,00	16.590,00	16.590,00	0,00
Usluge izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz (0552)		11.116,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Usluge revizije izvedbenog projekta za sanaciju operativnog gata u luci Voz (0552)		2.489,00	2.489,00	1.500,00	1.500,00
LUKE NA PODRUČJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK					
Komunalna oprema					
Komunalna oprema na lučkom području – „pametni“ ormarići za struju; nabava i montaža New Jersey ograde u luci Valbiska; nabava i montaža inox ograde u luci Šilo; modernizacija lučkog svjetla u luci Klimno; ograda na kuli lučkog svjetla u luci Klimno; betonske klupice i betonski stol u luci Vela Jana; dobava i montaža kamenih klupica na operativnom gatu u luci Glavotok; rampa u luci Valbiska; rampa u luci Sveta Fuska; nabava i montaža rasvjetnih stupova u luci Lokvišća (5 komada); dobava, doprema i ugradnja ormarića s opremom hidrantskih ormarića na gatu Garofulin u luci Baška; dobava, doprema i ugradnja ormarića s opremom za hidrantske ormariće u luci Porat; izrada i montaža nadstrešnice uz objekt u luci Valbiska; izrada spremišta i skladištenje lanaca u luci Omišalj; inox ograda za 3. fazu rekonstrukcije luke Baška; izrada, dostava i ugradnja gazišta skalica za 3. fazu rekonstrukcije luke Baška; kolica za izvlačenje barki sa sajlom u luci Baška (2 komada) (05231)	53.070,00	26.425,00	65.430,00	58.642,00	55.571,19
Skladišta, silosi, garaže i sl.					
Brodski kontejneri za skladište u luci Valbiska (05134)	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00

Sustav video nadzora					
Sustav video nadzora (05224)	1.000,00		1.000,00	6.000,00	3.311,25
Ostala projektna dokumentacija					
Ostala projektna dokumentacija (0552)	6.636,00		6.636,00	6.636,00	0,00
Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata					
Vodni doprinos po građevinskim dozvolama (Krk, Voz, Punat i Malinska) – (05541)	2.655,00		2.655,00	2.655,00	2.351,53

Luka	Ostvareni iznos ulaganja u 2024. godini	Udio
Krk	289.159,82	20,37%
Baška	858.846,07	60,51%
Omišalj	29.208,75	2,06%
Omišalj – bazen	2.937,50	0,21%
Porat	6.250,00	0,44%
Voz	12.500,00	0,88%
Punat	44.277,01	3,12%
Malinska	31.212,50	2,20%
Vela Jana	6.800,00	0,48%
Stara Baška	2.562,50	0,18%
Sveta Fuska	625,00	0,04%
Šilo	12.350,00	0,87%
Vrbnik	31.500,00	2,22%
Valbiska	21.658,13	1,53%
Luke na području ŽLU Krk - ostalo	69.483,97	4,90%
UKUPNO	1.419.371,25	

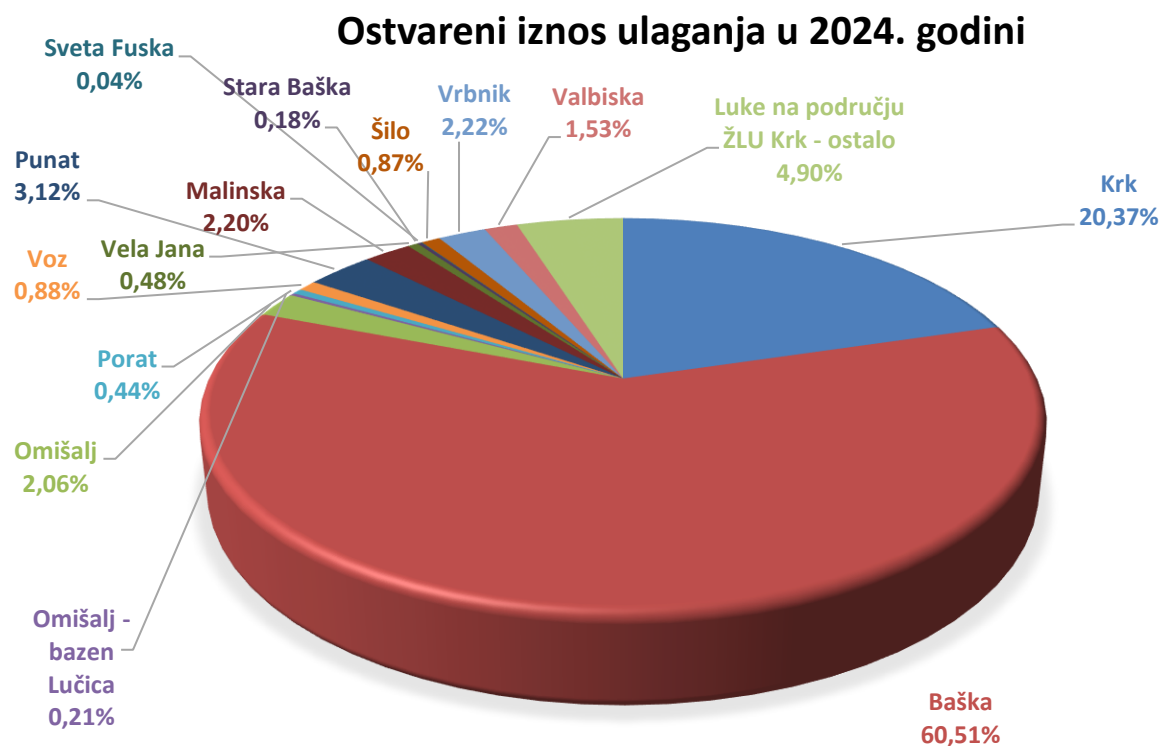

PLAN ULAGANJA:

1. LUKA: BAŠKA

- *OPIS LUKE:*

Luka Baška je luka otvorena za javni promet županijskog značaja. Sastoji se od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, komunalnog dijela luke te sidrišta u funkciji nautičkog dijela luke za privez brodica.

Luka ima:

- 🚧 područje za dizanje i spuštanje u more plovniha objekata dizalicom
- 🚧 područje za dizanje i spuštanje u more plovniha objekata istezalištem.
- 🚧 mjesta za opskrbu električnom energijom
- 🚧 mjesta za opskrbu pitkom vodom
- 🚧 jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- 🚧 jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

1.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

1.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke Baška – III. Faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri okomita gata na njega**

Opis projekta: Gat Garofulin planira se na nivou hodne površine proširiti - dograditi i to cijeli uži dio gata do nekadašnje obalo utvrde na glavi gata („garofulina“), sa sadašnje širine od oko 1,5 m na novu ukupnu širinu od oko 2,5 m. Predviđa se sa zapadne strane gata izvesti uz postojeći gat plitko temeljene armirano-betonske utvrde, te ih povezati preko armature s postojećom betonskom konstrukcijom gata. Ukupna dužina dijela gata Garofulin koja se proširuje iznosi (mjereno sa zapadne strane) 87,12 m. Gat Garofulin povezan je na postojeći obalni zid, a kojeg se predviđa rekonstruirati zasebnim projektom u sklopu uređenja obalnog pojasa naselja Baška, stoga je potrebno u korijenu izvesti novi obalni zid koji će odgovarati predviđenom zidu iz projekta uređenja obalnog pojasa.

Okomito na dograđeni (prošireni) gat Garofulin izvesti će se tri pravocrtna gata, dužine svaki po 74,0 m.

Plovila će se privezivati na gatove 1, 2 i 3 s obje strane, u četverovez. Direktno za privez plovila na Garofulinu koristiti će se samo njegova istočna strana

Cilj projekta: Rekonstrukcija luke – III. Faza – proširenje gata Garofulin te izgradnja tri okomita gata na njega poduzima se u svrhu izgradnje novih vezova u luci Baška.





Provedba projekta: Projekt Rekonstrukcija luke Baška - III. Faza obuhvatio je proširenje gata Garofulin te izgradnju tri okomita gata na njega, a radovi su započeli u 2023. godini i završeni 2024. godine. U 2024. godini izvršeni su i radovi na izradi sidrenog sustava za ovu fazu. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i ishodišne Uporabne dozvole, projekt je stavljen u uporabu u 2024. godine.

Za provedbu projekta provedeni su sljedeći postupci te su potpisani ugovori s izvođačima radova i usluga:

- ✚ Nakon provedenog postupka javne nabave radi odabira izvođača radova, sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi radova s tvrtkom BSK Commerce d.o.o. iz Rijeke. Ugovor je potpisan 11. svibnja 2023. godine u iznosu od 1.095.399,58 eura bez PDV-a, odnosno 1.369.249,48 eura s PDV-om. Rok za izvođenje svih radova je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao;
- ✚ S tvrtkom Karloline – Kling d.o.o. iz Liča sklopljen je Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji luke Baška – III. faza. Ugovor je potpisan 15. svibnja 2023. godine u iznosu od 25.750,00 eura bez PDV-a, odnosno 32.187,50 eura s PDV-om, na temelju provedenog postupka jednostavne nabave u 2023. godini;
- ✚ Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za pružanje usluga koordinatora zaštite na radu i usluge izrade plana izvođenja radova nad radovima na rekonstrukciji luke Baška – III. faza, sklopljen je ugovor s tvrtkom TIM d.o.o. iz Rijeke. Ugovor je potpisan 29. kolovoza 2023. godine u iznosu od 3.000,00 eura bez PDV-a, odnosno 3.750,00 eura s PDV-om;

- ✚ Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za uslugu projektantskog nadzora građenja nad radovima na rekonstrukciji luke Baška – III. faza, sklopljen je ugovor s tvrtkom Marecon d.o.o. iz Rijeke. Ugovor je potpisan u iznosu od 8.600,00 eura bez PDV-a, odnosno 10.750,00 s PDV-om;
- ✚ Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi radova na izradi i ugradnji sidrenog sustava plovila za rekonstrukciju luke Baška – III. faza s tvrtkom BSK Commerce d.o.o. iz Rijeke. Ugovor je potpisan 4. ožujka 2024. godine u iznosu od 140.609,00 eura bez PDV-a, odnosno 175.761,25 eura s PDV-om. Također, sklopljen je Dodatak I. ugovora, koji je potpisan 10. lipnja 2024. godine za povećanje vrijednosti ugovora na 180.609,00 eura bez PDV-a, odnosno 225.761,25 eura s PDV-om. Rok za izvođenje radova je 3 mjeseca od dana uvođenja u posao;
- ✚ Ugovor o nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na izradi i ugradnji sidrenog sustava plovila na rekonstrukciji luke Baška – III. faza sklopljen je s tvrtkom Karloline – Kling d.o.o. iz Liča nakon provedenog postupka jednostavne nabave. Ugovor je potpisan 28. veljače 2024. godine u iznosu od 4.200,00 eura bez PDV-a, odnosno 5.250,00 s PDV-om;
- ✚ Tehnički pregled obavljen je 20. lipnja 2024. godine, te je 09. srpnja 2024. godine izdana Uporabna dozvola za rekonstrukciju luke Baška – III. faza, koja uključuje proširenje gata Garofulin i izgradnju tri gata okomito na njega. S danom 09. srpnja 2024. godine Uporabna dozvola je postala pravomoćna.

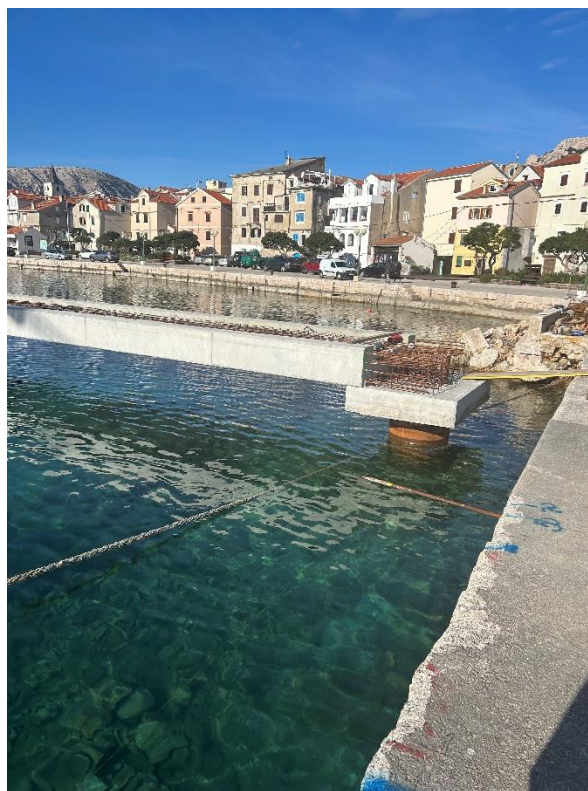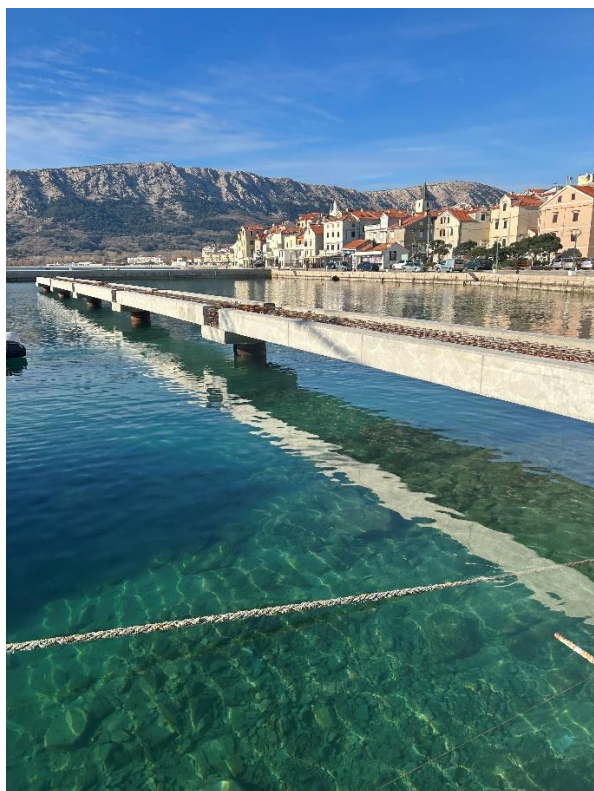

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za 2024. godinu projekta Rekonstrukcija luke Baška – III. faza ostvareni su u iznosu od 823.966,89 eura, što predstavlja 99,98% planiranog iznosa od 824.148,00 eura za radove, usluge i opremu. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- ✚ rashodi za radove na Rekonstrukciji luke Baška – III. faza ostvareni su u iznosu od 562.077,05 eura, što predstavlja 100% planiranog iznosa od 562.080,00,00 eura
- ✚ rashodi za usluge stručnog nadzora nad radovima na Rekonstrukciji luke Baška – III. faza ostvareni su u iznosu od 5.364,57 eura, što predstavlja 99,99% planiranog iznosa od 5.365,00 eura
- ✚ rashodi za usluge koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova - Rekonstrukcija luke Baška – III. faza ostvareni su u iznosu od 1.875,00 eura, što predstavlja 100% planiranog iznosa od 1.875,00 eura
- ✚ rashodi za usluge projektantskog nadzora nad radovima na Rekonstrukciji luke Baška – III. faza ostvareni su u iznosu od 5.375,14 eura, što predstavlja 99,98% planiranog iznosa od 5.376,00 eura
- ✚ rashodi za radove na izradi sidrenog sustava na Rekonstrukciji luke Baška – III. faza ostvareni su u iznosu od 225.721,57 eura, što predstavlja 99,98% planiranog iznosa od 225.762,00 eura
- ✚ rashode za priključak struje za III. fazu Rekonstrukcije luke Baška ostvareni su u iznosu od 9.863,86 eura, što predstavlja 98,64% planiranog iznosa od 10.000,00 eura
- ✚ rashodi za usluge izrade geodetskog elaborata evidentiranja zgrada i drugih građevina i Izjava ovlaštenog inženjera geodezije – III. faza ostvareni su u iznosu od 1.625,00 eura, što predstavlja 100% planiranog iznosa od 1.625,00 eura
- ✚ rashodi za usluge stručnog nadzora nad radovima na izradi sidrenog sustava plovila ostvareni su u iznosu od 5.250,00 eura, što predstavlja 100% planiranog iznosa od 5.250,00 eura
- ✚ rashodi za usluge nabavke i montaže hidrantskog ormarića sa opremom za III. fazu ostvareni su u iznosu od 2.293,75 eura, što predstavlja 99,99% planiranog iznosa od 2.294,00 eura
- ✚ rashodi za priključak vode za Rekonstrukciju luke Baška za III. fazu ostvareni su u iznosu od 4.520,95, što predstavlja 100% planiranog iznosa od 4.521,00 eura.

U 2024. godini izvršena su sufinanciranja projekta temeljem sklopljenih ugovora, kao što je navedeno u planu prihoda, za sljedeće:

- ✚ Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje radova na Rekonstrukciji luke Baška – III faza u iznosu od 436.040,20 eura
- ✚ Primorsko-goranska županija za sufinanciranje radova na izradi sidrenog sustava u iznosu od 120.000,00 eura.

Ukupna ostvarena sredstva u 2024. godini za projekt Rekonstrukcija luke Baška – III. faza iznose 823.966,89 eura, od čega sufinanciranje Ministarstva, mora, prometa i infrastrukture iznosi 436.040,20 eura, sufinanciranje Primorsko-goranske županije 120.000,00 eura, a preostala sredstva je osigurala Županijska lučka uprava Krk u iznosu od 267.926,69 eura.

Stavljanje projekta u uporabu: Projekt Rekonstrukcija luke Baška započeo je 2014. godine izradom idejnog projekta, temeljem kojeg je ishodovana Lokacijska dozvola u 2015. godini. Planirano je izvođenje radova u četiri faze, a izrađena je projektna dokumentacija na temelju koje su ishodovane građevinske dozvole. Građevinska dozvola za Rekonstrukciju luke Baška – III. faza dobivena je 5. lipnja 2017. godine, te je postala pravomoćna 30. lipnja 2017. godine. Radovi na izgradnji predmetne faze započeli su 2023. godine te su završeni 2024. godine. U sklopu navedene faze izvršeni su radovi na izradi sidrenog sustava. Obavljenim tehničkim pregledom građevine i dobivenom Uporabnom dozvolom u 2024. godini, projekt je stavljen u uporabu.

Rashodi projekta stavljenog u uporabu, kao i sufinanciranja, sljedeći su:


Rekonstrukcija luke Baška – III. faza

Rashodi	Iznos (u EUR)	Struktura
Radovi	1.228.783,38	89,34%
Usluge	92.055,61	6,69%
Oprema	54.550,44	3,97%
UKUPNO	1.375.389,43	

Izvori su/financiranja projekta su sljedeći:

Izvor sredstava	Iznos (u EUR)	Struktura
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1.134.331,72	82,47%
Županijska lučka uprava Krk	241.057,71	17,53%
UKUPNO	1.375.389,43	

Izvori su/financiranja projekta

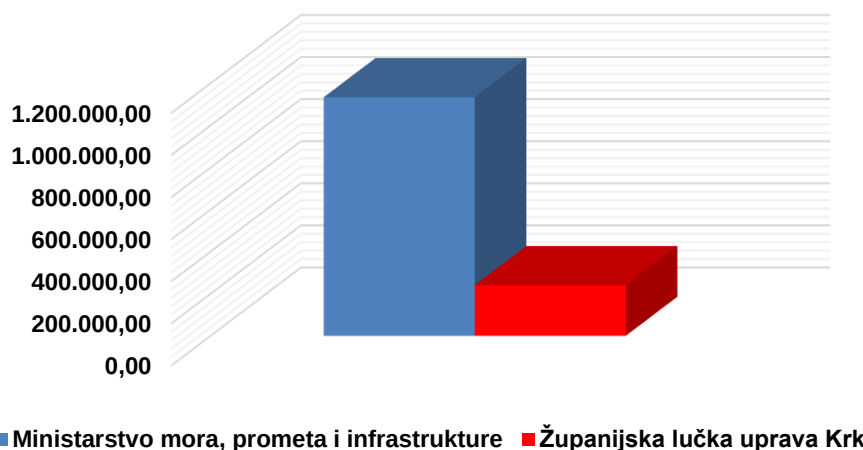

 Rekonstrukcija luke Baška – III. faza – sidreni sustav

Rashodi	Iznos (u EUR)	Struktura
Radovi	225.721,57	95,91%
Usluge	9.625,00	4,09%
UKUPNO	235.346,57	

Izvori su/financiranja projekta su sljedeći:

Izvor sredstava	Iznos (u EUR)	Struktura
Primorsko-goranska županija	120.000,00	50,99%
Županijska lučka uprava Krk	115.346,57	49,01%
UKUPNO	235.346,57	

Izvori su/financiranja projekta



U poslovnim knjigama Županijske lučke uprave Krk vrijednost imovine je sljedeća:

- Rekonstrukcija luke Baška – III. faza – 1.324.441,99 eura
- Rekonstrukcija luke Baška – III. faza – sidreni sustav – 235.346,57 eura
- Oprema – 50.947,44 eura.

1.1.2. Naziv projekta: Rekonstrukcija luke Baška – IV. Faza – izgradnja gata ispred Stare rive te gata „T“ tlocrta u akvatoriju između Garofulina i Stare rive – I. ugovor

Opis projekta: Projektom Rekonstrukcija luke – IV. faza planira se izgradnja gata (5) ispred Stare rive, te gata „T“ tlocrta u akvatoriju između Garofulina i Stare rive (Gat 4) u luci Baška.

Gat (4)

Prvi dio gata (4) je okomit na obalni zid na koji se oslanja i dužine je 28,00 m, širine 2,50 m. U nastavku na glavi ima dva okomita kraka sa obje strane, a dužine su, onaj sa sjeverne strane dug je 32,50 m, a s južne strane 30,00 m, ukupna dužina ovog okomitog dijela je 65,00 m, a širina je 2,50 m. Gat je planiran kao fiksna raščlanjena konstrukcija, duboko temeljena na armirano-betonskim „Bennotto“ pilotima. Rasponska se konstrukcija izvodi većinom od prefabriciranih prednapetih armirano-betonskih nosača.

Gat (5)

Nastavlja se na postojeću glavu Stare rive. Dužine je 72,95 m i širine 2,50 m. Gat je planiran kao fiksna raščlanjena konstrukcija, duboko temeljena na armirano-betonskim „Bennotto“ pilotima. Rasponska se konstrukcija izvodi većinom od prefabriciranih prednapetih armirano-betonskih nosača.

Gatovi (4) i (5) će se opremiti mornarskim stepenicama i anelima.

Cilj projekta: Svrha ovog projekta je izgradnja novih komunalnih i nautičkih vezova u luci Baška.

Provedba projekta: U 2024. godini na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave, Županijska lučka uprava Krk sklopila je Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom BSK commerce d.o.o. iz Rijeke, za razdoblje od 3 (tri) godine. Ukupna vrijednost radova iznosi 904.445,47 eura bez PDV-a, odnosno 1.130.556,84 eura s PDV-om.

Na temelju uvjeta iz Okvirnog sporazuma sklopiti će se ugovor o javnoj nabavi radova za 3 (tri) građevinske cjeline izvođenja radova:

-  I. Ugovor o javnoj nabavi radova do kraja 2024. godine za dio radova I. GAT 4 i to A. Građevinski radovi, Grupa radova 1. Pripremni radovi i 3. Bušeni betonski piloti u vrijednosti do 18,64 % cijene radova odnosno 168.580,00 eura bez PDV-a, te 210.725,00 eura s PDV-om, sukladno osiguranim sredstvima u 2024. godini,
-  II. Ugovor o javnoj nabavi radova za 2025. godinu za dio radova I. GAT 4 i to A. Građevinski radovi, Grupa radova 2. Betonski i armirano betonski radovi i 4.

Razni radovi i oprema, B. Sidreni sustav, C. Elektroinstalacije, D. Hidroinstalacije i E. Utvrdica Garofulin u vrijednosti do 33,75 % cijene radova odnosno 305.252,15 eura bez PDV-a, te 381.565,19 eura s PDV-om, sukladno osiguranim sredstvima za 2025. godinu,

- ✚ III. Ugovor o javnoj nabavi radova za dio 2026. godine za radove II. GAT 5 i to A. Građevinski radovi, B. Sidreni sustav, C. Elektroinstalacije i D. Hidroinstalacije u vrijednosti do 47,61 % cijene radova odnosno 430.613,32 eura bez PDV-a, te 538.266,65 eura s PDV-om, sukladno osiguranim sredstvima za 2026. godinu.

Rok izvođenja radova evidentira se upisom u Građevinski dnevnik i iznosi:

- ✚ I. Ugovor o javnoj nabavi u 2024. godini - od dana uvođenja u posao do 31.12.2024. godine
- ✚ II. Ugovor o javnoj nabavi za 2025. godinu – od dana uvođenja u posao u roku od 4 (četiri) mjeseca
- ✚ III. Ugovor o javnoj nabavi u 2026. godini – od dana uvođenja u posao u roku od 6 (šest) mjeseci.

Za provedbu projekta provedeni su sljedeći postupci te su potpisani ugovori s izvođačima radova i usluga:

- ✚ Ugovor o javnoj nabavi radova za rekonstrukciju luke Baška – IV. faza – I. građevinska cjelina sklopljen je 2024. godine u iznosu od 168.580,00 eura bez PDV-a, odnosno 210.725,00 eura s PDV-om. Rok izvođenja radova je 31. prosinca 2024. godine;
- ✚ Ugovor o usluzi stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji luke Baška – IV. faza sklopljen je s tvrtkom Karloline – Kling d.o.o. iz Liča, nakon provedenog postupka jednostavne nabave. Potpisan je 29. studenog 2024. godine, u iznosu od 25.900,00 eura bez PDV-a, odnosno 32.375,00 eura s PDV-om, za cijeli projekt IV. faze. Rok izvođenja usluge je 11 mjeseci;
- ✚ Ugovor o usluzi projektantskog nadzora nad radovima na rekonstrukciji luke Baška – IV. faza sklopljen je s tvrtkom Marecon d.o.o. iz Rijeke, nakon provedenog postupka jednostavne nabave. Potpisan je 25. studenog 2024. godine, u iznosu od 13.200,00 eura bez PDV-a, odnosno 16.500,00 eura s PDV-om, za cijeli projekt IV. faze. Rok izvođenja usluge je 11 mjeseci.



Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za projekt Rekonstrukcija luke Baška – IV. faza – I. faza u 2024. godini, koji obuhvaćaju radove, usluge i opremu, iznose 15.043,65 eura, što čini 6,34% od planiranog iznosa od 237.175,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- ✚ radovi na Rekonstrukciji luke Baška – IV. faza – I. faza ostvareni su u iznosu od 4.806,15 eura prema ugovoru iz 2023. godine za koji su planirana sredstva od 5.000,00 eura. Rashodi za radove prema I. ugovoru okvirnog sporazuma nisu izvršeni u 2024. godini, a planirani iznos tih radova iznosi 210.725,00 eura
- ✚ usluge stručnog nadzora za radove na Rekonstrukciji luke Baška – IV. faza ostvarene su u iznosu 625,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 625,00 eura (ugovor iz 2023. godine)
- ✚ usluge izrade geodetske podloge za potrebe izrade izmjene glavnog projekta na Rekonstrukciji luke Baška – IV. faza ostvarene su u iznosu od 375,00 eura, što predstavlja 60,00% planiranog iznosa od 625,00 eura
- ✚ usluge izrade izmjene idejnog projekta na Rekonstrukciji luke Baška – IV. faza ostvarene su u iznosu od 1.875,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.875,00 eura
- ✚ usluge izrade projekta sidrenog sustava plovila na Rekonstrukciji luke Baška – IV. faza ostvarene su u iznosu od 4.112,50 eura, što predstavlja 99,70% planiranog iznosa od 4.125,00 eura

- ✚ radovi na pojačanju ormarića za hidrantsku opremu na Rekonstrukciji luke Baška – IV. faza ostvareni su u iznosu od 3.250,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 3.250,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeće stavke:

- ✚ usluge stručnog nadzora za radove na Rekonstrukciji luke Baška – IV. faza – I. ugovor u iznosu od 2.950,00 eura
- ✚ usluge koordinatora za radove na Rekonstrukciji luke Baška – IV. faza – I. ugovor u iznosu od 1.000,00 eura
- ✚ usluge projektantskog nadzora nad radovima na Rekonstrukciji luke Baška – IV. faza – I. ugovor u iznosu od 1.500,00 eura
- ✚ usluge izmjene glavnog i izvedbenog projekta na Rekonstrukciji luke Baška – IV. faza u iznosu od 4.750,00 eura
- ✚ usluge izrade projektne dokumentacije – prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara za potrebe Rekonstrukcije luke Baška – IV. faza u iznosu od 750,00 eura.

II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu planirano je sufinanciranje radova od Općine Baška prema potpisanom ugovoru, kao što je navedeno u planu prihoda.

Ukupna planirana sredstva u 2024. godini za navedeni projekt iznose 237.175,00 eura, od čega sufinanciranje Općine Baška iznosi 100.000,00 eura, dok preostala sredstva osigurava Županijska lučka uprava Krk u iznosu od 137.175,00 eura. Do kraja 2024. godine ostvarena su sredstva u iznosu od 15.043,65 eura, dok će neizvršeni rashodi za radove i usluge, kao i preostalo sufinanciranje, biti planirati u izmjeni financijskog plana za 2025. godinu.

1.1.3. Naziv projekta: Rekonstrukcija luke Baška – IV. Faza – izgradnja gata ispred Stare rive te gata „T“ tlocrta u akvatoriju između Garofulina i Stare rive – II. ugovor

Opis projekta: Projektom Rekonstrukcija luke Baška – IV. Faza planira se izgradnja gata (5) ispred Stare rive, te gata „T“ tlocrta u akvatoriju između Garofulina i Stare rive (Gat 4) u luci Baška.

Gat (4)

Prvi dio gata (4) je okomit na obalni zid na koji se oslanja i dužine je 28,00 m, širine 2,50 m. U nastavku na glavi ima dva okomita kraka sa obje strane, a dužine su, onaj sa sjeverne strane dug je 32,50 m, a s južne strane 30,00 m, ukupna dužina ovog okomitog dijela je 65,00 m, a širina je 2,50 m. Gat je planiran kao fiksna raščlanjena konstrukcija, duboko

temeljena na armirano-betonskim „Bennotto“ pilotima. Rasponska se konstrukcija izvodi većinom od prefabriciranih prednapetih armirano-betonskih nosača.

Gat (5)

Nastavlja se na postojeću glavu Stare rive. Dužine je 72,95 m i širine 2,50 m. Gat je planiran kao fiksna raščlanjena konstrukcija, duboko temeljena na armirano-betonskim „Bennotto“ pilotima. Rasponska se konstrukcija izvodi većinom od prefabriciranih prednapetih armirano-betonskih nosača.

Gatovi (4) i (5) će se opremiti mornarskim stepenicama i anelima.

Nakon sklopljenog I. Ugovora o javnoj nabavi radova za 2024. godinu planira se pokrenuti postupak za sklapanje II. Ugovora o javnoj nabavi radova za 2025. godinu koji obuhvaća dio radova I. GAT 4 i to A. Građevinski radovi, Grupa radova 2. Betonski i armirano betonski radovi i 4. Razni radovi i oprema, B. Sidreni sustav, C. Elektroinstalacije, D. Hidroinstalacije i E. Utvrdica Garofulin u vrijednosti do 33,75 % cijene radova odnosno 305.252,15 EUR bez PDV-a, te 381.565,19 eura s PDV-om, sukladno osiguranim sredstvima za 2025. godinu.

Cilj projekta: Svrha ovog projekta je izgradnja novih komunalnih i nautičkih vezova u luci Baška.

Vrijednost projekta: II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu planirani su rashodi za početak postupka sklapanja II. Ugovora o javnoj nabavi, koji je sklopljen početkom 2025. godine. Ovi rashodi nisu ostvareni do kraja 2024. godine i odnose se na sljedeću stavku:

-  nabava radova na Rekonstrukciji luke Baška – IV. faza – II. ugovor u iznosu od 1.000,00 eura.

Preostala sredstva za izvršenje navedenog ugovora, kao i sredstva za usluge, planirana su u Financijskom planu za 2025. godinu, kada je planirano izvođenje radova.

1.1.4. Naziv projekta: **EU fondovi – Dogradnja luke Baška – I. i II. faza**

Opis projekta: Projektom Dogradnja luke Baška - I. Faza (Vela riva) i II. Faza (Mala riva) obuhvaćeno je:

-  I. faza – produženje primarnog lukobrana - Vela riva. Primarni lukobran produžen je za cca 50,00 m', a izveden je tlocrtno zakrivljenog oblika i prati približno oblik postojećeg lukobrana te ima proširenu glavu na koju je postavljeno novo lučko

svjetlo. Izveden je kao nasuti lukobran što podrazumijeva masivni betonski zid na temeljnom nasipu s unutarnje strane te kamena obalozaštita – školjera s vanjske strane. Primarni lukobrana je obložen kamenim poklopnica i obložnicama te je opremljen bitvama, mornarskim stepenicama, ormarićima za napajanje plovila strujom i vodom i hidrantom.

- II. faza – produženje sekundarnog lukobrana - Mala riva. Sekundarni lukobran – Mala riva produžila se u dužini od 105,00 m' i širine 6,00 m' što znači da je novi dio Male rive uži od starog dijela i tlocrtno je zakrivljenog oblika. Novi dio sekundarnog lukobran izveo se kao rasčlanjena konstrukcija, dubinski temeljena na „Benotto“ pilotima, djelomično propustan radi cirkulacije mora unutar luke, s valobranim ekranima. Produžetak sekundarnog lukobrana završno je obložen kamenim poklopnica i obložnicama te je opremljen lučkim svjetlom, bitvama, mornarskim stepenicama, ormarićima za napajanje plovila strujom i vodom i hidrantom.

Cilj projekta: Dogradnja luke Baške – I. i II. Faza – obzirom da je luka Baška bila nesigurna luka i nezaštićena od vjetrova i valova, projektom zaštitit će se akvatorij luke.



**DOGRADNJA
LUKE BAŠKA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDovi**



Europska unija
Zajedno do
fondova EU

Provedba projekta: Za investiciju rekonstrukcija i dogradnja luke Baška I. (dogradnja primarnog lukobrana Vela riva) i II. faza (produženje sekundarnog lukobrana Mala riva) potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020, KK.07.4.1.04.0010 - Dogradnja luke Baška sklopljen je dana 9. rujna 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 41.166.298,55 kuna, a prethodno navedenim Ugovorom ŽLU KRK su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 39.709.975,94 kuna, odnosno u cijelosti su pokriveni pozivom definirani prihvatljivi troškovi.

Izvori financiranja su: 85% iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa) i 15% iz državnog proračuna.

Za provedbu projekta provedeni su sljedeći postupci te su potpisani ugovori s izvođačima radova i usluga:

- U mjesecu prosincu 2019. godini pokrenut je postupak jednostavne nabave za usluge administrativnog vođenja projekta dogradnje luke Baška, a početkom 2020. godine je sklopljen ugovor sa tvrtkom Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 118.000,00 kn bez PDV-a (15.661,29 eura), odnosno 147.500,00 kn (19.576,61 eura) sa PDV-om;

- ✚ Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za uslugu provedbe promotivne kampanje u 2020. godini sklopljen je ugovor s tvrtkom TRI i d.o.o. iz Punat u iznosu 109.510,00 kn (14.534,47 eura) bez PDV-a, odnosno 136.887,50 kn (18.168,09 eura) s PDV-om;
- ✚ Nakon provedenog postupka javne nabave radi odabira izvođača radova potpisan je ugovor za radove na dogradnji luke Baška s Zajednicom ponuditelja Aqua Mont Service d.o.o. iz Beograda i Aqua Mont Service d.o.o. za usluge iz Splita. Ugovor je potpisan dana 22. listopada 2020. godine u iznosu 26.600.000,00 kn (3.530.426,70 eura) bez PDV-a, odnosno 33.250.000,00 kn (4.413.033,38 eura) s PDV-om. Rok za izvođenje svih radova je 18 mjeseci od dana uvođenja u posao, te je očekivani rok dovršetka 01.01.2023. godine. Dodatkom 1. Ugovora o javnoj nabavi radova na dogradnji luke Baška sklopljenog dana 28. veljače 2022. godine promijenjena je tehnologija izvođenja radova te je izmijenjena cijena radova koja ukupno iznosi 26.593.542,20 kuna (3.529.569,61 eura) bez PDV-a odnosno 33.241.927,70 kuna (4.411.962,00 eura) s PDV-om. Dodatkom 2. Ugovora sklopljenog 16. kolovoza 2022. godine ugovoreni su dodatni radovi te je izmijenjena cijena radova koja ukupno iznosi 26.823.108,26 kuna (3.560.038,26 eura) bez PDV-a odnosno 33.528.885,32 kuna (4.450.047,82 eura) s PDV-om. Dodatkom 3. Ugovora sklopljenog dana 20. prosinca 2022. godine uveo se novi podugovaratelj. Dodatkom 4. Ugovora sklopljenog dana 06. veljače 2023. godine ugovoreni su dodatni radovi koji nisu predviđeni projektnom dokumentacijom i ponudbeno-ugovornim troškovnikom te rok za izvođenje radova zbog dodatno ugovorenih radova. Dodatkom 5. Ugovora sklopljenog dana 15. veljače 2023. godine mijenja se rok za izvođenje radova zbog neizvođenja radova tijekom vremenskih neprilika;
- ✚ Ugovor o javnoj nabavi usluga vođenja građevinskog dijela projekta na projektu „Dogradnja luke Baška“ sklopljen je s tvrtkom KARLOLINE-KLING d.o.o. u iznosu 195.000,00 kn (25.880,95 eura) bez PDV-a, odnosno 243.750,00 kn (32.351,18 eura) s PDV-om, sklopljen na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave u 2020. godini;
- ✚ Ugovor o javnoj nabavi usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja sklopljen je s Zajednicom ponuditelja: IG d.o.o. iz Labina, Marecon d.o.o. i TIM d.o.o. iz Rijeke. Iznos ugovorenih usluga je 608.000,00 kn (80.695,47 eura) bez PDV-a, odnosno 760.000,00 kn (100.869,33 eura) s PDV-om sklopljen na temelju provedenog postupka javne nabave u 2020. godini;
- ✚ Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za uslugu projektantskog nadzora građenja sklopljen je ugovor s tvrtkom Marecon d.o.o. iz Rijeke u iznosu 178.000,00 kn (23.624,66 eura) bez PDV-a, odnosno 222.500,00 kn (29.530,82 eura) s PDV-om u 2020. godini.

U travnju 2023. godine je obavljen tehnički pregled te su u svibnju 2023. godine dobivene uporabne dozvole:

- ✚ Rekonstrukciju luke Baška I. faza – produženje primarnog lukobrana „Vela riva“ prema Građevinskoj dozvoli izdanoj dana 13.03.2017. godine i Izmjeni i dopuni građevinske dozvole izdane dana 03.03.2020. godine
- ✚ Rekonstrukciju luke Baška, II. faza – produženje sekundarnog lukobrana „Mala riva“ prema Građevinskoj dozvoli izdanoj dana 01.06.2017. godine i Izmjeni i dopuni građevinske dozvole izdane dana 03.03.2020. godine.

Nakon završetka projekta Primorsko-goranska županija je provela otvoreni postupak javne nabave za usluge prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj liniji Baška-Lopar-Baška. Odabrana je ponuda gospodarskog subjekta Explorer j.d.o.o. iz Baške. Ugovor za usluge prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj liniji Baška-Lopar-Baška potpisan je 12. srpnja 2024. godine. Uspostava nove linije odnosi se za razdoblje od šest godina s ciljem bolje pomorske povezanosti između Općine Baška i Općine Lopar. Ugovoreni iznos sufinanciranja je 490.000,00 eura, od čega Primorsko-goranska županija pokriva 55% iznosa, Općina Baška 30%, a Općina Lopar 15% ukupnih troškova održavanja linije. Linija Baška-Lopar-Baška predstavlja županijsku liniju ukupne duljine 8,5 NM koja spaja luku Bašku na otoku Krku i luku Lopar na otoku Rabu. Linija je cjelogodišnja uz jednu liniju tjedno u izvansezonskom razdoblju, dvije linije tjedno u međusezonskom razdoblju te četiri linije tjedno u ljetnom, odnosno sezonskom razdoblju.



Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za 2024. godinu projekta Rekonstrukcija luke Baška – I. i II. faza ostvareni su u iznosu od 1.835,53 eura, što predstavlja 17,61% planiranog iznosa. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

- ✚ priključak vode za I. i II. fazu u iznosu od 1.835,53 eura, što predstavlja 99,22% planiranih sredstava od 1.850,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeću stavku:

- ✚ radovi na Dogradnji luke Baška – I. i II. faza (za okončanu situaciju) u iznosu od 8.575,00 eura

Izvođač radova je ispostavio okončanu situaciju koja nije ovjerena i prihvaćena od strane nadzornog inženjera. Okončana situacija je obračunata u iznosu izvršenih radova uvećana za iznos razlike u cijeni. Zbog neprihvatanja okončanog obračuna izvođač radova je podnio prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave na koju je podnesen prigovor od strane Županijske lučke uprave Krk. Rješenje o ovrsi rješenjem Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku stavljeno je izvan snage. Postupak će se nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnog naloga. Također, očekuje se da Općinski sud izjavi nenadležnost i predmet dostavi na postupanje Trgovačkom sudu..

Ostvaren je povrat bespovratnih sredstava za projekt „Dogradnja luke Baška“ u iznosu od 9.148,18 eura. Prema Odluci o povratu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture završni ZNS iznosi 6.581,12 eura, a Ispravak statusa projekta iznosi 15.726,72 eura koji se odnosi na dio stavki troškovnika koje su neprihvatljive. Prema navedenom Županijska lučka uprava Krk je izvršila povrat sredstava u iznosu od 9.148,18 eura, kao što je navedeno i obrazloženo u ostvarenju prihoda.

Stavljanje projekta u uporabu: Projekt Rekonstrukcija luke Baška započeo je 2014. godine izradom idejnog projekta, temeljem kojeg je ishodovana Lokacijska dozvola u 2015. godini. Planirano je izvođenje radova u četiri faze, te je izrađena projektna dokumentacija na temelju koje su ishodovane građevinske dozvole. Građevinska dozvola za Rekonstrukciju luke Baška – I. faza dobivena je 13. ožujka 2017. godine, te je postala pravomoćna 08. travnja 2017. godine. Građevinska dozvola za Rekonstrukciju luke Baška – II. faza dobivena je 01. lipnja 2017. godine, te je postala pravomoćna 29. lipnja 2017. godine. Radovi na izgradnji predmetne faze započeli su 2020. godine te su završeni 2023. godine. Obavljenim tehničkim pregledom građevine dobivene su uporabne dozvole u 2023. godini, te je projekt stavljen u uporabu u 2024. godini.

Rashodi projekta stavljenog u uporabu, kao i sufinanciranja, sljedeći su:


Rashodi	Iznos (u EUR)	Struktura
Radovi	3.671.991,55	87,48%
Usluge	415.884,43	9,91%
Oprema	109.547,52	2,61%
UKUPNO	4.197.423,50	

Izvor sredstava	Iznos (u EUR)	Struktura
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Europski fondovi	3.937.830,60	93,82%
Županijska lučka uprava Krk	259.592,90	6,18%
UKUPNO	4.197.423,50	

U poslovnim knjigama Županijske lučke uprave Krk vrijednost imovine je sljedeća:

- Rekonstrukcija luke Baška – I. i II. faza – 4.087.875,98 eura
- Oprema – 109.547,52 eura.

Izvori su/financiranja projekta

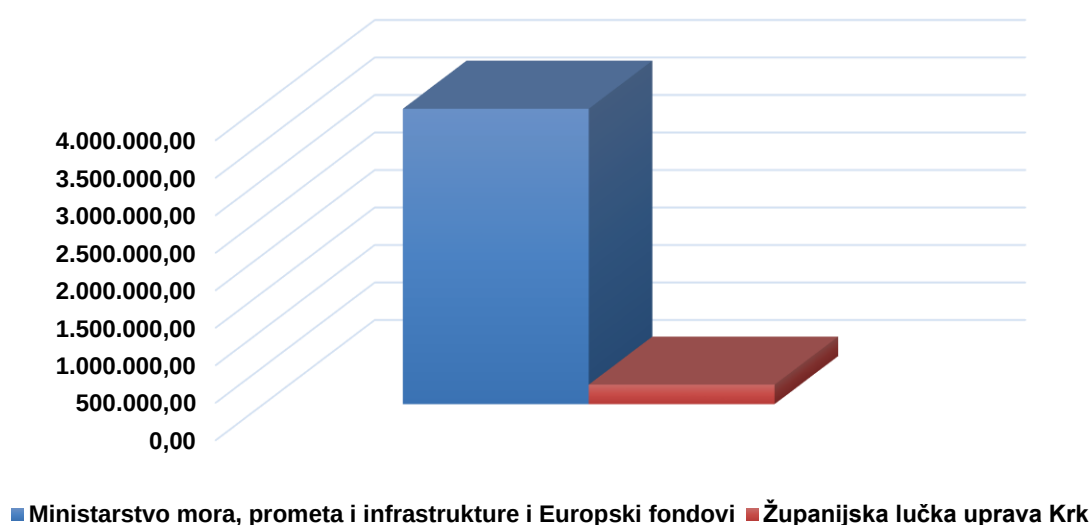

1.1.5. Naziv projekta: **Nabava i montaža kućice u luci Baška**

Opis projekta: Ovim projektom planira se nabava montažne kućice u luci Baška. Montažna kućica je veličine do 12 m².

Cilj projekta: Montažna kućica u luci Baška nabavlja se radi boljih i sigurnijih uvjeta rada lučkog redara te za kvalitetnije pružanja usluge u luci.

Vrijednost projekta: Ostvarenje planiranih sredstava za sanaciju za 2024. godinu iznosi 18.000,00 eura, što predstavlja 64,29% planiranog iznosa od 28.000,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

- + nabava i montaža kućice za potrebe lučkog redara u iznosu od 18.000,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 18.000,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeću stavku:

- + nabava radova za uređenje podloge za postavljanje kućice u iznosu od 10.000,00 eura.

Navedeni neizvršeni radovi planirat će se u izmjeni financijskog plana za 2025. godinu.

1.2. TEKUĆE ULAGANJE:

1.2.1. Naziv ulaganja: **Radovi na uređenju korijena gata Garofulin u luci Baška**

Opis: Ovom sanacijom planira se uređenje korijena gata Garofulin na način da je predviđeno uklanjanje krupnog kamena i manji iskop, poravnanje iskopa kamenim agregatom frakcije 31,5/63 mm, čišćenje betona od algi, bušenje ankera, betoniranje nove obloge postojećeg gata u širini od oko 50 cm, do razine dna visine postojećeg zidića, kako bi se zidić mogao koristiti kao klupa i kad se sjedi okrenut s pogledom prema smjeru Vele plaže. U moru ispred nožice zida složio bi se dio kamena iz iskopa radi zaštita temelja od podlokavanja.

Cilj: Uređenje korijena gata Garofulin u luci Baška poduzima se u svrhu održavanja i sigurnosti u luci.

Vrijednost: Ostvarenje planiranih rashoda za sanaciju u 2024. godinu iznosi 18.074,77 eura, što predstavlja 98,77% od planiranih sredstava u iznosu od 18.300,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- + usluge izrade izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom, u iznosu od 1.250,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.250,00 eura
- + radovi na uređenju korijena gata Garofulin u luci Baška ostvareni su u iznosu od 16.024,77 eura, što predstavlja 98,61% planiranog iznosa od 16.250,00 eura
- + usluge stručnog nadzora za radove na uređenju korijena gata Garofulin u luci Baška ostvarene su u iznosu od 800,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 800,00 eura.

1.2.2. Naziv ulaganja: **Radovi na sanaciji trajektne rampe i obalnog zida mula na Veloj rivi u luci Baška**

Opis: Ovom sanacijom planira se uređenje trajektne rampe i obalnog zida mula na Veloj rivi u luci Baška.

Cilj: Uređenje trajektne rampe i obalnog zida mula na Veloj rivi poduzima se u svrhu održavanja i sigurnosti u luci.

Vrijednost: Ostvarenje planiranih sredstava za sanaciju za 2024. godinu iznosi 2.375,00 eura, što čini 100% planiranih sredstava od 2.375,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

- + nabava radova na sanaciji trajektne rampe i obalnog zida mula na Veloj rivi u luci Baška u iznosu od 2.375,00 eura.

2. LUKA: KRK

- *OPIS LUKE:*

Luka Krk je luka otvorena za javni promet županijskog značaja. Sastoji se od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja tereta, komunalnog dijela luke, nautičkog dijela luke za privez te sidrišta u funkciji nautičkog dijela luke za privez brodica.


Luka ima:

- ✚ područje za dizanje i spuštanje u more plovniha objekata istezalištem.
- ✚ mjesta za opskrbu električnom energijom
- ✚ mjesta za opskrbu pitkom vodom
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

2.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

2.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke Krk**

Opis projekta: I. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu planirana je izmjena i dopuna idejnog projekta Rekonstrukcije luke Krk, kao i provedba upravnog postupka za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole u vezi s izmjenom Uporabne cjeline I – primarni lukobran. Međutim, II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu nisu planirana sredstva za provedbu, budući da nije bila potrebna dodatna izmjena, te sredstva nisu ostvarena u 2024. godini.

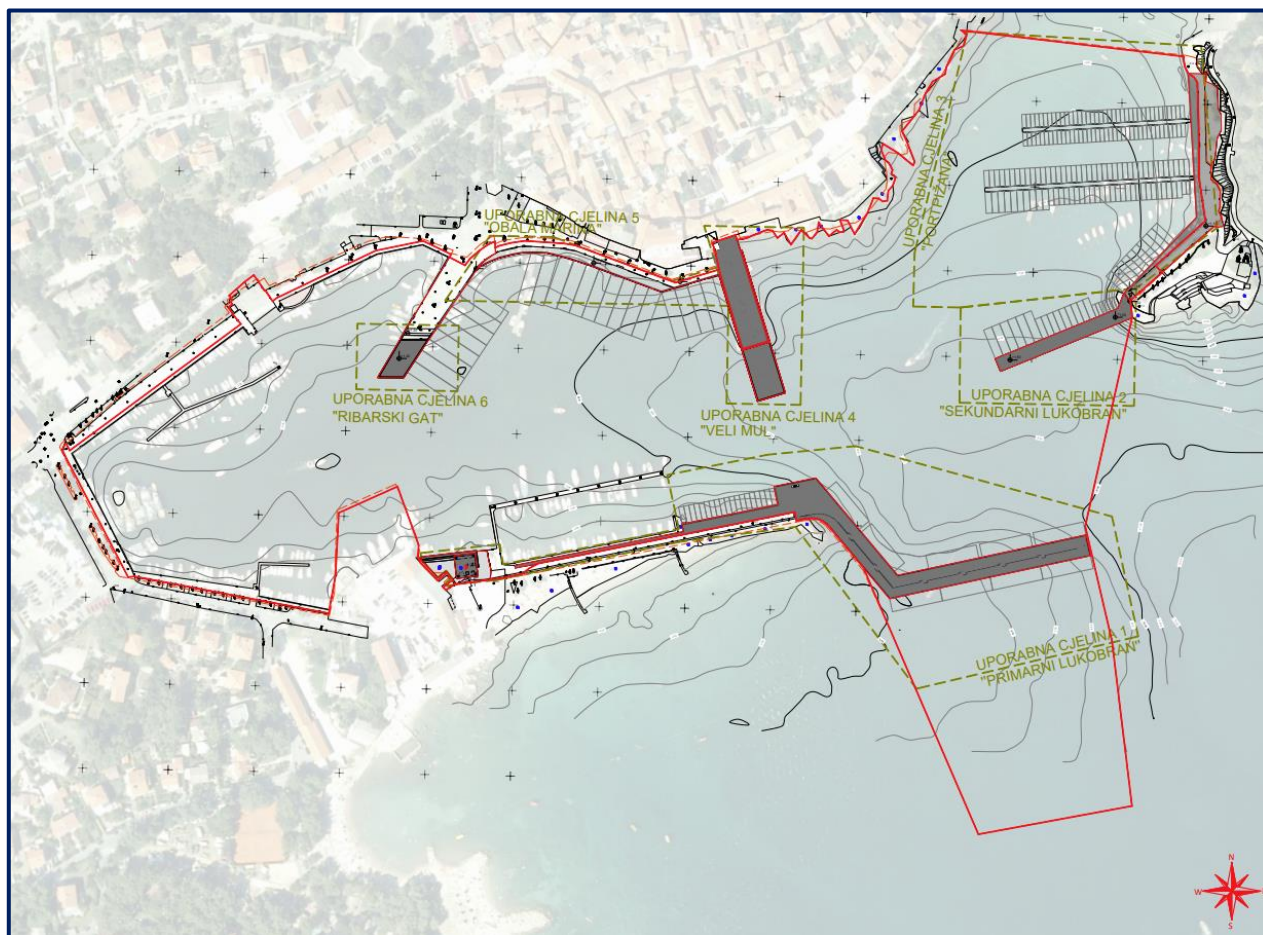

Vrijednost projekta: II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu nisu planirani rashodi predviđeni prethodnom izmjenom plana u iznosu od 3.440,00 eura, zbog čega sredstva nisu ostvarena u 2024. godini.

2.1.2. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke – primarni lukobran – Uporabna cjelina 1**

Opis projekta: Projektom se planira produženje postojećeg primarnog lukobrana te će njegova ukupna dužina iznositi 195,70 m, a tlocrtno nije u pravcu već je razlomljen pod kutom od 118° i time podijeljen na dva dijela. Širina gata u prvom dijelu (na spoju s postojećim lukobranom) je 22,0 m, a ostali dio je širine 12,0 m. Za gat je definirana projektna dubina od -5,00 m, a kota vrha obalnog zida, odnosno partera lukobrana iznosi +1,50 m n.m.

Konstrukcija gata sastoji se od dva masivna betonska obalna zida, između kojih se izrađuje nasip od čistog kamenog materijala. Konstrukcija obale je gravitacijskog tipa izrađena od kalupnog betona na licu mjestu. Radi omogućavanja strujanja mora, lukobran će biti opremljen s četiri otvora koji se nalaze na međusobnoj udaljenosti od cca 40,0 m. Na taj način omogućiti će se protok vode kroz lukobran, odnosno izmjena vode unutar luke, što je vrlo važno za prirodno održanje biljnih i životinjskih zajednica. Lukobran će se

obložiti kamenom te opremiti polerima, mornarskim stepenicama, anelima, ormarićima za napajanje plovila strujom i vodom, hidrantom te polupodzemnim spremnicima za zbrinjavanje otpada.



Cilj projekta: Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 1 – primarni lukobran poduzima se u svrhu bolje zaštite lučkog akvatorija, osiguranja komunalnih i nautičkih vezova, te sigurnog mjesta za privez plovila.

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za Rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 1 – primarni lukobran u 2024. godini iznose 35.162,50 eura, što predstavlja 69,75% planiranog iznosa od 50.415,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- + usluge izrade studije izvodljivosti za natječaj MMPI za investicije za zaštitu lučkog akvatorija i izgradnju komunalnih vezova - Rekonstrukcija luke Krk u iznosu od 26.250,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 26.250,00 eura
- + usluge pripreme Prijavnog obrasca, pripreme dokumentacije, kompletiranja prijave i unos u sustav za prijavu projekata Rekonstrukcija luke Krk za prijavu na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 3.250,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 3.250,00 eura
- + upravna pristojba za izmjenu građevinske dozvole Rekonstrukcija luke Krk - Uporabna cjelina 1 - primarni lukobran u iznosu od 1.600,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.600,00 eura
- + usluge izrade prilagodbe troškovnika za Rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 1 – primarni lukobran u iznosu od 2.565,00 eura, što predstavlja 99,90% planiranog iznosa od 2.562,50 eura

- ✚ usluge 3D vizualizacije gatova za Rekonstrukciju luke Krk - Uporabna cjelina 3 - gatovi Portapizzana (izrada modela i renderiranje) u iznosu od 1.500,00 eura, što predstavlja 300% planiranog iznosa od 500,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeću stavku:

- ✚ usluge izrade projekta sidrenog sustava plovila Uporabna cjelina 1 i Uporabna cjelina 2 u iznosu od 16.250,00 eura.

Navedene neizvršene usluge planirat će se u izmjeni financijskog plana za 2025. godinu.

2.1.3. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke – sekundarni lukobran – Uporabna cjelina 2**

Opis projekta: Projektom se planira izgraditi betonski sekundarni lukobran, dužine 83,00 m s vanjske strane i 77,00 m s unutrašnje strane, širine 8,00 m, kote partera lukobrana + 1,50 m.n.m., a projektirane dubine uz obalni zid -5,00 m. Lukobran će se obložiti kamenom te opremiti mornarskim stepenicama, bitvama, anelima, lučkim svjetlom, rasvjetnim stupovima, ormarićima za opskrbu strujom i vodom te hidrantom. Za potrebe temeljne infrastrukture izvesti će se s vanjske i s unutrašnje strane energetski kanal u sklopu serklaža obalnog zida opremljen cijevima za provlačenje instalacija. U sredini poprečnog presjeka sekundarnog lukobrana izvesti će se valobrani zid za sprečavanje prelijevanja mora, dok će se radi omogućavanja strujanja mora unutar uvale Portapižana sekundarni lukobran opremiti s dva otvora na trećinama dužine lukobrana. Na taj način omogućiti će se protok vode kroz lukobran, odnosno izmjena vode unutar uvale, što je vrlo važno za prirodno održanje biljnih i životinjskih zajednica.

Cilj projekta: Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran poduzima se u svrhu zaštite lučkog akvatorija luke otvorene za javni promet županijskog značaja luke Krk od južnih valova te će se time omogućiti sigurnost priveza postojećih brodica kao i izgradnja novih komunalnih vezova u uvali Portapižana.



Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za Rekonstrukciju luke Krk – sekundarni lukobran – Uporabna cjelina 2 u 2024. godini iznose 47.487,50 eura, što predstavlja 73,90% od planiranog iznosa od 64.258,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- + usluge izrade izvedbenog projekta Rekonstrukcije luke Krk – Uporabna cjelina 2 - sekundarni lukobran u iznosu od 44.800,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 44.800,00 eura
- + usluge izrade prilagodbe troškovnika za Rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran u iznosu od 2.187,50 eura, što predstavlja 99,89% planiranog iznosa od 2.190,00 eura
- + usluge 3D vizualizacije lukobrana za Rekonstrukciju luke Krk - Uporabna cjelina 2 - sekundarni lukobran (izrada modela i renderiranje) u iznosu od 500,00 eura, što predstavlja 100% planiranog iznosa od 500,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeće stavke:

- + usluge izrade izmjene glavnog projekta Rekonstrukcije luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran u iznosu od 13.450,00 eura
- + usluge revizije izvedbenog projekta Rekonstrukcije luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran u iznosu od 3.318,00 eura.

Navedene neizvršene usluge planirat će se u izmjeni financijskog plana za 2025. godinu.

U 2024. godini izvršeno je sufinanciranje usluge izrade izvedbenog projekta Rekonstrukcije luke Krk – Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran na temelju sklopljenog ugovora o


sufinanciranju s Primorsko-goranskom županijom u iznosu od 35.000,00 eura. Navedeno sufinanciranje obrazloženo je u ostvarenju prihoda.

Ukupna ostvarena sredstva u 2024. godini za projekt Rekonstrukcija luke Krk – sekundarni lukobran – Uporabna cjelina 2 iznose 47.487,50 eura, od čega sufinanciranje Primorsko-goranske županije iznosi 35.000,00 eura, a preostala sredstva je osigurala Županijska lučka uprava Krk u iznosu od 12.487,50 eura.

U sljedećem tabelarnom prikazu su izvori sredstava po projektu ostvarenih u 2024. godini.

Izvor sredstava	Iznos (u EUR)	Struktura
Primorsko-goranska županija	35.000,00	93,82%
Županijska lučka uprava Krk	12.487,50	6,18%
UKUPNO	47.487,50	

Izvori su/financiranja projekta



2.1.4. Naziv projekta: Rekonstrukcija luke – Portapižana – Uporabna cjelina 3

Opis projekta: Ovim projektom planira se rekonstrukcija obalnog zida, uređenje obalnog platoa u pozadini te dobava i montaža dva plutajuća pontona u uvali Portapižana. Plutajući pontoni biti će sastavljeni od montažnih elemenata, međusobno privezanih te se sidre lancima i sidrenim blokovima i biti će dužine 96 m i do 120 m, širine 2,00 – 4,00 m i visine 1,00 m koji se spajaju na novu obalu visine + 1,20 m.n.m, a sa kopnom su vezani preko pasarela koje se oslanjaju na sidrenim utvrdicama. Gatovi će se opremiti sa sustavom priveza (aneli, bitve) te ormarićima za opskrbu strujom i vodom i rasvjetnim tijelima.

Cilj projekta: Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – Portapižana poduzima se u svrhu izgradnje novih komunalnih vezova u uvali Portapižana.



Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za Rekonstrukciju luke Krk – sekundarni lukobran – Uporabna cjelina 3 u 2024. godini ostvareni su iznosu od 38.125,00 eura, što predstavlja 80,05% planiranog iznosa od 47.625,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- + usluge izrade maritimne studije, dopuna i ažuriranje – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – Portapižana u iznosu od 8.500,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 8.500,00 eura
- + usluge izrade geotehničkih istražnih radova na Rekonstrukciji luke Krk – Uporabna cjelina 3 – Portapižana u iznosu od 8.125,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 8.125,00 eura
- + usluge izrade glavnog projekta Rekonstrukcija luke Krk - Uporabna cjelina 3 - Portapižana i izmjena idejnog projekta Rekonstrukcije luke Krk u iznosu od 20.500,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 20.500,00 eura
- + usluge izrade prilagodbe troškovnika za Rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 3 – Portapižana u iznosu od 500,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 500,00 eura
- + usluge 3D vizualizacije gatova za Rekonstrukciju luke Krk - Uporabna cjelina 3 - gatovi Portapižana (izrada modela i renderiranje) u iznosu od 500,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 500,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeće stavke:

- + usluge izrade geodetske podloge za izmjenu lokacijske dozvole i za potrebe građevinske dozvole – Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 - Portapižana u iznosu od 4.000,00 eura

- ✚ usluge izrade projekta sidrenog sustava plovila za Rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 3 – Portapižana u iznosu od 5.500,00 eura.

Navedene neizvršene usluge planirat će se u izmjeni financijskog plana za 2025. godinu.


U 2024. godini izvršeno je sufinanciranje usluge izrade glavnog projekta Rekonstrukcije luke Krk – Uporabna cjelina 3 – Portapižana i izmjena idejnog projekta Rekonstrukcija luke Krk na temelju sklopljenog ugovora o sufinanciranju s Primorsko-goranskom županijom u iznosu od 20.000,00 eura. Navedeno sufinanciranje obrazloženo je u ostvarenju prihoda.

Ukupna ostvarena sredstva u 2024. godini za projekt Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 3 – Portapižana iznose 38.125,00 eura, od čega sufinanciranje Primorsko-goranske županije iznosi 20.000,00 eura, preostala sredstva osigurava Županijska lučka uprava Krk u iznosu od 18.125,00 eura.

U sljedećem tabelarnom prikazu su izvori sredstava po projektu ostvarenih u 2024. godini.

Izvor sredstava	Iznos (u EUR)	Struktura
Primorsko-goranska županija	20.000,00	52,46%
Županijska lučka uprava Krk	18.125,00	47,54%
UKUPNO	38.125,00	

Izvori su/financiranja projekta



2.1.5. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke – Obala Marina – Uporabna cjelina 5**

Opis projekta: Projektom je definiran zahvat na uporabnoj cjelini 5 – „Obala Marina“ gdje je predviđeno da se postojeća obala u dužini oko 125,00 m proširi do 5,00 m, a istočni dio u duljini 27,65 m će se sanirati u podmorskom dijelu dok će se u nadmorskom dijelu izvršiti rekonstrukcija s novim nadmorskim zidom bez izmjena obalne linije, kota partera je na +1,20 m, projektirane dubine akvatorija pred obalnim zidom -4,0 m. Obalni zid će se izvesti kao vertikalni zid od dva reda armirano-betonskih bušenih pilota na razmaku od cca 7,00 m, s montažnim a.b. elementima između pilota koji s nadmorskim dijelom čine vertikalni obalni zid. Vrh zida je postavljen na koti +1,20m.

Šetnica s kamenim opločnjem se izvodi uz obalni zid te zajedno sa kamenom poklopnicom ukupne je širine 5,50 do 6,50 m.

Rekonstruirana obala opremiti će se lijevanoželjeznim polerima nosivosti 15 tona na razmaku cca 7,0 m za privez plovila, a između njih ugraditi će se aneli od nehrđajućeg čelika-prokroma te ormarićima za opskrbu strujom i vodom i rasvjetnim tijelima.

Nakon izgradnje obale predviđeno je 18 mjesta za privez plovila duljine do 25,0 m, širine veza 7,0m.

Cilj projekta: Rekonstrukcija luke Krk - Uporabna cjelina 5 – „Obala Marina“ poduzima se u svrhu ojačanja same obale i proširenja šetnice.



Vrijednost projekta: II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu ne planiraju se rashodi koji su bili predviđeni prethodnom izmjenom, a odnosili su se na usluge izmjene i dopune glavnog projekta i usluge izrade maritimne studije u ukupnom iznosu od 19.750,00 eura, te sredstva nisu ostvarena u 2024. godini.

2.1.6. Naziv projekta: **Rekonstrukcija istezališta u luci Krk - odvodnja i zbrinjavanje otpadnih voda na istezalištu**

Opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija istezališta u luci Krk. Rekonstrukcija se odnosi na rješavanje odvodnje i zbrinjavanje otpadnih voda na istezalištu.

Ovim projektom predviđena je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od pranja brodova sa svim pripadajućim objektima: taložnik, crpna stanica, uređaj za kemijsko fizikalni tretman smještenom u kontejner, kontrolno okno, crpna stanica koja omogućava spoj na javnu sanitarnu kanalizaciju.

Cilj projekta: Svrha ovog projekta je rješavanje odvodnje i zbrinjavanje otpadnih voda na istezalištu u luci Krk.

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za projekt Rekonstrukcija istezališta u luci Krk – odvodnja i zbrinjavanje otpadnih voda na istezalištu ostvareni su u iznosu od 168.384,82 eura, što predstavlja 90,68% planiranog iznosa od 185.697,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- + radovi na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u iznosu od 150.072,13 eura, što predstavlja 99,95% planiranog iznosa od 150.150,00 eura
- + elektroinstalaterski radovi na izradi uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na investiciji odvodnje i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk u iznosu od 4.466,88 eura, što predstavlja 92,87% planiranog iznosa od 4.810,00 eura
- + usluge stručnog nadzora na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk u iznosu od 4.051,28 eura, što predstavlja 79,05% planiranog iznosa od 5.125,00 eura
- + usluge koordinatora zaštite na radu na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk u iznosu od 1.500,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.500,00 eura
- + usluge projektantskog nadzora na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk u iznosu od 2.500,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 2.500,00 eura
- + usluge arheološkog nadzora na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk u iznosu od 3.750,00 eura, što predstavlja 93,89% planiranog iznosa od 3.994,00
- + usluge nadzora nad elektroinstalaterskim radovima na izradi uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na investiciji odvodnje i zbrinjavanje otpadnih voda na istezalištu u luci Krk u iznosu od 437,50, što predstavlja 99,89% planiranog iznosa od 438,00 eura
- + priključak vode na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk u iznosu od 769,53 eura, što predstavlja 38,65% planiranog iznosa od 1.991,00 eura

- + nabava lavandina za investiciju na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk u iznosu od 525,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 525,00 eura
- + usluge dijamantnog brušenja na investiciji na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk u iznosu od 312,50 eura, što predstavlja 104,17% planiranih sredstava od 300,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeće stavke:

- + usluge izrade projekta potrebnih elemenata za montažu elektromotornog vitla na istezalištu u luci Krk u iznosu od 5.700,00 eura
- + usluge geodezije, Izjava ovlaštenog inženjera geodezije i snimak izvedenog stanja na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk u iznosu od 664,00 eura
- + radovi na temelju za vinč na investiciji na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk u iznosu od 8.000,00 eura.

Navedene neizvršene usluge i radovi planirat će se u izmjeni financijskog plana za 2025. godinu.


U 2024. godini izvršeno je sufinanciranje radova od Primorsko-goranske županije na temelju sklopljenog ugovora o sufinanciranju. Navedeno sufinanciranje obrazloženo je u ostvarenju prihoda.

Ukupna ostvarena sredstva u 2024. godini za projekt Rekonstrukcija istezališta u luci Krk – odvodnja i zbrinjavanje otpadnih voda na istezalištu iznose 168.384,82 eura, od čega sufinanciranje od Primorsko-goranske županije iznosi 105.000,00 eura, dok preostala sredstva osigurava Županijska lučka uprava Krk u iznosu od 63.384,82 eura.

U sljedećem tabelarnom prikazu su izvori sredstava po projektu ostvarenih u 2024. godini.

Izvor sredstava	Iznos (u EUR)	Struktura
Primorsko-goranska županija	105.000,00	62,36%
Županijska lučka uprava Krk	63.384,82	37,64%
UKUPNO	168.384,82	

Izvori su/financiranja projekta

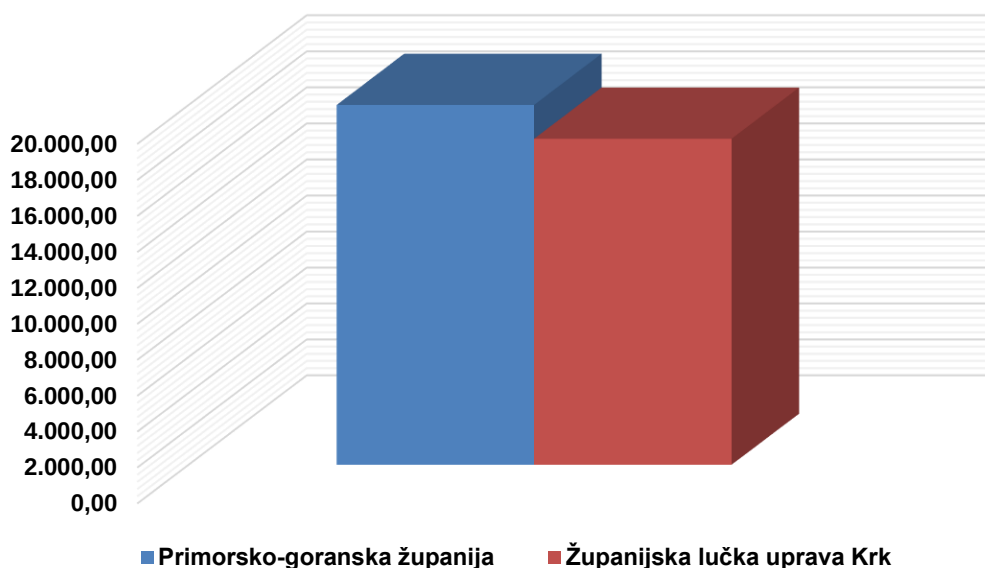2.1.7. Naziv projekta: **EU projekt - Rekonstrukcija luke Krk**

Opis projekta: Prema idejnom projektu i lokacijskoj dozvoli te njezinim izmjenama i dopunama Rekonstrukcija luke Krk podijeljena je u 6 (šest) samostalnih uporabnih cjelina:

- ✚ Uporabna cjelina 1 – primarni lukobran
- ✚ Uporabna cjelina 2 – sekundarni lukobran
- ✚ Uporabna cjelina 3 – Portapižana – gatovi
- ✚ Uporabna cjelina 4 – Veli mul
- ✚ Uporabna cjelina 5 – Obala Marina
- ✚ Uporabna cjelina 6 – ribarski gat.

Prijavom projekta „Rekonstrukcija luke Krk“ na Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture i komunalne vezove, objavljen dana 16. travnja 2024. godine od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, obuhvaćene su 3 samostalne uporabne cjeline:

- ✚ Uporabna cjelina 1 - primarni lukobran
 - ✚ Uporabna cjelina 2 - sekundarni lukobran
 - ✚ Uporabna cjelina 3 - Portapižana - gatovi
- ✚ rekonstrukciju primarnog lukobrana - uporabna cjelina 1 (UC1) - ukupna dužina novog gata iznositi će 195,70 m, tlocrtno nije u pravcu već je razlomljen pod kutom od 118° i time podijeljen na dva dijela. Širina gata u prvom dijelu (na spoju s postojećim lukobranom) je 22,0 m, a ostali dio je širine 12,0 m. Za gat je definirana projektna dubina od -5,00 m, a kota vrha zida, odnosno partera iznosi +1,50 m n.m.

- ✚ rekonstrukciju sekundarnog lukobrana - uporabna cjelina 2 (UC2) - ukupna dužina novog sekundarnog lukobrana iznosit će cca 83,0 m s vanjske strane i 77,50 m s unutarnje strane. Sekundarni lukobran nastavlja se na postojeći gat u uvali Portapižana te tlocrtno nije u pravcu već je razlomljen pod kutevima od 153° i 134° te time je sekundarni lukobran podijeljen na dva dijela. Širina gata u prvom dijelu (na spoju s postojećim gatom) je cca 5,60 m, a ostali dio je širine 8,0 m. Za sekundarni lukobran definirana je projektna dubina od -5,00 m, a kota vrha zida, odnosno hodne površine iznosi +1,50 m n.m. 1
- ✚ rekonstrukciju uvale Portapižana - uporabna cjelina 3 (UC3) - predviđa se izgradnja novog obalnog zida ukupne razvijene dužine od oko 145,74 m (84,43 + 61,31 m), uređenje zaobalnog platoa te postavljanje dva plutajuća gata pojedinačne dužine od oko 120,0 i 96,0 m.

Cilj projekta: Unaprijediti infrastrukturu luke Krk izgradnjom primarnog i sekundarnog lukobrana te time omogućiti zaštitu lučkog akvatorija i osigurati dio komunalnih vezova i potrebnih operativnih obala i površina. Nadalje, rekonstrukcijom uvale Portapižana kao sastavnog dijela projekta, osigurati će se značajan broj nužnih komunalnih vezova za lokalno stanovništvo i gospodarstvo. Navedenim se na taj način osigurava sigurnost i zaštita lučkog akvatorija, podiže kapacitet i komunalni standard te omogućuje gospodarski razvoj prostora. Projektom se želi zadovoljiti sve sigurnosne zahtjeve za pristajanje izletničkih i lokalnih ribarskih brodova koji su korisnici komunalnih vezova te brodica domicilnog stanovništva tijekom cijele godine bez obzira na vremenske uvjete a što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, rada i drugih usluga lokalne zajednice.



Vrijednost projekta: II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu planirani su rashodi za početak provođenja postupaka javnih i jednostavnih nabava za radove i usluge u ukupnom iznosu od 30.850,00 eura. U 2024. godini ti rashodi nisu ostvareni i odnose se na sljedeće stavke:

- ✚ EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk – radovi u iznosu od 26.000,00 eura
- ✚ EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk – usluge stručnog nadzora građenja i koordinator zaštite na radu u iznosu od 1.200,00 eura
- ✚ EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk – usluge projektantskog nadzora u iznosu od 350,00 eura
- ✚ EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk – usluge voditelja projekta u iznosu od 500,00 eura
- ✚ EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk – usluge administrativnog vođenja projekta (neprihvatljivi troškovi) u iznosu od 2.000,00 eura
- ✚ EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk – usluge promidžbe i vidljivosti u iznosu od 500,00 eura
- ✚ EU projekt – Rekonstrukcija luke Krk – neprihvatljivi troškovi u iznosu od 300,00 eura.

Nakon provedenog postupka dodjele bespovratnih sredstava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je dana 27. studenog 2024. godine donijelo Odluku o financiranju projekta.

Dana 05. prosinca 2024. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa "Konkurentnost i kohezija" u financijskom razdoblju 2021.-2027. za projekt PK.5.2.02.0010 „Rekonstrukcija luke Krk“ sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 18.965.572,64 eura.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 19.373.001,39 eura, od kojih je 18.965.572,64 eura prihvatljiv trošak, a 407.428,75 eura neprihvatljiv trošak. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sufinancirati će predmetni projekt u iznosu od 2.844.835,90 eura (15% sredstava), Europski fond za regionalni razvoj će financirati projekt u iznosu 16.120.736,74 eura (85% sredstava), dok će ostatak sredstava koji predstavljaju neprihvatljive troškove projekta financirati Grad Krk i Županijska lučka uprava Krk u iznosu od 407.428,75 eura. Neprihvatljivi troškovi obuhvaćaju trošak administrativne pomoći u provedbi projekta u ukupnom iznosu od 31.250,00 eura te dio radova Uporabne cjeline 3 koji su u vlasništvu RH i nalaze se izvan lučkog područja u ukupnom iznosu od 376.178,75 eura. Radove na izvan lučkom području će u potpunosti financirati Grad Krk temeljem Sporazuma o financiranju koji se planira potpisati početkom 2025. godine.

Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci. Razdoblje provedbe projekta je od 01.09.2024. do 31.08.2027. godine. Razdoblje prihvatljivosti troškova projekta je od 01.09.2024. do 29.02.2028. godine.

U Financijskom planu za 2025. godinu, koji uključuje i projekcije za 2026. i 2027. godinu, planirana su sredstva za provedbu projekta Rekonstrukcija luke Krk.

2.1.8. Naziv projekta: **Rekonstrukcija operativne obale Sv. Bernardin u luci Krk**

Opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija obalnog zida operativne obale Sv. Bernardin u luci Krk.

Cilj projekta: Svrha ovog projekta je ojačavanje konstrukcije operativne obale radi sigurnosti prolaznika te korisnika luke.



Vrijednost projekta: U Financijskom plana za 2024. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 16.100,00 eura koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeće stavke:

- ✚ usluge izrade glavnog projekta na nivou izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole rekonstrukcije operativne obale Sv. Bernardin u luci Krk u iznosu od 12.850,00 eura
- ✚ usluge geodetskih radova za glavni projekt rekonstrukcije operativne obale Sv. Bernardin u luci Krk u iznosu od 3.250,00 eura.

Navedene neizvršene usluge planirat će se u izmjeni financijskog plana za 2025. godinu, na temelju sklopljenih ugovora i naručenih usluga.

2.2. TEKUĆE ULAGANJE:

2.2.1. Naziv ulaganja: **Sanacija podmorskog i nadmorskog dijela obalnog zida rive – Obala Marina u luci Krk**

Opis: Zbog oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela obalnog zida rive Obala Marina u luci Krk potrebno je izvršiti sanaciju.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.



Vrijednost: U 2024. godini za sanaciju ostvareni su rashodi u iznosu od 35.761,98 eura, što predstavlja 98,79% od planiranih sredstava u iznosu od 36.200,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- ✚ radovi na saniranju podmorskog i nadmorskog dijela obalnog zida rive Obala Marina u iznosu od 34.561,98 eura, što predstavlja 98,75% planiranog iznosa od 35.000,00 eura
- ✚ usluge stručnog nadzora za radove na sanaciji podmorskog i nadmorskog dijela obalnog zida rive Obala Marina u iznosu od 1.200,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.200,00 eura.

2.2.2. Naziv ulaganja: Sanacija podmorskog i nadmorskog dijela obalnog zida rive u luci Krk

Opis: Zbog oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela obalnog zida rive u luci Krk potrebno je izvršiti sanaciju.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini za sanaciju ostvareni su rashodi u iznosu od 9.337,50 eura što čini 99,60% planiranog iznosa od 9.375,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

- ✚ radovi na saniranju podmorskog i nadmorskog dijela obalnog zida rive u iznosu od 9.337,50 eura.

2.2.3. Naziv ulaganja: **Sanacija oštećenog dijela obalnog zida na operativnoj obali Sv. Bernardin u luci Krk**

Opis: Zbog oštećenja dijela obalnog zida na operativnoj obali Sv. Bernardin u luci Krk potrebno je izvršiti sanaciju.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini za sanaciju ostvareni su rashodi u iznosu od 3.250,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 3.250,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

- ✚ radovi na saniranju oštećenog dijela obalnog zida na operativnoj obali Sv. Bernardin u luci Krk u iznosu od 3.250,00 eura.

2.2.4. Naziv ulaganja: **Izmjena sidrenog sustava pontonskog gata u luci Krk**

Opis: Zbog dotrajalosti potrebno je izmijeniti sidreni sustav pontonskog gata u luci Krk.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini za radove ostvareni su rashodi u iznosu od 5.808,75 eura, što predstavlja 99,98% planiranog iznosa 5.810,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

- ✚ radovi na izmjeni sidrenog sustava pontonskog gata u luci Krk u iznosu od 5.808,75 eura.

2.2.5. Naziv ulaganja: **Sanacija platoa na Obali Marina u luci Krk**

Opis: Zbog oštećenja platoa uslijed olujnog vremena, potrebno je izvršiti sanaciju na dijelu Obale Marina u luci Krk.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini za sanaciju ostvareni su rashodi u iznosu od 3.137,81 eura, što predstavlja 99,93% planiranog iznosa od 3.140,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

- ✚ radovi na saniranju platoa Obale Marina u luci Krk u iznosu od 3.137,81 eura.

2.2.6. Naziv ulaganja: Rampa za osobe s invaliditetom, prilaz sekundarnom lukobranu u luci Krk

Opis: Predmet zahvata je izgradnja betonske rampe s rukohvatom za osiguranje pristupačnosti novom lukobranu osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na području lukobrana Portapižana, na dijelu k.č. 4961/1 k. Betonska rampa s rukohvatom isključivo se postavlja za prilaz budućem sekundarnom lukobranu Portapižana. Izmjenom glavnog projekta za Uporabnu cjelinu 2 – sekundarni lukobran, rampa za osobe s invaliditetom projektirana je kao sastavni dio projekta, kako ne bi bila zasebna cjelina ili faza.

Cilj: Betonska rampa s rukohvatom izvodi se u svrhu osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom budućem sekundarnom lukobranu.



Vrijednost: Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.125,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 3.125,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

- ✚ usluge izrade glavnog projekta prilazne rampe za osobe s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti kao prilaz sekundarnom lukobranu u iznosu od 3.125,00 eura.

3. LUKA: MALINSKA

OPIS LUKE:

Luka Malinska je luka otvorena za javni promet županijskog značaja. Sastoji se od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, kao i komunalnog dijela luka te nautičkog dijela luke.

Luka ima:

- ✚ područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata dizalicom
- ✚ područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem
- ✚ osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom
- ✚ mjesta za opskrbu pitkom vodom
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

3.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

3.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija i dogradnja primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza**

Opis projekta: U sklopu rekonstrukcije luke Malinska planira se rekonstrukcija i dogradnja postojećeg primarnog lukobrana u dijelu postojećih gabarita, gdje se na istom s vanjske strane izvodi valobrani zid s krunom na koti od oko +2,50 m, te se iza njega prema moru izvodi kamena obalozaštita (školjera). Postojeći se obalni plato lukobrana uređuje s nagibom prema unutarnjoj strani luke te se na tom kraju izvodi novi masivni betonski obalni zid za privez brodica. Radi dodatne zaštite akvatorija luke na glavi primarnog lukobrana predviđa se, približno u pravcu sjever - jug, izgradnja produžetka primarnog lukobrana. Isti bi se radi većih dubina mora (do oko 23 m) izveo na temeljnom nasipu, kao masivni, betonski, vertikalni lukobran, s valobranim zidom u dijelu iznad partera radi dodatnog sprječavanja prelijevanja valova. Planirane je dužine oko 80 m, i širine 6 m. Na njemu bi bio moguć privez plovila za povoljnih vremenskih uvjeta i s vanjske strane.

Na južnoj strani ulaza u luku predviđena je dogradnja sekundarnog lukobrana za oko 57 m u pravcu postojećeg dijela lukobrana (približno jug-sjever), širine oko 6 m. Sekundarni lukobran se planira izvesti duboko temeljen na armirano-betonskim bušenim pilotima, s uronjenim valobranim ekranom (djelomično propusni lukobran).

Cilj projekta: Rekonstrukcija i dogradnja primarnog lukobrana i dogradnja sekundarnog lukobrana – I faza u luci Malinska poduzima se u svrhu bolje zaštite lučkog akvatorija, osiguranja komunalnih i nautičkih vezova, te sigurnog mjesta za privez plovila.



Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za projekt Rekonstrukcije i dogradnje primarnog lukobrana i dogradnju sekundarnog lukobrana – I faza u luci Malinska ostvareni su u iznosu od 6.625,00 eura, što predstavlja 12,52% planiranog iznosa od 52.913,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- ✚ usluge revizije glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju primarnog lukobrana i dogradnju sekundarnog lukobrana – I faza u luci Malinska u iznosu od 6.625,00 eura, što predstavlja 99,98% planiranog iznosa od 6.626,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeće stavke:

- ✚ usluge izrade glavnog projekta i vođenje postupka ishoda građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju primarnog lukobrana i dogradnju sekundarnog lukobrana – I faza u luci Malinska u iznosu od 46.287,00 eura.

Navedene neizvršene usluge planirat će se u izmjeni financijskog plana za 2025. godinu.

3.1.2. Naziv projekta: **Rekonstrukcija obalnog zida u luci Malinska**

Opis projekta: Ovim projektom planira se rekonstrukcija obalnog zida uzduž obalnog pojasa i uređenje samog obalnog pojasa prema Jazu u luci Malinska. Obalni zid će se opremiti anelima za privez plovila.

Cilj projekta: Uređenje odnosno rekonstrukcija obalnog zida prema Jazu u luci Malinska poduzima se u svrhu ojačanja same obale te time i sigurnost priveza plovila.



Vrijednost projekta: Rashodi za projekt planirani su u iznosu od 1.000,00 eura, no nisu ostvareni do kraja 2024. godine. Rashodi se odnose se na sljedeću stavku:

- ✚ nabava radova na rekonstrukciji obalnog zida prema Jazu u luci Malinska u iznosu od 1.000,00 eura.

U I. izmjeni Financijskog plana za 2024. godinu planirana su sredstva za radove i usluge vezane za projekt Rekonstrukcija obalnog zida u luci Malinska. Nakon provedenog postupka javne nabave pristigla je žalba na odabir, zbog čega je II. izmjenom Financijskog plana smanjena planirana sredstva za projekt u 2024. godini. U 2025. godini planirana su sredstva za radove i usluge koji će se izvoditi tijekom 2025. i 2026. godine.

3.1.3. Naziv projekta: **Plutajući ponton za ribare u luci Malinska**

Opis projekta: Ovim projektom planira se izrada projektne dokumentacije, te nabava i montaža plutajućeg pontona za ribare u luci Malinska.

Cilj projekta: Postavljanje plutajućeg pontona za ribarske brodice poduzima se u svrhu pružanja usluge ribarima.

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za projekt ostvareni su u iznosu od 24.587,50 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 24.588,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- ✚ usluge izrade geodetske podloge za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za dobavu i montažu plutajućeg pontona za ribare u luci Malinska u iznosu od 625,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 625,00 eura
- ✚ nabava i montaža pristupne pasarele na plutajući ponton za ribare u luci Malinska u iznosu od 9.000,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 9.000,00 eura

- + usluge izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za plutajući ponton u luci Malinska u iznosu od 5.000,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 5.000,00 eura
- + usluge izrade projekta sidrenja za plutajući ponton za ribare u luci Malinska u iznosu od 4.375,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 4.375,00 eura
- + usluge izrade maritimne studije za postavu plutajućeg pontona za ribare u luci Malinska u iznosu od 5.250,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 5.250,00 eura
- + usluge pregleda elaborata sidrenja gata i plovila za plutajući ponton za ribare u luci Malinska u iznosu od 337,50 eura, što predstavlja 99,85% planiranog iznosa od 338,00 eura.


U 2024. godini izvršeno je sufinanciranje nabave i montaže pristupne pasarele na plutajući ponton za ribare od Općine Malinska-Dubašnica na temelju sklopljenog ugovora o sufinanciranju. Navedeno sufinanciranje obrazloženo je u ostvarenju prihoda.

Ukupna ostvarena sredstva u 2024. godini za navedeni projekt iznose 24.587,50 eura od čega sufinanciranje Općine Malinska-Dubašnica iznosi 9.000,00 eura te ostala sredstva osigurava Županijska lučka uprava Krk u iznosu od 15.587,50 eura.

U sljedećem tabelarnom prikazu su izvori sredstava po projektu ostvarenih u 2024. godini.

Izvor sredstava	Iznos (u EUR)	Struktura
Općina Malinska-Dubašnica	9.000,00	36,60%
Županijska lučka uprava Krk	15.587,50	63,40%
UKUPNO	24.587,50	

Izvori su/financiranja projekta

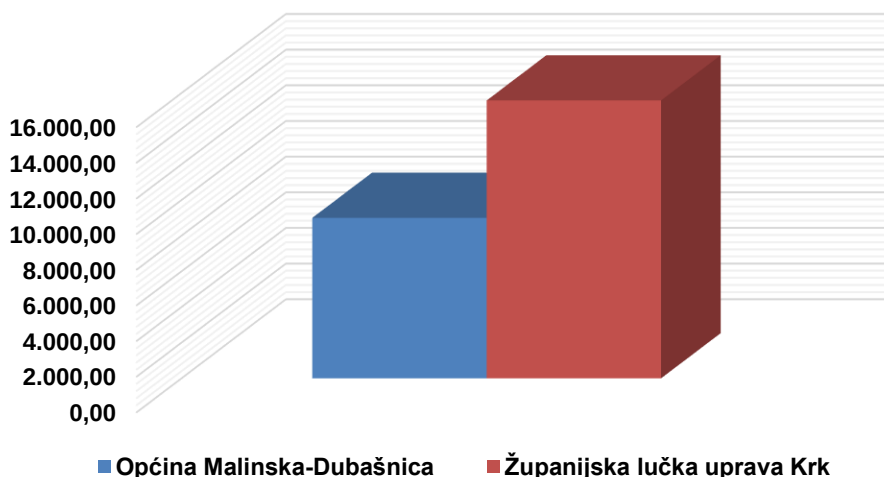

3.1.4. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke Malinska – II. faza**

Opis projekta: U sklopu rekonstrukcije luke Malinska planira se postavljanje plutajućih gatova, uklanjanje postojećeg prilaznog fiksnog gata te uređenje akvatorija luke.

Cilj projekta: Rekonstrukcija luke Malinska – II. faza u luci Malinska poduzima se u svrhu osiguranja komunalnih i nautičkih vezova, te sigurnog mjesta za privez plovila.

Vrijednost projekta: I. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu planirani su rashodi u iznosu od 19.375,00 eura za usluge izrade glavnog projekta za rekonstrukciju luke Malinska – II. faza. Međutim, II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu ti rashodi više nisu planirani, već su sredstva planirana u Financijski plan za 2025. godinu.

3.2. **TEKUĆE ULAGANJE:**

3.2.1. Naziv ulaganja: **Montaža pasarele na lukobranu u luci Malinska**

Opis: Usluge montaže pasarele u luci Malinska.

Cilj: Sigurno korištenje pasarele u svrhu priveza plovila u luci Malinska.

Vrijednost: Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.305,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 3.305,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

✚ usluge montaže pasarele na lukobranu u luci Malinska u iznosu od 3.305,00 eura.

3.2.2. Naziv ulaganja: **Izmjena sidrenog sustava pontona (plastičnog) u luci Malinska**

Opis: Zbog dotrajalosti potrebno je izmijeniti sidreni sustav pontona (plastičnog) u luci Malinska.

Cilj: **Održavanje** i sigurnost u luci.

Vrijednost projekta: I. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu planirani su rashodi u iznosu od 5.625,00 eura za radove na izmjeni sidrenog sustava pontona (plastičnog) u luci Malinska. Međutim, II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu ti rashodi više nisu planirani, već su sredstva planirana u Financijski plan za 2025. godinu.

4. LUKA: OMIŠALJ

OPIS LUKE:

Luka Omišalj je luka otvorena za javni promet županijskog značaja. Sastoji se od četiri lučka bazena, operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, komunalnog dijela luke kao i nautičkog dijela luke.

Luka ima:

- ✚ područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata dizalicom
- ✚ osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom
- ✚ mjesta za opskrbu pitkom vodom
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

4.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

4.1.1. Naziv projekta: **Instalacija za plutajući ponton u luci Omišalj**

Opis projekta: U 2023. godini je u luci Omišalj izvršeno ulaganje u montažu plutajućeg pontona. Financijskim planom za 2024. godini planira se izrada elektro, vodovodne instalacije do pontona te dobava kabela i cijevi za instalaciju struje vode te montaža energetske ormarića.

Cilj projekta: Postavljanjem energetske ormarića pružat će se usluga korisnicima nautičkih i komunalnih vezova.

Vrijednost projekta: I. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 15.000,00 eura za radove na izradi elektro- i vodovodnih instalacija do pontona. Međutim, II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu ti rashodi više nisu planirani i nisu ostvareni.

4.1.2. Naziv projekta: **Nabava i montaža plutajućeg pontona (drugi) u luci Omišalj**

Opis projekta: Projektom se planira postavljanje jednog plutajućeg gata dužine oko 60 m, širine 2,50 m u jugoistočnom dijelu luke, a približno na mjestu postojećeg gata koji je dotrajavao, a dužine je oko 33 m. Plutajući elementi gata su međusobno povezani elastičnom vezom, a njihov stalni položaj u moru je osiguran preko sidrenih lanaca pričvršćenih za sidrene betonske blokove („corpo morto“) koji se nalaze na morskom dnu. Gat se na bočnim stranicama oprema bitvama ili prstenima (anelima) za privez plovila, a nalaze se na udaljenosti od oko 2,0 ($\pm 0,5$) m, ovisno o proizvođaču pontona.

Cilj projekta: Svrha ovog projekta je sigurnost korisnika luke Omišalj.



Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za projekt Nabave i montaže plutajućeg pontona (drugi) u luci Omišalj ostvareni su u iznosu od 10.125,00 eura, što predstavlja 91,01% planiranog iznosa od 11.125,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- ✚ usluge izrade glavnog projekta za nabavu i montažu plutajućeg pontona u luci Omišalj u iznosu od 7.875,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 7.875,00 eura
- ✚ usluge izrade geodetske podloge za nabavu i montažu plutajućeg pontona u luci Omišalj u iznosu od 2.250,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 2.250,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeće stavke:

- ✚ nabava radova na nabavi i montaži plutajućeg pontona u luci Omišalj u iznosu od 1.000,00 eura (za početak radova).

Krajem 2024. godine pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na nabavi i montaži plutajućeg pontona u luci Omišalj. Nakon završetka postupka u 2025. godini bit će sklopljen ugovor s odabranim izvođačem radova.

U Financijskom planu za 2025. godinu planirana su sredstva za nabavu i montažu plutajućeg pontona u luci Omišalj.

4.1.3. Naziv projekta: **Uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice u luci Omišalj**

Opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija obalnog zida uzduž obalnog pojasa i uređenje samog obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice u luci Omišalj, a time i proširenje same obale. Obalni zid će se opremiti anelima za privez plovila.

Cilj projekta: Uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice u luci Omišalj (Pesja) poduzima se u svrhu ojačanja same obale te time i sigurnost priveza plovila.



Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za projekt Uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice u luci Omišalj ostvareni su u iznosu od 19.083,75 eura, što predstavlja 78,62% planiranog iznosa od 24.272,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- ✚ usluge izrade glavnog projekta uređenja obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice u luci Omišalj u iznosu od 13.271,25 eura, što predstavlja 99,99% od planiranog iznosa od 13.272,00 eura
- ✚ usluge revizije glavnog projekta uređenja obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice u luci Omišalj u iznosu od 1.875,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.875,00 eura
- ✚ usluge izrade elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za uređenje obalnog pojasa od rive u iznosu od 3.937,50 eura, što predstavlja 90,00% planiranog iznosa od 4.375,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeću stavku:

- ✚ usluge ažuriranja maritimne studije za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II. do dizalice u luci Omišalj u iznosu od 4.750,00 eura.

Navedene neizvršene usluge planirat će se u izmjeni financijskog plana za 2025. godinu.

4.1.4. Naziv projekta: **Rekonstrukcija bazena Lučica u luci Omišalj**

Opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija bazena Lučica u luci Omišalj.

Cilj projekta: Uređenje bazena Lučica u luci Omišalj poduzima se u svrhu razvoja i sigurnosti luke.

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za projekt Rekonstrukcija bazena Lučica u luci Omišalj ostvareni su u iznosu od 2.937,50 eura, što predstavlja 37,00% planiranog iznosa od 7.940,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- ✚ usluge izrade geodetske podloge za izradu idejnog rješenja za rekonstrukciju bazena Lučica luke Omišalj u iznosu od 2.937,50 eura, što predstavlja 99,91% planiranog iznosa od 2.940,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeću stavku:

- ✚ usluge izrade idejnog rješenja za rekonstrukciju bazena Lučica luke Omišalj u iznosu od 5.000,00 eura.

Navedene neizvršene usluge planirat će se u izmjeni financijskog plana za 2025. godinu, na temelju sklopljenog ugovora.

4.2. **TEKUĆE ULAGANJE:**

4.2.1. Naziv ulaganja: **Plutajući ponton stari - micanje**

Opis: I. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu planirana je nabava i montaža drugog plutajućeg pontona u luci Omišalj. II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu planirano je započeti otvoreni postupak javne nabave za nabavu i montažu plutajućeg pontona. Prije postavljanja novog pontona, potrebno je izvaditi i deponirati stari, odnosno postojeći.

Cilj: Nabava i montaža novog pontona u luci Omišalj.

Vrijednost: I. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 21.000,00 eura za uslugu vađenja i deponiranja postojećeg pontona, te uslugu vađenja i deponiranja sidrenog sustava plovila i postojećeg pontona. II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu ti rashodi više nisu planirani. Usluga micanja pontona je planirana u Financijskom planu za 2025. godinu u projektu nabave i montaže novog plutajućeg pontona.

4.2.2. Naziv ulaganja: **Radovi na popravku pontona Gaj u luci Omišalj**

Opis: II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu planirani su radovi na popravku pontona Gaj u luci Omišalj zbog oštećenosti istog.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeću stavku:

✚ Radovi na popravku pontona Gaj u luci Omišalj u iznosu od 29.500,00 eura.

Navedeni neizvršeni radovi planirat će se u izmjeni financijskog plana za 2025. godinu, na temelju sklopljenog ugovora.

5. LUKA: PUNAT

OPIS LUKE:

Luka Punat je luka otvorena za javni promet županijskog značaja. Sastoji se od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu kao i komunalnog te nautičkog dijela luke.

Luka ima:

- ✚ Područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem
- ✚ Sidrište u funkciji nautičkog dijela luke
- ✚ Osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom
- ✚ Mjesta za opskrbu pitkom vodom
- ✚ Jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ Jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

5.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

5.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija i dogradnja dva gata na području Vele vode u luci Punat**

Opis projekta: Ovim projektom planira se rekonstrukcija i dogradnja dva gata na području Vele Vode u luci Punat. Rekonstrukcijom se predviđa produženje gatova za otprilike 50 m. Širina produženih dijelova biti će približna postojećim gatovima.

Cilj projekta: Svrha ovog projekta je izgradnja novih komunalnih vezova u luci Punat.



Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za projekt Rekonstrukcija i dogradnja dva gata na području Vele vode u luci Puntarić ostvareni su u iznosu od 23.518,75 eura, što predstavlja 72,01% planiranog iznosa od 32.661,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- ✚ usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje dva gata na području Vele vode u luci Puntarić u iznosu od 12.825,00 eura, što predstavlja 95,00% planiranog iznosa od 13.500,00 eura
- ✚ usluge revizije glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje dva gata na području Vele vode u luci Puntarić u iznosu od 3.125,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 3.125,00 eura
- ✚ usluge izrade maritimne studije za rekonstrukciju i dogradnju dva gata na području Vele vode u luci Puntarić u iznosu 5.250,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 5.250,00 eura
- ✚ usluge izrade elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za rekonstrukciju i dogradnju dva gata na području Vele vode u luci Puntarić u iznosu od 2.318,75 eura, što predstavlja 99,98% planiranog iznosa od 2.320,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeću stavku:

- ✚ usluga izrade izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje dva gata na području Vele vode u luci Puntarić u iznosu od 7.466,00 eura
- ✚ nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji dva gata na području Vele vode u luci Puntarić u iznosu od 1.000,00 eura.

U 2025. godini planirana su sredstva za radove i usluge koji će se izvoditi tijekom 2025. i 2026. godine. Neizvršene planirane usluge u 2024. godini planirati će se izmjenom plana za 2025. godinu.

5.1.2. Naziv projekta: Nabava i montaža plutajućeg pontonskog gata u luci Punat

Opis projekta: Ovim projektom planira se postavljanje jednog plutajućeg gata dužine cca 36,00 m, širine 2,40 m. Plutajući elementi gata su međusobno povezani elastičnom vezom, a njihov stalni položaj u moru je osiguran preko sidrenih lanaca pričvršćenih za sidrene betonske blokove. Gat se na bočnim stranicama oprema bitvama ili prstenima (anelima) za privez plovila, a nalaze se na udaljenosti od oko 2,0 ($\pm 0,5$) m, ovisno o proizvođaču pontona.

Cilj projekta: Svrha ovog projekta je izgradnja novih vezova u luci Punat.

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi na nabavi i montaži plutajućeg pontonskog gata u luci Punat u iznosu od 20.758,26 eura, što predstavlja 97,73% planiranog iznosa od 21.240,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- + usluge izrade maritimne studije za dobavu i montažu plutajućeg pontona u luci Punat u iznosu od 5.625,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 5.625,00 eura
- + usluge izrade idejnog projekta za dobavu i montažu plutajućeg pontona u luci Punat u iznosu od 11.450,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 11.450,00 eura
- + radovi na pripremnoj instalaciji za plutajući ponton u luci Punat u iznosu od 3.020,75 eura, nisu bili planirani
- + usluge izrade elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za postavljanje plutajućeg pontona u luci Punat u iznosu od 662,51 eura, što predstavlja 99,63% planiranog iznosa od 665,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeće stavke:

- + usluga izrade geodetske podloge za potrebe izrade idejnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole za plutajući ponton u luci Punat u iznosu od 2.500,00 eura
- + radovi na nabavi i montaži plutajućeg pontona u luci Punat u iznosu od 1.000,00 eura za početak otvorenog postupka javne nabave.

Krajem 2024. godine pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na nabavi i montaži plutajućeg pontonskog gata u luci Punat. Nakon završetka postupka u 2025. godini bit će sklopljen ugovor s odabranim izvođačem radova.

U 2024. godini izvršeno je sufinanciranje usluge izrade idejnog projekta za dobavu i montažu plutajućeg pontonskog gata u luci Punat na temelju sklopljenog ugovora o sufinanciranju s Općinom Punat u iznosu od 10.305,00 eura. Navedeno sufinanciranje obrazloženo je u ostvarenju prihoda.


Ukupno ostvareni rashodi u 2024. godini za projekt Nabave i montaže plutajućeg pontonskog gata iznose 20.758,26 eura, od čega sufinanciranje Općine Punat iznosi

10.305,00 eura, preostala sredstva osigurava Županijska lučka uprava Krk u iznosu od 10.453,26 eura.

U sljedećem tabelarnom prikazu su izvori sredstava po projektu ostvarenih u 2024. godini.

Izvor sredstava	Iznos (u EUR)	Struktura
Općina Punat	10.305,00	49,64%
Županijska lučka uprava Krk	10.453,26	50,36%
UKUPNO	20.758,26	

Izvori su/financiranja projekta



5.1.3. Naziv projekta: Uređenje obalnog pojasa na području od gata K do hotela Falkensteiner u luci Punat

Opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija obalnog zida uzduž obalnog pojasa i uređenje samog obalnog pojasa na području od gata K do hotela Falkensteiner u luci Punat.

Cilj projekta: Uređenje obalnog pojasa na području od gata K do hotela Falkensteiner u luci Punat poduzima se u svrhu ojačanja same obale te time i sigurnost priveza plovila.

Vrijednost projekta: II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 32.000,00 eura. Ovi rashodi nisu ostvareni do kraja 2024. godine i odnose na sljedeće stavke:

- + usluge izrade geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole za uređenje obalnog pojasa na području od gata K do hotela Falkensteiner u luci Punat u iznosu od 3.250,00 eura
- + usluge izrade glavnog projekta za uređenje obalnog pojasa na području od gata K do hotela Falkensteiner u luci Punat (elektro projekt, projekt vode, elaborat mjera zaštite od požara, troškovnik) u iznosu od 28.750,00 eura.

Navedene neizvršene usluge planirat će se u izmjeni financijskog plana za 2025. godinu, na temelju sklopljenog ugovora i naručenih usluga.

II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu planirano je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije od Općine Punat na temelju sklopljenog ugovora o sufinanciranju, te je isto obrazloženo u planu prihoda.

Ukupno rashodi projekta za 2024. godinu planirani su u iznosu od 32.000,00 eura, od čega se 4.580,00 eura odnosi na sufinanciranje Općine Punat, a 27.420,00 eura na vlastita sredstva, odnosno sredstva Županijske lučke uprave Krk. Rashodi i sufinanciranje planirat će se u izmjeni financijskog plana za 2025. godinu.

5.2. TEKUĆE ULAGANJE:

5.2.1. Naziv ulaganja: **Sanacija hodne površine od škvera prema istezalištu u luci Punat (na lokaciji Vele vode)**

Opis: Zbog oštećenosti hodne površine od škvera prema istezalištu (na lokaciji Vele vode) u luci Punat potrebno je izvršiti sanaciju.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini za sanaciju ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 36.652,34 eura, što predstavlja 98,40% planiranog iznosa od 37.250,00 eura. Rashodi se odnose se na sljedeće stavke:

- + usluge izrade izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom u iznosu od 2.000,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 2.000,00 eura
- + radovi na sanaciji hodne površine od škvera prema istezalištu (na lokaciji Vele vode) u luci Punat u iznosu od 33.402,34 eura, što predstavlja 98,24% planiranog iznosa od 34.000,00 eura
- + usluge stručnog nadzora za radove na sanaciji hodne površine od škvera prema istezalištu (na lokaciji Vele vode) u luci Punat u iznosu od 1.250,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.250,00 eura.


U 2024. godini, Općina Punat je izvršila sufinanciranje radova na sanaciji na temelju sklopljenog ugovora o sufinanciranju, a isto je obrazloženo u planu prihoda.

Ukupni ostvareni rashodi za sanaciju u 2024. godini iznose 36.652,34 eura, od čega 32.000,00 eura čini sufinanciranje Općine Punat, dok se 4.652,34 eura odnosi na vlastita sredstva, odnosno sredstva Županijske lučke uprave Krk.

U sljedećem tabelarnom prikazu su izvori sredstava za sanaciju ostvarenih u 2024. godini.

Izvor sredstava	Iznos (u EUR)	Struktura
Općina Punat	32.000,00	87,31%
Županijska lučka uprava Krk	4.652,34	12,69%
UKUPNO	36.652,34	

Izvori su/financiranja projekta

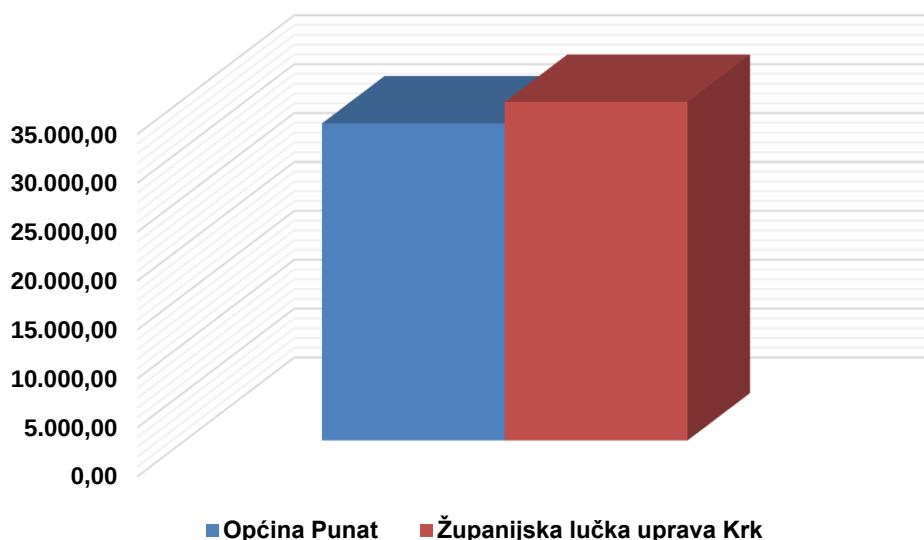

5.2.2. Naziv ulaganja: Sanacija hodne površine Pod Gušternu u luci Punat

Opis: Zbog oštećenosti hodne površine Pod Gušternu u luci Punat potrebno je izvršiti sanaciju.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini za sanaciju ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 67.027,19 eura, što predstavlja 98,03% planiranog iznosa od 68.375,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- ✚ radovi na sanaciji hodne površine Pod Gušternu u luci Punat u iznosu od 64.652,19 eura, što predstavlja 97,96% planiranog iznosa od 66.000,00 eura

- ✚ usluge stručnog nadzora na sanaciji hodne površine Pod Gušternu u luci Punat u iznosu od 2.375,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 2.375,00 eura.


U 2024. godini, Općina Punat je izvršila sufinanciranje radova na sanaciji na temelju sklopljenog ugovora o sufinanciranju, a isto je obrazloženo u planu prihoda.

Ukupni ostvareni rashodi za sanaciju u 2024. godini iznose 67.027,19 eura, od čega se 32.416,19 eura odnosi na sufinanciranje Općine Punat, a 34.611,00 eura na vlastita sredstva, odnosno sredstva Županijske lučke uprave Krk.

U sljedećem tabelarnom prikazu su izvori sredstava za sanaciju ostvarenih u 2024. godini.

Izvor sredstava	Iznos (u EUR)	Struktura
Općina Punat	32.416,19	48,36%
Županijska lučka uprava Krk	34.611,00	51,64%
UKUPNO	67.027,19	

Izvori su/financiranja projekta

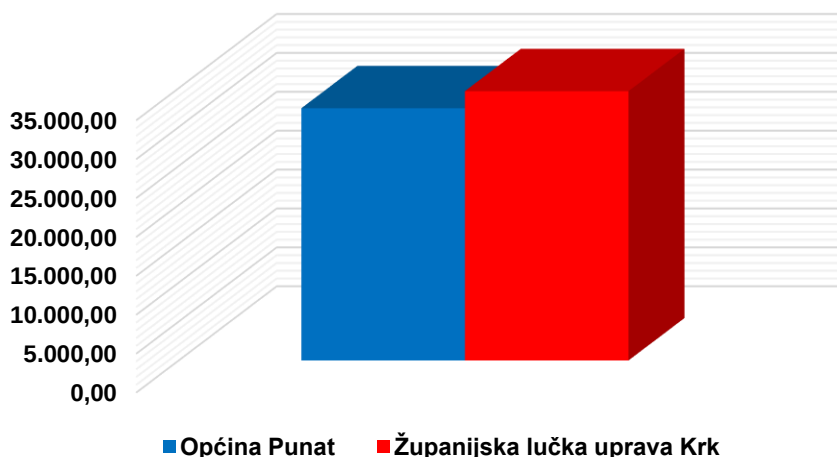

5.2.3. Naziv ulaganja: Iscrtavanje parkirnih mjesta u luci Punat

Opis: Potrebno je izvršiti iscrtavanje parkirnih mjesta u luci Punat.

Cilj: Osiguravanje reda u luci.

Vrijednost: U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 285,00 eura koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeću stavku:

- ✚ radovi na iscrtavanju parkirnih mjesta u luci Punat u iznosu od 285,00 eura.

6. LUKA: SURBOVA - BAŠKA

OPIS LUKE:

Luka Surbova je luka otvorena za javni promet županijskog značaja.

7. LUKA: ŠILO

OPIS LUKE:

Luka Šilo je luka otvorena za javni promet županijskog značaja. Sastoji se od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu kao i komunalnog dijela luke.

Luka ima:

-  osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom
-  mjesta za opskrbu pitkom vodom
-  jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
-  jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

7.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

7.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke Šilo**

Opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija luke Šilo.

Cilj projekta: Uređenje u luci Šilo poduzima se u svrhu razvoja i sigurnosti luke.

Vrijednost projekta: I. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 5.000,00 eura za početak izrade projektne dokumentacije koja uključuje usluge izrade Elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, usluge geotehničkih istražnih radova za potrebe izrade glavnog projekta, usluge izrade maritimne studije, usluge izrade geodezije, te usluge izrade glavnog projekta. II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu se ne planira početak izrade navedene projektne dokumentacije, te sredstva nisu ostvarena u 2024. godini.

7.1.2. Naziv projekta: Nabava i montaža plutajućeg pontonskog gata za brzobrodsku liniju u luci Šilo

Opis projekta: Ovim projektom planira se postavljanje jednog plutajućeg gata dužine 9 - 12 m, širine 2,50 m. Plutajući elementi gata su međusobno povezani elastičnom vezom, a njihov stalni položaj u moru je osiguran preko sidrenih lanaca pričvršćenih za sidrene betonske blokove („corpo morto“) koji se nalaze na morskom dnu.

Cilj projekta: Svrha ovog projekta je osigurati pristanište brzobrodске linije Šilo - Crikvenica u luci Šilo.



Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za projekt Nabava i montaža plutajućeg pontonskog gata za brzobrodsku liniju u luci Šilo ostvareni su u iznosu od 12.350,00 eura, što predstavlja 92,51% planiranog iznosa od 13.350,00 eura. Rashodi se odnose za sljedeće stavke:

- + usluga izrade geodetske podloge za potrebe izrade idejnog projekta i ishoda lokacijske dozvole za dobavu i montažu plutajućeg pontonskog gata za pristanište brzobrodске linije u iznosu od 1.375,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.375,00 eura
- + usluga izrade maritimne studije za dobavu i montažu plutajućeg pontonskog gata za pristanište brzobrodске linije u iznosu od 4.750,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 4.750,00 eura

- ✚ usluga izrade idejnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole za dobavu i montažu plutajućeg pontonskog gata za pristanište brzobrodske linije u iznosu od 6.225,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 6.225,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeću stavku:

- ✚ radovi na nabavi i montaži plutajućeg pontonskog gata za pristanište brzobrodske linije u iznosu od 1.000,00 eura za početak postupka radova, dok je ostatak planiran Financijskim planom za 2025. godinu.

7.2. TEKUĆE ULAGANJE:

7.2.1. Naziv ulaganja: **Sanacija lukobrana u luci Šilo**

Opis: Planira se sanacija lukobrana u luci Šilo. Sanacija obuhvaća fugiranje fuga valobranog zida i partera lukobrana, nadohrana primarnog zaštitnog kamenog nasipa lukobrana (školjere).

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini za sanaciju ostvareni su rashodi u iznosu od 44.812,50 eura, što predstavlja 99,99% planiranog iznosa od 44.815,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

- ✚ radovi na sanaciji lukobrana u luci Šilo u iznosu od 44.812,50 eura.

8. LUKA: VALBISKA

OPIS LUKE:

Luka Valbiska je luka otvorena za javni promet županijskog značaja. Ova luka je trajektna luka za ukrcaj i iskrcaj putnika te prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenim lučkih površina. Nadalje se sastoji od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika te prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu kao i u namjeni ukrcaja i iskrcaja tereta. Jednako tako, sastoji se i od komunalnog dijela luke za privez brodica.

Luka ima:

- ✚ pet spremnika za prikupljanje krutog otpada
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada
- ✚ deset uređenih parkirnih mjesta
- ✚ dva zaustavna mjesta

8.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

8.1.1. Naziv projekta: **Izrada natkrivenog prostora za prijem vozila Hitne pomoći**

Opis projekta: Projektom se planira izrada natkrivenog prostora za prijem vozila Hitne pomoći.

Cilj projekta: Prostor za sigurno korištenje za vozila.



Provedba projekta: U 2023. godini izvršena je izrada projektne dokumentacije i radovi.

Vrijednost projekta: U 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 500,00 eura, što čini 100% planirano iznosa od 500,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

- ✚ usluge geodetskih radova za izmjeru izvedenog stanja nadstrešnice na terenu i izjavu OIG u iznosu od 500,00 eura.

8.1.2. Naziv projekta: **Nabava i postavljanje prijenosne kamene kućice**

Opis projekta: Projektom se planira nabava i postavljanje prijenosne kamene kućice.

Cilj projekta: Nabava kamene kućice za prodaju karata za linijski obalni pomorski promet.

Vrijednost projekta: U 2024. godini ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 21.158,13 eura, što predstavlja 99,99% planiranog iznosa od 21.160,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- ✚ radovi na uređenju platoa za montažnu kućicu u iznosu od 5.658,13 eura, što predstavlja 99,97% planiranog iznosa od 5.660,00 eura
- ✚ nabava i montaža prijenosne kućice u iznosu od 15.500,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 15.500,00 eura.

8.2. TEKUĆE ULAGANJE:

8.2.1. Naziv ulaganja: **Sanacija trajektne rampe u luci Valbiska**

Opis: Potrebno je izvršiti sanaciju trajektne rampe u luci Valbiska

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini za sanaciju ostvareni su rashodi u iznosu od 14.975,00 eura, što predstavlja 99,83% planiranog iznosa od 15.000,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

- ✚ radovi na sanaciji trajektne rampe u luci Valbiska u iznosu od 14.975,00 eura.

8.2.2. Naziv ulaganja: **Sanacija kameno – betonskog potpornog zida u luci Valbiska**

Opis: Potrebno je izvršiti sanaciju kameno – betonskog potpornog zida u luci Valbiska

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini za izradu projektne dokumentaciju sanacije ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 3.875,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 3.875,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- ✚ usluge izrade glavnog građevinskog projekta s troškovnikom građevinskih radova ii procjenom za sanaciju u luci Valbiska u iznosu od 3.125,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 3.125,00 eura
- ✚ usluge geodetskih radova za potrebe izrade glavnog projekta za sanaciju kameno – betonskog potpornog zida u luci Valbiska u iznosu od 750,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 750,00 eura.

Radovi i usluge za sanaciju kameno – betonskog potpornog zida u luci Valbiska planirani su Financijskim planom za 2025. godinu.

9. LUKA: VRBNIK

OPIS LUKE:

Luka Vrbnik je luka otvorena za javni promet županijskog značaja. Sastoji se od lučkog bazena Sveti Marak koji se sastoji od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu i komunalnog dijela. Jednako tako, luka Vrbnik ima operativni dio luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalom pomorskom prometu kao i komunalni dio i nautički dio luke.

Luka ima:

- ✚ područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem
- ✚ osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom
- ✚ mjesta za opskrbu pitkom vodom
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

9.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

9.1.1. Naziv projekta: **EU projekt – Rekonstrukcija luke Vrbnik – faza L1 L2**

Opis projekta: Faza L1: izvedba novog lukobrana, koji je planiran ispred postojećeg lukobrana Novi porat, na zapadnoj obali luke te zgrade vidikovca s utilitarnim suterenskim prostorijama u korijenu lukobrana. Lukobran je predviđen kao nasuti tipa "Jetty": masivni betonski zid na temeljnom nasipu s unutarnje strane, te kamena obalozaštita - školjera s vanjske strane lukobrana. Pruža se u smjeru približno sjever - jug. Širina partera lukobrana iznosi 4,0 m, a širina valobranog zida 1,6 m.

Faza L2 podrazumijeva izvedbu nove pasarele ispred zapadne prirodne obale luke, koja spaja korijen novoplaniranog lukobrana s postojećim dijelom luke u korijenu uvale. Nova pasarela biti će dužine oko 250 m' i širine 2,60 m, a predviđena je kao raščlanjena armirano-betonska konstrukcija betonske završne obrade, duboko temeljena na bušenim armirano-betonskim „Benotto“ pilotima.

Cilj projekta: Sigurnost i zaštita luke.



Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za EU projekt – Rekonstrukcija luke Vrbnik – faza L1 i L2 ostvareni su u iznosu od 31.500,00 eura, što predstavlja 94,88% planiranog iznosa od 33.200,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- ✚ usluge izrade studija izvodljivosti za pripremu projekta Rekonstrukcije luke Vrbnik – Faza L1 i L2 na natječaj – zaštita lučkog akvatorija i izgradnja komunalnih vezova u iznosu od 31.250,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 31.250,00 eura
- ✚ usluge izrade prilagodbe troškovnika za luku Vrbnik, faza L1 i L2, prema naputcima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 250,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 250,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeće stavke:

- ✚ EU projekt – Rekonstrukcija luke Vrbnik – radovi u iznosu od 500,00 eura
- ✚ EU projekt – Rekonstrukcija luke Vrbnik – usluge stručnog nadzora građenja i koordinator zaštite na radu u iznosu od 300,00 eura
- ✚ EU projekt – Rekonstrukcija luke Vrbnik – usluge projektantskog nadzora u iznosu od 200,00 eura
- ✚ EU projekt – Rekonstrukcija luke Vrbnik – usluge voditelja projekta u iznosu od 200,00 eura
- ✚ EU projekt – Rekonstrukcija luke Vrbnik – usluge administrativnog vođenja projekta (neprihvatljivi troškovi) u iznosu od 200,00 eura
- ✚ EU projekt – Rekonstrukcija luke Vrbnik – usluge promidžbe i vidljivosti u iznosu od 200,00 eura

- ✚ EU projekt – Rekonstrukcija luke Vrbnik – neprihvatljivi troškovi u iznosu od 100,00 eura.

9.2. TEKUĆE ULAGANJE:

9.2.1. Naziv ulaganja: **Sanacija stare rive i lukobrana u luci Vrbnik**

Opis: Zbog oštećenosti potrebno je izvršiti sanaciju stare rive i lukobrana u luci Vrbnik.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini za sanaciju ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 9.412,50 eura, što predstavlja 99,60% planiranog iznosa od 9.450,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- ✚ usluge izrade izvedbenog projekta sanacije stare rive i lukobrana s troškovnikom u luci Vrbnik u iznosu od 375,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 375,00 eura
- ✚ radovi na sanaciji stare rive i lukobrana u luci Vrbnik u iznosu od 8.512,50 eura, što predstavlja 99,56% planiranog iznosa od 8.550,00 eura
- ✚ usluge stručnog nadzora na sanaciji stare rive i lukobrana u luci Vrbnik u iznosu od 525,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 525,00 eura.

10. LUKA: ČIŽIĆI

OPIS LUKE:

Luka Čižići je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Sastoji se od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, kao i komunalnog dijela te nautičkog dijela luke.

Luka ima:

- ✚ osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

10.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

10.1.1. Naziv projekta: **Dogradnja primarnog lukobrana u luci Čižići**

Opis projekta: Projektom se planira dogradnja primarnog lukobrana u luci Čižići radi zaštite i sigurnosti akvatorija.

Cilj projekta: Sigurnost i zaštita luke.

Vrijednost projekta: I. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu planirani su rashodi u iznosu od 6.125,00 eura za usluge izrade idejnog rješenja za dogradnju primarnog lukobrana u luci Čižići. II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu rashodi više nisu planirani, već su sredstva za izradu projektne dokumentacije planirana Financijskim planom za 2025. godinu.

10.2. TEKUĆE ULAGANJE:

10.2.1. Naziv ulaganja: **Sanacija lukobrana i betonske hodne ploče u južnom dijelu luke Čižići**

Opis: Potrebno je izvršiti sanaciju betonskih hodnih ploča na lukobranu i sanaciji betonske hodne ploče u južnom dijelu luke u luci Čižići.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.



Vrijednost: U 2024. godini ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 22.071,25 eura, što predstavlja 99,76% planiranog iznosa od 22.125,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće usluge i radove:

- ✚ usluge izrade tehničkog rješenja i troškovnika za sanaciju betonskih hodnih ploča na lukobranu i sanaciji betonske hodne ploče u južnom dijelu luke u luci Čižići u iznosu od 1.375,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.375,00 eura

- ✚ radovi na sanaciji betonskih hodnih ploča na lukobranu i sanaciji betonske hodne ploče u južnom dijelu luke u luci Čižići u iznosu od 19.946,25 eura, što predstavlja 99,73% planiranog iznosa od 20.000,00 eura
- ✚ usluge stručnog nadzora na sanaciji betonskih hodnih ploča na lukobranu i sanaciji betonske hodne ploče u južnom dijelu luke u luci Čižići u iznosu od 750,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 750,00 eura.

11. LUKA: DUNAT

OPIS LUKE:

Luka Dunat je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Sastoji se od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, te komunalnog i nautičkog dijela luke.

Luka ima:

- ✚ Područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem
- ✚ Osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom
- ✚ Mjesta za opskrbu pitkom vodom
- ✚ Jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ Jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

12. LUKA: GLAVOTOK

OPIS LUKE:

Luka Glavotok je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Sastoji se od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu te komunalnog dijela luke.

Luka ima:

- ✚ područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

12.1. TEKUĆE ULAGANJE:


12.1.1. Naziv ulaganja: **Sanacija istezališta u luci Glavotok**

Opis: Potrebno je izvršiti sanaciju istezališta u luci Glavotok.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 11.983,26 eura, što predstavlja 89,09% planiranog iznosa od 13.450,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće:

- ✚ radovi na sanaciji istezališta u luci Glavotok u iznosu od 11.983,26 eura.

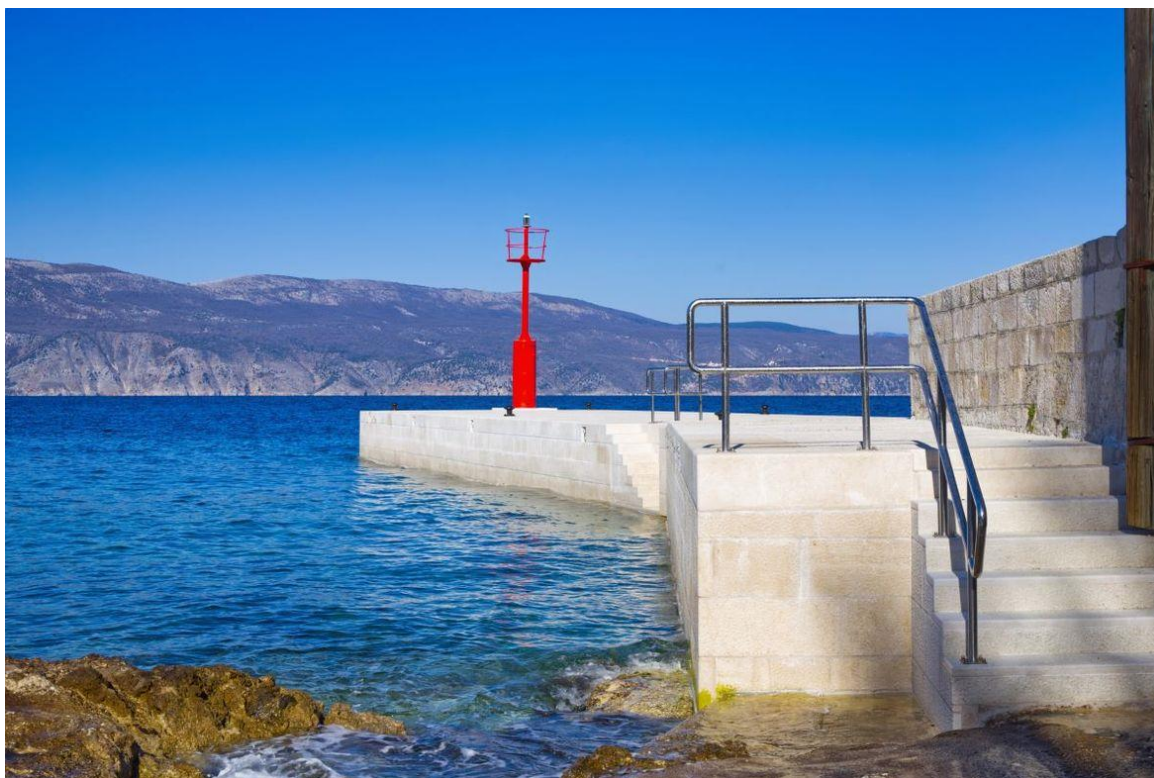

13. LUKA: KLIMNO

OPIS LUKE:

Luka Klimno je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Sastoji se od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, komunalnog te nautičkog dijela luke, kao i sidrišta u funkciji nautičkog dijela luke za privez brodica.

Luka ima:

- ✚ osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i mjesta za opskrbu pitkom vodom
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

13.1. TEKUĆE ULAGANJE:

13.1.1. Naziv ulaganja: **Radovi na produbljivanju akvatorija luke Klimno**

Opis: Ovim projektom planira se produbljivanje akvatorija krajnjeg jugozapadnog dijela luke. Lokacija zahvata je privezište na jugozapadnom dijelu luke Klimno. Tlocrtna površina zahvata na podmorskom iskopu iznosi 2.416,21 m². Radovi na produbljivanju akvatorija luke Klimno odnose se na podmorski iskop muljevitog materijala do dubine -2,00 m.n.m te transport i odlaganje materijala iz podmorskog iskopa na deponiju.

Cilj: Svrha ovog projekta je osigurati dovoljnu dubinu dna akvatorija luke Klimno radi sigurnosti uplovljavanja i isplavljavanja plovnih objekata.



Vrijednost: U 2024. godini ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 3.926,48 eura, što predstavlja 99,99% planiranog iznosa od 3.927,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- ✚ usluge izrade idejnog projekta za produbljivanje akvatorija luke Klimno u iznosu od 3.301,48 eura, što predstavlja 99,98% planiranog iznosa od 3.302,00 eura
- ✚ usluge za geodetske radove za potrebe izrade idejnog projekta za produbljivanje akvatorija luke Klimno u iznosu od 625,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 625,00 eura.

Radovi na produbljivanju akvatorija luke Klimno planirani su Financijskim planom za 2025. godinu.

14. LUKA: LOKVIŠĆA

OPIS LUKE:

Luka Lokvišća je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Sastoji se od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, kao i komunalnog te nautičkog dijela luke.

Luka ima:

- ✚ područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem
- ✚ osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom
- ✚ mjesta za opskrbu pitkom vodom
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

15. LUKA: NJIVICE

OPIS LUKE:

Luka Njivice je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Sastoji se od dva lučka bazena od kojih bazen Pod Rov ima sidrište u funkciji nautičkog dijela luke. Jednako tako, luka Njivice ima operativni dio luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu kao i komunalni te nautički dio luke.

Luka ima:

- ✚ osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom
- ✚ mjesta za opskrbu pitkom vodom
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

15.1. TEKUĆE ULAGANJE:

15.1.1. Naziv ulaganja: **Sanacija hodne površine stare rive u luci Njivice**

Opis: Zbog oštećenosti hodne površine planira se sanacija hodne površine u luci Njivice.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 6.500,00 eura, što predstavlja 99,62% planiranog iznosa od 6.525,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- + usluge izrade troškovnika u iznosu od 375,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 375,00 eura
- + radovi na sanaciji hodne površine u luci Njivice u iznosu od 5.775,00 eura, što predstavlja 99,57% planiranog iznosa od 5.800,00 eura
- + usluge stručnog nadzora na sanaciji hodne površine u luci Njivice u iznosu od 350,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 350,00 eura.

15.1.2. Naziv ulaganja: **Sanacija hodne površine lukobrana u luci Njivice**

Opis: Zbog oštećenosti hodne površine planira se sanacija hodne površine lukobrana u luci Njivice.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.



Vrijednost: U 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 875,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 875,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

- + usluge izrade troškovnika na sanaciji hodne površine lukobrana u luci Njivice u iznosu od 875,00 eura.

Radovi na sanaciji planirani su Financijskim planom za 2025. godinu.

15.1.3. Naziv ulaganja: **Sanacija mostića u luci Njivice**

Opis: Zbog oštećenosti planira se sanacija mostića u luci Njivice.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 625,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 625,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

- ✚ usluge izrade troškovnika na mostića u luci Njivice u iznosu od 625,00 eura.

Radovi na sanaciji planirani su Financijskim planom za 2025. godinu.

16. LUKA: PORAT

OPIS LUKE:

Luka Porat je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Sastoji se od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu kao i komunalnog te nautičkog dijela luke.

Luka ima:

- ✚ područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem
- ✚ osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom
- ✚ osigurana mjesta za opskrbu pitkom vodom
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

16.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

16.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke Porat – I faza – uporabna cjelina 3 (valobran)**

Opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija u luci Porat na I fazi – uporabna cjelina 3 u svrhu montaže valobrana za zaštitu luke. I faza je podijeljena na 3 uporabne cjeline od kojih su 2 uporabne cjeline već napravljene. Izrada projektne dokumentacije je planirana u 2023. godini i planira se nastaviti u 2024. godini.

Cilj projekta: Postavljanje valobrana radi sigurnosti luke.



Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za projekt Rekonstrukcija luke Porat – I faza – uporabna cjelina 3 (valobran) ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.250,00 eura, što predstavlja 42,02% planiranog iznosa od 14.875,00 eura. Rashodi se odnose na usluge izrade sljedeće projektne dokumentacije:

- ✚ usluge izrade izmjene idejnog projekta u iznosu od 6.250,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 6.250,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeće stavke:

- ✚ usluge izrade geodetskih radova za izradu izmjene i dopune idejnog projekta, te ishođenje izmjene i dopune lokacijske dozvole Rekonstrukcije luke Porat u iznosu od 625,00 eura
- ✚ usluge izrade geodetskog elaborata za provedbu lokacijske dozvole za rekonstrukciju luke Porat u iznosu od 2.500,00 eura
- ✚ usluge izrade ažuriranja maritimne studije rekonstrukcije luke Porat u iznosu od 4.750,00 eura
- ✚ usluge izrade geodetskog elaborata za formiranje čestice za luku Porat za I. fazu u iznosu 750,00 eura.

Navedene neizvršene usluge planirat će se u izmjeni financijskog plana za 2025. godinu.

Nakon izrade projektne dokumentacije i ishođenja potrebnih dozvola planirati će se nabava i montaža valobrana u luci Porat.

16.2. TEKUĆE ULAGANJE:

16.2.1. Naziv ulaganja: **Sanacija podmorskog dijela obalnog zida na istočnoj strani luke Porat**

Opis: Planira se sanacija podmorskog dijela obalnog zida na istočnoj strani luke Porat.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 48.728,40 eura, što predstavlja 98,19% planiranog iznosa od 49.625,00 eura. Rashodi se odnose za sljedeće radove i usluge:

-  izrada izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom u iznosu od 3.000,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 3.000,00 eura
-  radovi na sanaciji podmorskog dijela obalnog zida na istočnoj strani luke Porat u iznosu od 44.103,40 eura, što predstavlja 98,01% planiranog iznosa od 45.000,00 eura
-  usluge stručnog nadzora za radove na sanaciji podmorskog dijela obalnog zida na istočnoj strani luke Porat u iznosu od 1.625,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.625,00 eura.

16.2.2. Naziv ulaganja: **Nadokup povećanja snage električne energije na istočnom dijelu luke Porat**

Opis: Planira se nadokup povećanja snage električne energije 11kWh na istočnom dijelu luke Porat.

Cilj: Pružanje usluga korisnicima luke.

Vrijednost: U 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 1.666,38 eura, što predstavlja 62,76% planiranog iznosa od 2.655,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

-  nadokup povećanja snage električne energije 11kWh na istočnom dijelu luke Porat u iznosu od 1.666,38 eura.

17. LUKA: ROVA

OPIS LUKE:

Luka Rova je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Sastoji se od komunalnog dijela luke.

Luka ima:

- ✚ jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada



18. LUKA: SOLINE

OPIS LUKE:

Luka Soline je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Sastoji se od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu kao i komunalnog te nautičkog dijela.

Luka ima:

- ✚ osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom
- ✚ osigurana mjesta za opskrbu pitkom vodom

- ✚ jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada



19. LUKA: STARA BAŠKA

OPIS LUKE:

Luka Stara Baška je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Sastoji se od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, komunalnog dijela luke kao i sidrišta u funkciji nautičkog dijela luke.

Luka ima:

- ✚ područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

19.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

19.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke Stara Baška**

Opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija luke Stara Baška.

Cilj projekta: Uređenje u luci Stara Baška poduzima se u svrhu razvoja i sigurnosti luke.

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za projekt Rekonstrukcija luke Stara Baška ostvareni su ukupnom iznosu od 2.562,50 eura, što predstavlja 15,67% planiranog iznosa od 16.350,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

- ✚ usluga izrade geodetske podloge za izradu idejnog rješenja za rekonstrukciju luke Stara Baška u iznosu od 2.562,50 eura, što predstavlja 98,56% planiranog iznosa od 2.600,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeću stavku:

- ✚ usluga izrade idejnog rješenja i vjetrovalne studije s numeričkim modelom deformacije valova za rekonstrukcije luke Stara Baška u iznosu od 13.750,00 eura.

Navedena neizvršena usluga planirat će se u izmjeni financijskog plana za 2025. godinu, na temelju sklopljenog ugovora.

19.2. TEKUĆE ULAGANJE:

19.2.1. Naziv ulaganja: **Sanacija rive i lukobrana u luci Stara Baška**

Opis: Zbog oštećenosti planira se sanacija rive i lukobrana u luci Stara Baška.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 61.332,50 eura, što predstavlja 99,97% planiranog iznosa od 61.350,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće radove i usluge:

- ✚ izrada izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom u iznosu od 2.000,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 2.000,00 eura
- ✚ radovi na sanaciji rive i lukobrana u iznosu od 57.457,50 eura, što predstavlja 99,97% planiranog iznosa od 57.475,00 eura
- ✚ usluge stručnog nadzora za radove na sanaciji rive i lukobrana u iznosu od 1.875,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.875,00 eura.



19.2.2. Naziv ulaganja: **Sanacija anela u luci Stara Baška**

Opis: Planira se sanacija anela u luci Stara Baška.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 2.625,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 2.625,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

✚ radovi na sanaciji anela u luci Stara Baška u iznosu od 2.625,00 eura.

20. LUKA: SVETA FUSKA

OPIS LUKE:

Luka Sv. Fuska je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Sastoji se od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu kao i komunalnog i nautičkog dijela luke.

Luka ima:

- ✚ područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata dizalicom
- ✚ područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem

- ✚ osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

20.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

20.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke Sveta Fuska**

Opis projekta: Projektom se planira rekonstrukcija luke Sveta Fuska.

Cilj projekta: Uređenje u luci Sveta Fuska poduzima se u svrhu razvoja i sigurnosti luke.

Vrijednost projekta: I. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu planirani su rashodi u iznosu od 7.000,00 eura za usluge izrade idejnog rješenja i vjetrovalne studije s numeričkim modelom deformacije valova za rekonstrukcije luke Sveta Fuska. II. izmjenom Financijskog plana za 2024. godinu navedene usluge nisu planirane, već su planirane Financijskim planom za 2025. godinu.

20.1.2. Naziv projekta: **Nabava i montaže dizalice u luci Sveta Fuska**

Opis projekta: Ovim zahvatom izvršena je nabava i montaža dizalice u luci Sveta Fuska u 2023. godini, te je potrebno izvršiti atestiranje i izdavanje dozvole za rad.

Cilj projekta: Uređenje u luci Sveta Fuska poduzima se u svrhu razvoja i sigurnosti luke.



Vrijednost projekta: U 2024. godini ostvareni su rashodi za projekt Nabava i montaža dizalice u luci Sveta Fuska u iznosu od 625,00 eura, što predstavlja 100% planiranog iznosa od 625,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeću stavku:

- ✚ usluge atestiranja dizalice i izdavanje dozvole za rad dizalice u luci Sveta Fuska u iznosu od 625,00 eura.

Stavljanje projekta u uporabu: Projekt Nabava i montaža dizalice u luci Sveta Fuska započeo je 2023. godine izradom projektne dokumentacije, te nabavom i montažom. Primorsko-goranska županija je temeljem sklopljenog ugovora sufinancirala nabavu i montažu dizalice u iznosu od 13.250,00 eura u 2023. godini. U 2024. godini izvršeno je atestiranje dizalice i izdavanje dozvole za rad. Početkom 2024. godine, dizalica je stavljena u uporabu.


Rashodi projekta stavljenog u uporabu, kao i sufinanciranje, slijedeći su:

Rashodi	Iznos (u EUR)	Struktura
Radovi	11.522,73	19,97%
Roba	36.187,50	62,73%
Usluge	9.978,00	17,30%
UKUPNO	57.688,23	

Izvori su/financiranja projekta su sljedeći:

Izvor sredstava	Iznos (u EUR)	Struktura
Primorsko-goranska županija	13.250,00	22,97%
Županijska lučka uprava Krk	44.438,23	77,03%
UKUPNO	57.688,23	

Izvori su/financiranja projekta

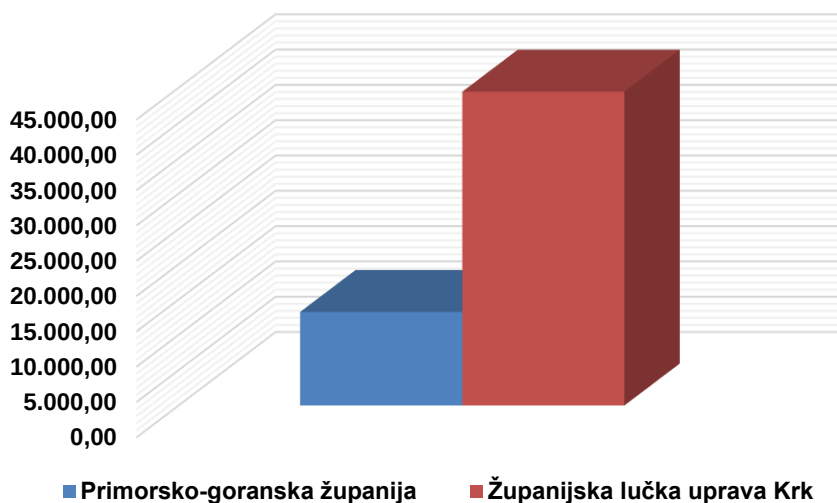

20.2. TEKUĆE ULAGANJE:

20.2.1. Naziv ulaganja: **Sanacija AB ploča rive**

Opis: Planira se sanacija dvije AB ploče rive u luci Sveta Fuska.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 44.824,75 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 44.825,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće radove i usluge:

- ✚ izrada tehničkog rješenja sanacije s troškovnikom u iznosu od 500,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 500,00 eura
- ✚ radovi na sanaciji dvije AB ploče rive u iznosu od 42.824,75 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 42.825,00 eura
- ✚ usluge stručnog nadzora za radove na sanaciji dvije AB ploče u iznosu od 1.500,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.500,00 eura.

20.2.2. Naziv ulaganja: **Sanacija pasarele u luci Sveta Fuska**

Opis: Planira se sanacija pasarele u luci Sveta Fuska.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 27.705,00 eura, što predstavlja 97,21% planiranog iznosa od 28.500,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće radove i usluge:

- + izrada tehničkog rješenja sanacije s troškovnikom u iznosu od 500,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 500,00 eura
- + radovi na sanaciji pasarele u iznosu od 26.205,00 eura, što predstavlja 97,06% planiranog iznosa od 27.000,00 eura
- + usluge stručnog nadzora za radove na sanaciji pasarele u iznosu od 1.000,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.000,00 eura.

20.2.3. *Naziv ulaganja:* **Sanacija podmorskog i nadmorskog dijela rive u luci Sveta Fuska**

Opis: Planira se sanacija podmorskog i nadmorskog dijela rive u luci Sveta Fuska.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godini ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 62.455,01 eura, što čini 107,57% planiranog iznosa od 58.050,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće radove i usluge:

- + izrada tehničkog rješenja sanacije s troškovnikom u iznosu od 1.750,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.750,00 eura
- + radovi na sanaciji podmorskog i nadmorskog dijela rive u luci Sveta Fuska u iznosu od 59.195,01 eura, što predstavlja 108,02% planiranog iznosa od 54.800,00 eura
- + usluge stručnog nadzora za radove na sanaciji podmorskog i nadmorskog dijela rive u luci Sveta Fuska u iznosu od 1.500,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.500,00 eura.

21. LUKA: VANTAČIĆI

OPIS LUKE:

Luka Vantačići je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Sastoji se od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu kao i komunalnog te nautičkog dijela luke.

Luka ima:

- + Područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem
- + Osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom
- + Osigurana mjesta za opskrbu pitkom vodom
- + Jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- + Jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

21.1. TEKUĆE ULAGANJE:

21.1.1. Naziv ulaganja: **Sanacija partera lukobrana u luci Vantačići**

Opis: Planira se sanacija partera lukobrana u luci Vantačići.

Cilj: Održavanje i sigurnost u luci.

Vrijednost: U 2024. godinu ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 6.981,21 eura, što predstavlja 99,95% planiranog iznosa od 6.985,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće radove i usluge:

- + izrada izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom u iznosu od 2.000,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 2.000,00 eura
- + radovi na sanaciji partera lukobrana u luci Vantačići u iznosu od 4.481,21 eura, što predstavlja 99,92% planiranog iznosa od 4.485,00 eura
- + usluge stručnog nadzora za radove na sanaciji partera lukobrana u luci Vantačići u iznosu od 500,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 500,00 eura.



22. LUKA: VELA JANA

OPIS LUKE:

Luka Vela Jana je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Sastoji se od operativnog dijela luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, komunalnog dijela te sidrišta u funkciji nautičkog dijela luke.

Luka ima:

- + Područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem
- + Jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada


- ✚ Jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

22.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

22.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija luke Vela Jana**

Opis projekta: U sklopu rekonstrukcije luke Vela Jana planira se ojačanje konstrukcije izvedenih spremišta, uklanjanje dva sjeveroistočna gata te izgradnja novih na tom dijelu, proširenje i produženje postojećeg istezališta za plovila, proširenje kolne površine sa zapadne strane istezališta radi omogućavanja lakšeg okretanja vozila te izvedbe novog obalnog zida u tom dijelu, izvedba spojne ceste u korijenu uvale kako bi se mogle prometno spojiti dvije strane uvale koje u današnjem stanju to nisu, uređenje novog obalnog platoa u dijelu na divlje uređenih mulića koji čine manje mandračke na istočnoj strani uvale, te uklanjanje dva izvedena gata na istočnoj strani uvale i izgradnja dva nova gata na približnim položajima izvedenih gatova.

Cilj projekta: Projekt je planiran radi proširenja lučkih kapaciteta i povećanja broja komunalnih i nautičkih vezova.

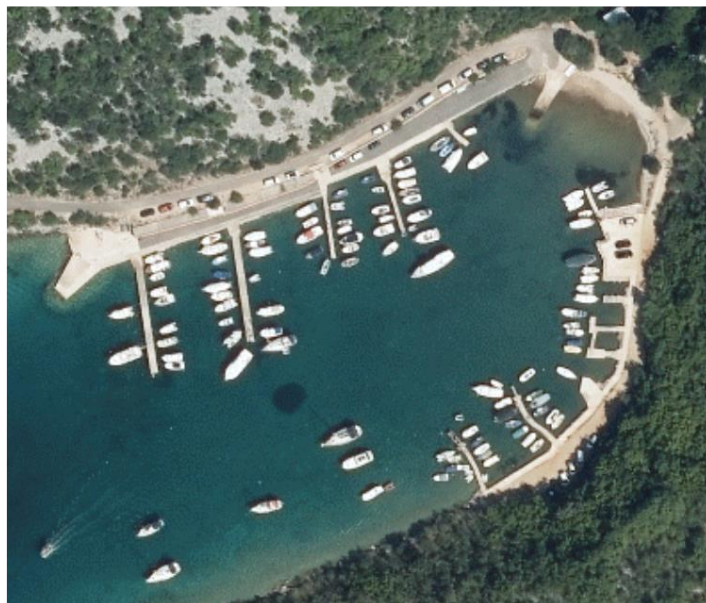

Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za projekt 2024. godinu ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 6.800,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 6.800,00 eura. Rashodi se odnose na sljedeće stavke:

- ✚ usluge revizije glavnog projekta rekonstrukcije luke Vela Jana u iznosu od 2.450,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 2.450,00 eura
- ✚ usluge izrade geodetskih radova za potrebe izrade glavnog projekta rekonstrukcije luke Vela Jana u iznosu od 4.350,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 4.350,00 eura.

U Financijskom planu za 2025. godinu, koji uključuje i projekcije za 2026. i 2027. godinu, planirana su sredstva za provedbu projekta Rekonstrukcija luke Vela Jana.

23. LUKA: VOZ

OPIS LUKE:

Luka Voz je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Sastoji se od dva lučka bazena te ima operativni dio luke u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu.

Luka ima:

- ✚ jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada
- ✚ jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada

23.1. INVESTICIJSKO ULAGANJE:

23.1.1. Naziv projekta: **Rekonstrukcija operativnog gata u luci Voz**

Opis projekta: Rekonstrukcija operativnog gata u luci Voz – „ribarska luka” - Unutar zahvata u prostoru smješten je postojeći operativni gat koji je dio luke otvorene za javni promet lokalnog značaja. Rekonstrukcija podrazumijeva uklanjanje kompletnog postojećeg operativnog gata te na njegovom mjestu izgradnja novog operativnog gata dužine 35,00 m i širine 6,50 m. Konstrukcija novog gata planirana je kao raščlanjena konstrukcija temeljena na dva reda „Benotto“ pilota. Također se planira dogradnja masivnog obalnog zida u korijenu gata, izvedba zaštitne betonske obloge postojećeg zida u korijenu gata te uklapanje novog gata u postojeći teren.

Od opreme na operativnom gatu planirano je montiranje novih polera, mornarskih ljestvi te energetskih ormarića za opskrbu brodica vodom i strujom.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 682.116,80 eura bez PDV-a odnosno 852.646,00 eura sa PDV-om.

Cilj projekta: Rekonstrukcija operativnog gata u luci Voz – „ribarska luka” poduzima se u cilju omogućavanja sigurnog ukrcajno iskrcajnog mjesta za ribare i za privez ribarskih brodova.



Vrijednost projekta: Ukupni rashodi za projekt Rekonstrukcija operativnog gata u luci Voz – „ribarska luka“ ostvareni su u ukupnom iznosu od 12.500,00 eura, što predstavlja 42,97% planiranog iznosa od 29.090,00 eura. Rashodi se odnose se na sljedeće stavke:

- + usluge izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz u iznosu od 11.000,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 11.000,00 eura
- + usluge revizije za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz u iznosu od 1.500,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.500,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeću stavku:

- + usluge pripreme poslovnog plana za javljanje na natječaj Ministarstva poljoprivrede, Uprava za ribarstvo, za rekonstrukciju operativnog gata u luci Voz u iznosu od 16.590,00 eura.

INVESTICIJE U UPORABU

U 2024. godini su se sljedeće investicije stavile u uporabu u iznosu od 5.865.847,73 eura:

- ✚ Rekonstrukcija luke Baška – I. i II. faza u iznosu od 4.087.875,98 eura, odnosno 4.197.423,50 eura uključujući opremu
- ✚ Rekonstrukcija luke Baška – III. faza u iznosu od 1.324.441,99 eura, odnosno 1.375.389,43 eura uključujući opremu
- ✚ Rekonstrukcija luke Baška – III. faza – sidreni sustav u iznosu od 235.346,57 eura
- ✚ Nabava i montaža dizalice u luci Sveta Fuska u iznosu od 57.688,23 eura.

KOMUNALNA OPREMA

U lukama na području Županijske lučke uprave Krk ostvareni su rashodi u iznosu od 55.571,19 eura, što predstavlja 94,76% planiranog iznosa od 58.642,00 eura. Rashodi se odnose na nabavu sljedeće komunalne opreme:

- ✚ „pametni“ ormarići (2 komada) u iznosu od 17.112,50 eura, što predstavlja 99,96% planiranog iznosa od 17.120,00 eura
- ✚ nabava i montaža New Jersey ograde u luci Valbiska u iznosu od 6.623,88 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 6.624,00 eura
- ✚ nabava i montaža inox ograde u luci Šilo u iznosu od 2.553,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 2.553,00 eura
- ✚ modernizacija lučkog svjetla u luci Klimno (glava lukobrana s ugradnjom samostalnog LED svjetla) u iznosu od 1.750,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.750,00 eura
- ✚ ograda na kuli lučkog svjetla u luci Klimno u iznosu od 1.825,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.825,00 eura
- ✚ nabava i montaža rasvjetnih stupova (5 komada) u luci Lokvišća u iznosu od 4.993,75 eura, što predstavlja 99,88% planiranog iznosa od 5.000,00 eura
- ✚ nabava i montaža betonske klupice i stol u luci Vela Jana u iznosu od 1.397,50 eura, što predstavlja 99,82% planiranog iznosa od 1.400,00 eura
- ✚ nabava i postavljanje rampe u luci Valbiska u iznosu od 3.061,06 eura, što predstavlja 98,75% planiranog iznosa od 3.100,00 eura
- ✚ nabava i postavljanje rampe u luci Sveta Fuska u iznosu od 2.597,50 eura, što predstavlja 99,90% planiranog iznosa od 2.600,00 eura
- ✚ nabava, doprema i ugradnja ormarića hidrantskog ormarića na gatu Garofulin u luci Baška u iznosu od 2.683,69 eura, što predstavlja 99,95% planiranog iznosa od 2.685,00 eura

- + nabava, doprema i ugradnja ormarića hidrantskog ormarića u luci Porat u iznosu od 940,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 940,00 eura
- + izrada i montaža nadstrešnice uz objekt lučkih redara u luci Valbiska u iznosu od 2.137,50 eura, što predstavlja 99,88% planiranog iznosa od 2.140,00 eura
- + izrada spremišta za skladištenje lanaca u luci Omišalj u iznosu od 3.167,81 eura, što predstavlja 99,93% planiranog iznosa od 3.170,00 eura
- + nabava i montaža inox ograde za Rekonstrukciju luke Baška – 3. faza u iznosu od 3.209,25 eura, što predstavlja 99,98% planiranog iznosa od 3.210,00 eura
- + izrada, dostava i ugradnja gazišta za Rekonstrukciju luke Baška – 3. faza u iznosu od 393,75 eura, što predstavlja 98,44% planiranog iznosa od 400,00 eura
- + nabava kolica za izvlačenje plovila sa sajlom u luci Baška (2 komada) u iznosu od 1.125,00 eura, što čini 100% planiranog iznosa od 1.125,00 eura.

U Financijskom planu za 2024. godinu planirana su sredstva koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine, a odnose se na sljedeću stavku:

- + nabava i montaža kamenih klupica na operativnom gatu u luci Glavotok planirana je u iznosu od 3.000,00 eura.

SKLADIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU

U luci Valbiska i Omišalj ostvareni su rashodi za nabavu brodskih kontejnera u iznosu od 8.250,00 eura, što predstavlja 100% planiranog iznosa.

SUSTAV VIDEONADZORA

U lukama na području Županijske lučke uprave Krk ostvareni su rashodi za sustav videonadzora u iznosu od 3.311,25 eura, što predstavlja 55,19% planiranog iznosa od 6.000,00 eura.

ODRŽAVANJE POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE U LUKAMA NA PODRUČJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK

Na području luka Županijske lučke uprave Krk ostvareni su rashodi za održavanje ostale postojeće infrastrukture, koja nisu navedene pojedinačno po lukama, u iznosu od 18.131,25 eura, što predstavlja 68,30% planiranog iznosa od 26.545,00 eura. Za čišćenje lučkog područja u lukama ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 102.067,75 eura, što predstavlja 97,21% planiranog iznosa od 104.998,00 eura.

VODNI DOPRINOS

U 2024. godini ostvareni su rashodi za vodni doprinos po građevinskim dozvolama za Rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 1 – primarni lukobran u iznosu od 1.379,27 eura te komunalni doprinos po građevinskim dozvolama za Rekonstrukciju luke Vrbnik za fazu L1 i L2 u iznosu od 972,26 eura. Ukupno rashodi iznose 2.351,53 eura što je 88,57% planiranog iznosa od 2.655,00 eura.




UKUPNO ULAGANJE U PROJEKTE, OPREMU I ODRŽAVANJE U LUKAMA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK U 2024. GODINI

U sljedećem tabelarnom i grafičkom prikazu su ostvareni iznosi ulaganja u projekte, opremu i održavanje u 2024. godini.

Luka	Planirani iznos ulaganja u 2024. godini (u EUR)	Planirani iznos ulaganja u 2024. godini I. izmjenom plana (u EUR)	Planirani iznos ulaganja u 2024. godini II. izmjenom plana (u EUR)	Ostvareni iznosi ulaganja u 2024. godini (u EUR)	Udio
Krk	238.169,00	463.235,00	455.845,00	349.580,86	17,68%
Baška	52.640,00	1.220.834,00	1.121.423,00	879.295,84	44,48%
Čižići	20.000,00	28.250,00	22.125,00	22.071,25	1,12%
Glavotok	10.000,00	10.000,00	13.450,00	11.983,26	0,61%
Klimno	103.000,00	106.302,00	3.927,00	3.926,48	0,20%
Malinska	14.000,00	266.808,00	81.806,00	34.517,50	1,75%
Njivice	7.000,00	6.525,00	8.025,00	8.000,00	0,40%
Omišalj	376.540,00	413.012,00	64.897,00	29.208,75	1,48%
Omišalj (bazen Lučica)	5.000,00	5.000,00	7.940,00	2.937,50	0,15%
Porat	75.725,00	85.905,00	67.155,00	56.644,78	2,87%
Punat	194.255,00	310.290,00	191.811,00	147.956,54	7,48%
Stara Baška	45.750,00	77.725,00	80.325,00	66.520,00	3,36%
Sveta Fuska	67.700,00	125.950,00	132.000,00	135.599,76	6,86%
Šilo	102.425,00	104.125,00	58.165,00	57.162,50	2,89%
Valbiska	15.000,00	36.785,00	40.535,00	40.508,13	2,05%
Vantačići	30.000,00	6.985,00	6.985,00	6.981,21	0,35%
Vela Jana	312.000,00	318.800,00	6.800,00	6.800,00	0,34%
Voz	0,00	30.079,00	29.090,00	12.500,00	0,63%
Vrbnik	56.300,00	42.400,00	42.650,00	40.912,50	2,07%
Luke na području ŽLU Krk - ostalo	56.370,00	76.980,00	66.892,00	63.821,19	3,23%
UKUPNO	1.781.874,00	3.735.990,00	2.501.846,00	1.976.928,05	


Ostvareni iznos ulaganja u projekte, opremu i održavanje u lukama Županijske lučke uprave Krk u 2024. godini

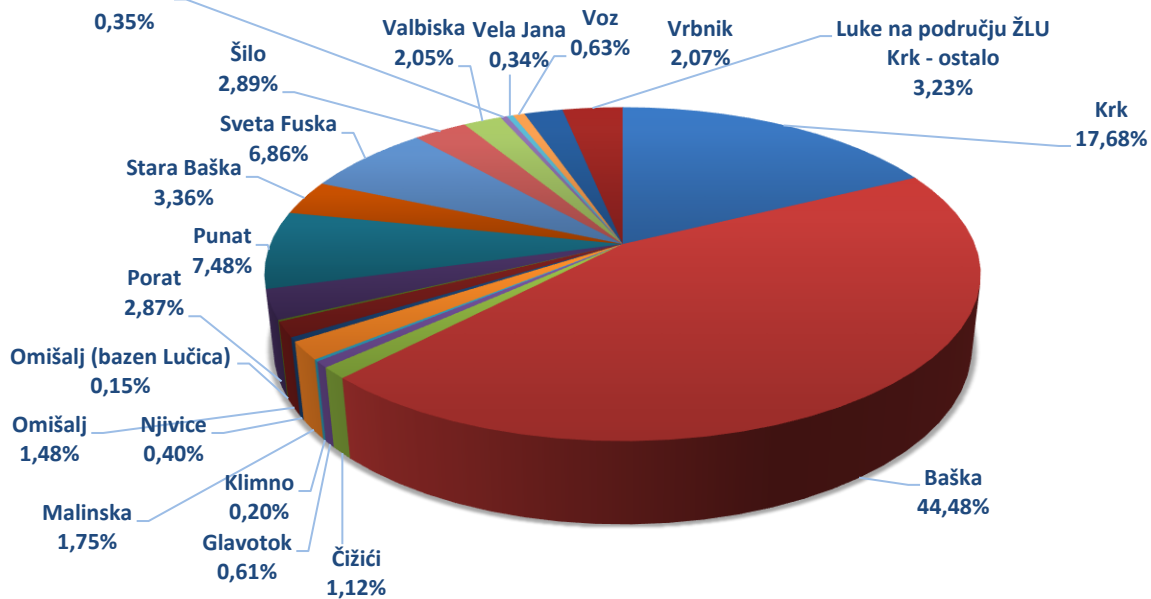

- Prikaz ulaganja u projekte i opremu te održavanje lučkog područja

Opis	II. izmjena Financijskog plana za 2024. godinu	Udio	Ostvarenje Financijskog plana za 2024. godinu	Udio
Ulaganje u projekte i opremu	1.906.274,00	76,19%	1.413.708,47	71,51%
Održavanje lučkog područja	595.572,00	23,81%	563.219,58	28,49%
Ukupno	2.501.846,00		1.976.928,05	

Prikaz ulaganja i održavanja za 2024. godinu

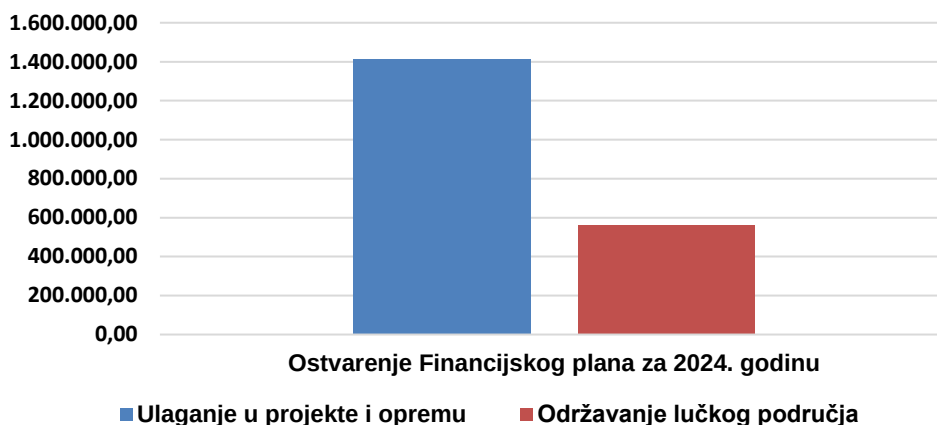


- Izvori su/financiranja ulaganja u projekte i opremu te održavanje lučkog područja

Izvor su/financiranja	Ostvarenje Financijskog plana za 2024. godinu	Udio
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture *	426.892,02	21,59%
Primorsko-goranska županija	280.000,00	14,16/0%
Lokalne samouprave	83.721,19	4,23%
Županijska lučka uprava Krk	1.186.314,84	60,01%
Ukupno	1.976.928,05	

* Napomena: Od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture umanjeno za iznos povrata za EU projekt – Dogradnja luke Baška – 1. i 2. faza u iznosu 9.148,18 eura (uplata sufinanciranja iznosi 436.040,20 eura).



Izvori su/financiranja ulaganja u imovinu i opremu i održavanje lučkog područja za 2024. godinu



Luka Krk

6. IZVJEŠĆE O PREDSTAVKAMA

U 2024. godini zaprimljeno je ukupno 16 predstavki od kojih ih je svih 16 riješeno.

Redni broj	Zaprimljena predstavka od	Predstavka u rješavanju (Da/Ne)	Riješena predstavka (Da/Ne)	Predmet Inspekcijskog Nadzora (Da/Ne)	Način na koji je riješena
1.	Jurković Gordana	Ne	Da	Ne	Očitovanje od 16.09.2024.
2.	Ivančić Dušan	Ne	Da	Ne	Očitovanje od 13.09.2024.
3.	Ivanišević Stjepan	Ne	Da	Ne	Očitovanje od 26.09.2024.
4.	Čajkovski Domagoj	Ne	Da	Ne	Očitovanje od 07.10.2024.
5.	Kabalin Ana	Ne	Da	Ne	Očitovanje od 07.10.2024.
6.	Balog Marino	Ne	Da	Ne	Očitovanje od 07.10.2024.
7.	Cuculić Ozren	Ne	Da	Ne	Očitovanje od 07.10.2024.
8.	Sobol Dalibor	Ne	Da	Ne	Očitovanje od 07.10.2024.
9.	Valerijev Dražen	Ne	Da	Ne	Očitovanje od 07.10.2024.
10.	Odvjetnički ured Vesna Matoković	Ne	Da	Ne	Očitovanje od 29.10.2024.
11.	Ljubić Đuro	Ne	Da	Ne	Očitovanje od 25.11.2024.
12.	Udruga NAUTIKA 2020	Ne	Da	Ne	Očitovanje od 09.01.2025.
13.	Buljat i partneri j.t.d.	Ne	Da	Ne	Očitovanje od 18.03.2024.
14.	Općina Omišalj - anonimna predstavka	Ne	Da	Ne	Očitovanje od 17.07.2024.
15.	Gorenc Julka	Ne	Da	Ne	Očitovanje od 02.05.2024.
16.	Odvjetnik Danijela Toth	Ne	Da	Ne	Očitovanje od 07.11.2024.

7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA NABAVE

U 2024. godini ravnatelj je donio Plan nabave i XIV. izmjena i dopuna Plana nabave Županijske lučke uprave za 2024. godinu.

Plan nabave nije u cijelosti izvršen pod slijedećim evidencijskim brojevima:

- EV-M-28/24 – Nabava usluge najma video nadzora u lukama pod nadležnošću Županijske lučke uprave Krk – postupak nije proveden zbog odustajanja od pokretanja predmetne nabave,
- EV-M-133/24 - Nabava izvođenja radova na rekonstrukciji luke Krk– postupak nije proveden pod navedenim evidencijskim brojem zbog nemogućnosti objave postupka u 2025. godini s EOJN evidencijskim brojem nabave iz 2024. godine.

U Planu nabave Županijske lučke uprave Krk izvršeno je brisanje određenih stavki uslijed ne ishođenja potrebnih dozvola za daljnju provedbu projekata u 2024. godini. Ove stavke planirane su iznova u Financijskom planu Županijske lučke uprave Krk za 2025. godinu. Sve izmjene i dopune Plana nabave Županijske lučke uprave Krk za 2024. godinu usklađene su s II. izmjenama Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za 2024. godinu.

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Status nabave
1.	EV-M-01/24	Nabava usluge čišćenja lučkog područja u luci Njivice	Izvršeno
2.	EV-M-02/24	Nabava usluge čišćenja lučkog područja u luci Omišalj	Izvršeno
3.	EV-M-03/24	Nabava usluge čišćenja lučkog područja u luci Malinska, Vantačić, Porat i Rova	Izvršeno
4.	EV-M-04/24	Nabava usluge čišćenja lučkog područja u luci Krk, Sveta Fuska, Vela Jana i Galvotok	Izvršeno
5.	EV-M-05/24	Nabava usluge čišćenja lučkog područja u luci Punat	Izvršeno
6.	EV-M-06/24	Nabava usluge čišćenja lučkog područja u luci Baška	Izvršeno
7.	EV-M-07/24	Nabava usluge čišćenja lučkog područja u luci Šilo, Klimno, Čižići, Lokvišća i Soline	Izvršeno
8.	EV-M-08/24	Nabava izvođenja podvodnih radova na području Županijske lučke uprave Krk	Izvršeno
9.	EV-M-09/24	Nabava radova na produbljivanju luke Klimno	Brisano
10.	EV-M-10/24	Nabava radova na saniranju podmorskog i nadmorskog dijela obalnog zida rive Obala Marina u luci Krk	Izvršeno
11.	EV-M-11/24	Nabava radova na sanaciji AB ploča obalne konstrukcije u luci Sveta Fuska	Izvršeno
12.	EV-M-12/24	Nabava radova na sanaciji pasarele u luci Sveta Fuska	Izvršeno
13.	EV-M-13/24	Nabava radova na sanaciji trajektne rampe u luci Valbiska	Izvršeno

14.	EV-M-14/24	Nabava radova na sanaciji podmorskog dijela obalnog zida u luci Porat	Izvršeno
15.	EV-M-15/24	Nabava radova na sanaciji hodne površine od škvera prema istezalištu u luci Punat	Izvršeno
16.	EV-M-16/24	Nabava radova na sanaciji istezališta u luci Glavotok	Izvršeno
17.	EV-M-17/24	Nabava radova na sanaciji pasarele u luci Vrbnik	Brisano
18.	EV-M-18/24	Nabava radova na uređenju korijena gata Garofulin u luci Baška	Izvršeno
19.	EV-M-19/24	Nabava vađenja i deponiranja postojećeg pontona i sidrenog sustava plovila u luci Omišalj	Brisano
20.	EV-M-20/24	Nabava radova na sanaciji rive i lukobrana u luci Stara Baška	Poništeno
21.	EV-M-21/24	Nabava radova na sanaciji lukobrana u luci Šilo	Izvršeno
22.	EV-M-22/24	Nabava radova na izradi betonskih hodnih ploča na lukobranu i sanaciji betonske hodne ploče u južnom dijelu luke – luka Čižići	Izvršeno
23.	EV-M-23/24	Nabava radova na sanaciji stare rive i lukobrana u luci Vrbnik	Izvršeno
24.	EV-M-24/24	Nabava radova na sanaciji betonskog partera lukobrana u luci Vantačić	Izvršeno
25.	EV-M-25/24	Nabava radova na sanaciji hodne površine stare rive u luci Njivice	Izvršeno
26.	EV-M-26/24	Nabava usluge promidžbe i informiranja	Izvršeno
27.	EV-M-27/24	Nabava usluge održavanja hortikulture u lukama Čižići i Klimno	Izvršeno
28.	EV-M-28/24	Nabava usluge najma video nadzora u lukama pod nadležnošću Županijske lučke uprave Krk	Nije izvršeno
29.	EV-M-29/24	Nabava usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja s preventivnim zdravstvenim sistematskim pregledom radnika Županijske lučke uprave Krk	Izvršeno
30.	EV-M-30/24	Nabava odvjetničkih usluga i usluga pravne pomoći vezano za sve aspekte Opće uredbe o zaštiti podataka	Izvršeno
31.	EV-M-31/24	Nabava usluge revizije	Izvršeno
32.	EV-M-32/24	Nabava pružanja usluga računovodstvenog servisa	Izvršeno
33.	EV-M-33/24	Nabava usluge nadogradnje i održavanja prostornih i neprostornih baza podataka putem postojećeg sustava za upravljanje prostorom - ATLAS 14	Izvršeno
34.	EV-M-34/24	Nabava usluge sustava zaštite mora u lukama Malinska, Krk i Baška	Brisano
35.	EV-M-35/24	Zajednička nabava za uslugu osiguranja	Izvršeno
36.	EV-M-36/24	Nabava radova na rekonstrukciji luke Vela Jana	Brisano
37.	EV-M-37/24	Nabava radova na rekonstrukciji obalnog zida prema Jazu u luci Malinska	Izvršeno
38.	EV-M-38/24	Nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji dva gata na području Vele vode u luci Punat	Brisano
39.	EV-M-39/24	Nabava radova na uređenju obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice u luci Omišalj (Pesja)	Brisano
40.	EV-M-40/24	Nabava radova na nabavi i montaži plutajućeg pontona u luci Omišalj (Pesja)	Izvršeno

41.	EV-M-41/24	Nabava radova na nabavi i montaži plutajućeg pontonskog gata za pristanište brodske linije u luci Šilo	Izvršeno
42.	EV-M-42/24	Nabava i postavljanje prijenosne montažne kamene kućice za luku Baška	Izvršeno
43.	EV-M-43/24	Nabava i postavljanje energetskog (pametnog) ormarića za struju i vodu u luci Krk	Izvršeno
44.	EV-M-44/24	Nabava i montaža odbojnika na trajektnoj rampi u luci Valbiska	Brisano
45.	EV-M-45/24	Nabava i montaža rasvjetnih stupova u luci Lokvišća	Izvršeno
46.	EV-M-46/24	Nabava usluge izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju dva gata na području Vele vode u luci Punat	Brisano
47.	EV-M-47/24	Nabava usluge hidrografske izmjere nakon izvođenja radova na rekonstrukciji luke Baška – 3. faza	Brisano
48.	EV-M-48/24	Nabava usluge izrade izvedbenog projekta rekonstrukcije luke Vela Jana	Brisano
49.	EV-M-49/24	Nabava usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije luke Porat – I. faza – 3. uporabna cjelina	Brisano
50.	EV-M-50/24	Nabava usluge izmjene i dopune glavnog projekta rekonstrukcije luke Krk – Uporabna cjelina 5 – Obala Marina	Brisano
51.	EV-M-51/24	Nabava usluge izrade maritimne studije za rekonstrukciju luke Krk – Uporabna cjelina 5 – Obala Marina	Brisano
52.	EV-M-52/24	Nabava usluge izrade idejnog rješenja za rekonstrukciju luke Sveta Fуска	Brisano
53.	EV-M-53/24	Nabava usluge izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju luke Porat – I. faza – 3. uporabna cjelina	Brisano
54.	EV-M-54/24	Nabava usluge izrade geotehničkih istražnih radova za potrebe izrade glavnog projekta za uređenje obalnog pojasa na području Pod Gušternu u luci Punat	Brisano
55.	EV-M-55/24	Nabava usluge izrade maritimne studije za uređenje obalnog pojasa na području Pod Gušternu u luci Punat	Brisano
56.	EV-M-56/24	Nabava usluge izrade glavnog projekta za uređenje obalnog pojasa na području Pod Gušternu u luci Punat	Izvršeno
57.	EV-M-57/24	Nabava usluge revizije glavnog projekta za uređenje obalnog pojasa na području Pod Gušternu u luci Punat	Brisano
58.	EV-M-58/24	Nabava usluge izrade izvedbenog projekta za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice	Brisano
59.	EV-M-59/24	Nabava usluge izrade idejnog rješenja i vjetrovalne studije s numeričkim modelom deformacije valova za rekonstrukciju bazena Lučica	Izvršeno


60.	EV-M-60/24	Nabava usluge izrade idejnog rješenja i vjetrovalne studije s numeričkim modelom deformacije valova za rekonstrukciju luke Stara Baška	Izvršeno
61.	EV-M-61/24	Nabava usluge izrade idejnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole za dobavu i montažu plutajućeg pontonskog gata za pristanište trajektne linije u luci Šilo	Izvršeno
62.	EV-M-62/24	Nabava usluge stručnog nadzora na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk	Izvršeno
63.	EV-M-63/24	Nabava usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji luke Vela Jana	Brisano
64.	EV-M-64/24	Nabava usluge koordinatora zaštite na radu na rekonstrukciji luke Vela Jana	Brisano
65.	EV-M-65/24	Nabava usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji obalnog zida prema Jazu u luci Malinska	Brisano
66.	EV-M-66/24	Nabava usluge koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova na rekonstrukciji obalnog zida prema Jazu u luci Malinska	Brisano
67.	EV-M-67/24	Nabava usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji i dogradnji dva gata na području Vele vode u luci Punat	Brisano
68.	EV-M-68/24	Nabava usluge koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji dva gata na području Vele vode u luci Punat	Brisano
69.	EV-M-69/24	Nabava usluge stručnog nadzora nad radovima na nabavi i montaži plutajućeg pontona u luci Omišalj (Pesja)	Brisano
70.	EV-M-70/24	Nabava usluga koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova na nabavi i montaži plutajućeg pontona u luci Omišalj (Pesja)	Brisano
71.	EV-M-71/24	Nabava usluge stručnog nadzora nad radovima na uređenju obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice u luci Omišalj (Pesja)	Brisano
72.	EV-M-72/24	Nabava usluge koordinatora zaštite na radu i izrade plana izvođenja radova na uređenju obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice u luci Omišalj (Pesja)	Brisano
73.	EV-M-73/24	Nabava usluge stručnog nadzora nad radovima na izradi i ugradnji sidrenog sustava plovila na rekonstrukciji luke Baška - 3. faza	Izvršeno
74.	EV-M-74/24	Nabava usluge projektantskog nadzora nad radovima na rekonstrukciji luke Vela Jana	Brisano
75.	EV-M-75/24	Nabava usluge projektantskog nadzora nad radovima na rekonstrukciji obalnog zida prema Jazu u luci Malinska	Poništeno
76.	EV-M-76/24	Nabava usluge projektantskog nadzora nad radovima na uređenju obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice u luci Omišalj (Pesja)	Brisano
77.	EV-M-77/24	Nabava osobnog automobila putem financijskog leasinga	Izvršeno
78.	EV-M-78/24	Nabava radova na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk	Izvršeno
79.	EV-M-79/24	Zajednička nabava električne energije	Izvršeno

80.	EV-M-80/24	Nabava goriva za službena vozila u vlasništvu Županijske lučke uprave Krk	Brisano
81.	EV-M-81/24	Nabava usluge izrade idejnog projekta za nabavu i montažu plutajućeg pontona u luci Punat	Izvršeno
82.	EV-M-82/24	Nabava usluge osiguranja pontonskih gata u lukama Omišalj, Krk i Malinska	Brisano
83.	EV-M-83/24	Nabava usluge čišćenja sanitarnog čvora u luci Valbiska	Izvršeno
84.	EV-M-84/24	Nabava radova na sanaciji rive i lukobrana u luci Stara Baška	Izvršeno
85.	EV-M-85/24	Nabava i postavljanje prijenosne montažne kamene kućice za luku Valbiska	Izvršeno
86.	EV-M-86/24	Nabava izmjene sidrenog sustava pontonskog gata u luci Krk	Izvršeno
87.	EV-M-87/24	Nabava radova na sanaciji podmorskog i nadmorskog dijela obalnog zida u luci Krk	Izvršeno
88.	EV-M-88/24	Nabava lanaca i gambeta za održavanje vezova na području Županijske lučke uprave Krk	Izvršeno
89.	EV-M-89/24	Nabava usluge izrade studije izvodljivosti za budući natječaj MMPI za investicije za zaštitu lučkog akvatorija i izgradnju komunalnih vezova u luci Vrbnik	Izvršeno
90.	EV-M-90/24	Nabava kartica za evidenciju odlaganja otpada u lukama na području Županijske lučke uprave Krk	Izvršeno
91.	EV-M-91/24	Nabava radova na uređenju platoa za postavu kioska za naplatu karata u luci Valbiska	Izvršeno
92.	EV-M-92/24	Nabava konopa za održavanje sidrenog sustava u lukama na području Županijske lučke uprave Krk	Izvršeno
93.	EV-M-93/24	Nabava pisača i pripadajuće opreme za gotovinsku naplatu računa	Izvršeno
94.	EV-M-94/24	Nabava usluge izrade maritimne studije za postavu plutajućeg pontona u luci Punat	Izvršeno
95.	EV-M-95/24	Nabava usluge izrade maritimne studije za postavu plutajućeg pontona u luci Šilo	Izvršeno
96.	EV-M-96/24	Nabava usluge izrade maritimne studije za postavu plutajućeg pontona u luci Malinska	Izvršeno
97.	EV-M-97/24	Nabava usluge izrade maritimne studije za rekonstrukciju i dogradnju dva gata na području Vele vode u luci Punat	Izvršeno
98.	EV-M-98/24	Nabava usluge izrade elaborata za ocjenu o potrebi izrade procjene utjecaja na okoliš za uređenje obalnog pojasa od rive Ivana Pavla II do dizalice u luci Omišalj (Pesja)	Izvršeno
99.	EV-M-99/24	Nabava radova na nabavi i montaži plutajućeg pontona u luci Punat	Brisano
100.	EV-M-100/24	Nabava radova na rekonstrukciji luke Baška - IV. Faza	Izvršeno
101.	EV-M-101/24	Nabava usluge izrade izmjene glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije luke Baška - IV. Faza	Izvršeno
102.	EV-M-102/24	Nabava radova na sanaciji podmorskog i nadmorskog dijela rive u luci Sveta Fуска	Izvršeno
103.	EV-M-103/24	Nabava radova na sanaciji hodne površine Pod Gušternu u luci Punat	Izvršeno

104.	EV-M-104/24	Nabava usluge izrade projekta sidrenog sustava pontona na području Jaza u luci Malinska	Brisano
105.	EV-M-105/24	Nabava radova za uređenju platoa za postavljanje kućice u luci Baška	Izvršeno
106.	EV-M-106/24	Nabava usluge izrade projekta sidrenog sustava plovila za uređenje obalnog pojasa na području Pod Gušternu u luci Punat	Brisano
107.	EV-M-107/24	Nabava usluge izrade projekta sidrenog sustava plovila za rekonstrukciju luke Baška - 4. faza	Izvršeno
108.	EV-M-108/24	Nabave usluge izrade glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju operativne obale Sv. Bernardin u luci Krk	Izvršeno
109.	EV-M-109/24	Nabava usluge izrade maritimne studije za rekonstrukciju operativne obale Sv. Bernardin u luci Krk	Brisano
110.	EV-M-110/24	Nabava usluge geotehničkih istražnih radova za potrebe izrade glavnog projekta za rekonstrukciju operativne obale Sv. Bernardin u luci Krk	Brisano
111.	EV-M-111/24	Nabava usluge izrade projekta sidrenog sustava plovila za rekonstrukciju luke Krk - uporabna cjelina 3 - gatovi	Izvršeno
112.	EV-M-112/24	Nabava usluge izrade projekta sidrenog sustava plovila za rekonstrukciju luke Krk - uporabna cjelina 1 i 2	Izvršeno
113.	EV-M-113/24	Nabava usluge izrade izmjene glavnog projekta za rekonstrukciju luke Krk - uporabna cjelina 2 - sekundarni lukobran	Poništeno
114.	EV-M-114/24	Nabava usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji obalnog zida prema Jazu u luci Malinska	Poništeno
115.	EV-M-115/24	Nabava radova na nabavi i montaži plutajućeg pontona u luci Punat	Izvršeno
116.	EV-M-116/24	Nabava i montaža pristupne pasarele na plutajući ponton za ribare u luci Malinska	Izvršeno
117.	EV-M-117/24	Nabava usluge arheološkog nadzora na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk	Izvršeno
118.	EV-M-118/24	Nabava radova na rekonstrukciji luke Baška - IV. faza	Izvršeno
119.	EV-M-119/24	Nabava elektroinstalaterskih radova na izradi uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u luci Krk	Izvršeno
120.	EV-M-120/24	Nabava usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji luke Baška - IV. faza	Izvršeno
121.	EV-M-121/24	Nabava usluge projektantskog nadzora nad radovima na rekonstrukciji luke Baška - IV. faza	Izvršeno
122.	EV-M-122/24	Nabava usluge izrade studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti opskrbe plovnih objekata gorivom na dijelu lučkog područja luke Krk	Izvršeno
123.	EV-M-123/24	Nabava usluge usklađivanja postojećih akata s Općom Uredbom (EU) 2016/679 i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)	Izvršeno
124.	EV-M-124/24	Nabava usluge izrade web stranice Županijske lučke uprave Krk	Izvršeno

125.	EV-M-125/24	Nabava usluge uspostavljanja sustava financijskog upravljanja i unutarnjih kontrola ustrojstvenih jedinica Županijske lučke uprave Krk	Izvršeno
126.	EV-M-126/24	Nabava usluge vađenja, tegljenja i deponiranja potonule brodice oznake ŠL 1987 u luci Klimno	Izvršeno
127.	EV-M-127/24	Nabava službene radne odjeće za djelatnike Županijske lučke uprave Krk	Brisano
128.	EV-M-128/24	Nabava usluge izrade izmjene glavnog projekta za rekonstrukciju luke Krk - uporabna cjelina 2 - sekundarni lukobran	Izvršeno
129.	EV-M-129/24	Nabava usluge izrade projekta potrebnih elemenata za montažu elektromotornog vitla na istezalištu u luci Krk	Izvršeno
130.	EV-M-130/24	Nabava radova na popravku pontona Gaj u luci Omišalj	Izvršeno
131.	EV-M-131/24	Nabava radova na izradi temelja za postavu vitla na istezalištu u luci Krk	Izvršeno
132.	EV-M-132/24	Nabava za uslugu voditelja projekta gradnje na projektu "Rekonstrukcija luke Krk"	Izvršeno
133.	EV-M-133/24	Nabava izvođenja radova na rekonstrukciji luke Krk	Nije izvršeno
134.	EV-M-134/24	Nabava usluge administrativnog vođenja projekta „Rekonstrukcija luke Krk“	Izvršeno
135.	EV-M-135/24	Nabava usluge pripreme dokumentacije o nabavi i sudjelovanju u radu stručnog povjerenstva u provedbi postupaka javne nabave u 2025. godini	Izvršeno

Prikaz provedbe Plana nabave za 2024. godinu

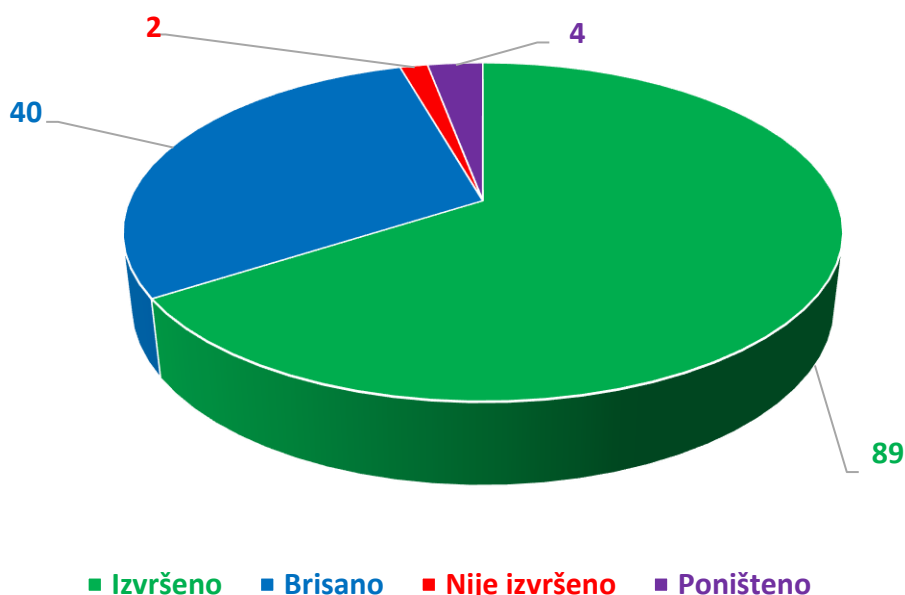

8. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA DAVANJA KONCESIJA

Županijska lučka uprava u 2024. godini imala je sklopljeno 13 ugovora o koncesiji, od kojih je:

- 1 ugovor sklopljen u 2024. godini,
- 4 ugovora su istekla u 2024. godini,
- 9 ugovora bilo je važećih na dan 31.12.2024. godine.

Redni broj	Naziv koncesije	Koncesionar	Područje koncesije	Iznos stalnog dijela u eurima	Iznos varijabilnog dijela u eurima	Trajanje koncesije
1.	Ugovor o koncesiji za obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica, koja zahtjeva izgradnju objekata lučke infrastrukture, na dijelu lučkog područja luke Krk	VECLA d.o.o.	Luka Krk	3.373,37	108,81	27.05.2014. - 26.05.2024.
2.	Ugovor o koncesiji za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti u funkciji lučkih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Baška	T.D. BAŠKA d.o.o.	Luka Baška	2.292,02	254,76	09.06.2014. - 08.06.2024.
3.	Ugovor o koncesiji za pružanje usluga ostalih gospodarskih djelatnosti, s pravom na gradnju, na dijelu lučkog područja luke otvorene za javne promet lokalnog značaja Njivice	OTO NAUTIKA d.o.o.	Luka Njivice	1.263,52	2.271,60	29.05.2017. - 28.05.2029.
4.	Ugovor o koncesiji za izgradnju i gospodarsko korištenje dijela lučkog područja luke otvorene za javne promet lokalnog značaja, luke Dunat, Grad Krk	VECLA d.o.o.	Luka Dunat	7.299,75	10.564,82	02.06.2017. - 01.06.2037.
5.	Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje luke Omišalj radi obavljanja	FISH HOUSE OMIŠALJ d.o.o.	Luka Omišalj	11.307,98	2.351,82	11.06.2018. - 10.06.2028.

	ugostiteljskih djelatnosti					
6.	Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje luke Krk radi obavljanja ugostiteljskih djelatnosti	Krčke vile d.o.o	Luka Krk	5.255,82	4.961,18	13.06.2018. - 12.06.2028.
7.	Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Malinska, Općine Malinska -Dubašnica	K.D. Dubašnica d.o.o	Luka Malinska	23.624,66	5.799,08	24.06.2019. - 23.06.2029.
8.	Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra radi obavljanja gospodarskih djelatnosti opskrbe plovniha objekata gorivom na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Krk, Grad Krk	FLASH ENERGY d.o.o	Luka Krk	8.494,26	34.147,91	04.08.2020. - 03.08.2025.
9.	Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela podmorskog dobra radi obavljanja gospodarske djelatnosti opskrbe brodova, jahti i brodica gorivom na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet, luke Krk, Grad Krk	INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d.	Luka Krk	7.963,46	26.614,86	13.05.2021. - 12.05.2026.
10.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili	ADRIA YACHTING d.o.o.	Luka Valbiska	265,45	56,33	01.05.2022. - 01.05.2024.

	izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Valbiska					
11.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Valbiska	INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d.	Luka Valbiska	827,74	24.499,52	16.08.2022. - 16.08.2024.
12.	Ugovor o koncesiji u svrhu obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luka otoka Krka pod nadležnošću Županijske lučke uprave Krk	Dezinsekcija d.o.o.	Luka Krk	663,61	39,40	02.01.2023. - 31.12.2027.
13.	Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja gospodarske djelatnosti - usluge organizacije i naplate parkiranja na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja luka Porat, Općina Malinska-Dubašnica	K.D. Dubašnica d.o.o.	Luka Porat	1.516,56	426,93	05.07.2024. - 04.07.2029.

Prethodni tabelarni prikaz obuhvaća podatke o pojedinačnim koncesijama koji sadrže ispostavljene račune za koncesijske naknade u 2024. godini.

Ukupni prihodi od koncesijskih naknada iznose 186.245,22 eura, od kojih je:

- ✚ stalni dio koncesijske naknade u iznosu od 74.148,20 eura,
- ✚ varijabilni dio koncesijske naknade u iznosu od 112.097,02 eura.

9. ZAKLJUČAK

✚ Na temelju članka 117. stavka 2. točke 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/2023), članka 7. stavka 1. točke 3. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk („Službene novine“ broj 38/23), članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Krk, usvojilo je na:

- 43. sjednici Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk održanoj dana 19. prosinca 2023. godine Godišnji plan rada luke Županijske lučke uprave Krk za 2024. godinu

Na temelju članka 117. stavka 2. točke 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/2023), članka 12. stavka 1. točke 3. Statuta Županijske lučke uprave Krk, članka 8. stavka 1. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk, na prijedlog ravnatelja Županijske lučke uprave Krk, usvojilo je na:

- 2. sjednici Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk održanoj dana 20. lipnja 2024. godine I. izmjene Godišnjeg plana rada luke Županijske lučke uprave Krk za 2024. godinu
- 14. sjednici Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk održanoj dana 19. prosinca 2024. godine II. izmjene Godišnjeg plana rada luke Županijske lučke uprave Krk za 2024. godinu

✚ Sukladno člancima 10.-19. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk donijelo je na:

- 43. sjednici Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk održanoj dana 19. prosinca 2023. godine Financijski plan za 2024. godinu
- 2. sjednici Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk održanoj dana 20. lipnja 2024. godine I. izmjene Financijskog plana za 2024. godinu
- 14. sjednici dana 19. prosinca 2024. godine II. izmjene Financijskog plana za 2024. godinu.

✚ Županijska lučka uprava Krk je neprofitna ustanova i svoje poslovne knjige kao i financijska izvješća obvezna je voditi i iskazivati u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine obuhvaćaju:

- Bilancu na Obrascu: BIL-NPF na dan 31.12.2024. godine

- Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF i
- Bilješke uz financijske izvještaje.

U financijskim pokazateljima Balance (BIL-NPF) imovina na dan 01. siječnja iznosila je 18.850.513,65 eura, dok na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 20.639.277,00 eura. To pokazuje povećanje imovine od 1.788.763,35 eura u navedenom razdoblju.

U financijski pokazateljima Izvještaja o prihodima i rashodima (PR-RAS-NPF) prikazani su:

- prihodi za 2024. godinu iznose 3.942.954,11 eura, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 3.185.635,40 eura. Usporedbom prihoda iz 2024. i 2023. godine, povećanje iznosi 757.318,71 eura, što predstavlja porast od 23,8% u 2024. godini;
- rashodi za 2024. godinu iznose 2.916.055,40 eura, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 2.159.400,52 eura. U usporedbi rashoda iz 2024. i 2023. godine, povećanje iznosi 756.654,88 eura, što predstavlja porast od 35,0% u 2024. godini;
- višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.026.898,71 eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 1.026.234,88 eura.

✚ Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za 2024. godinu sastoji se od slijedećih prihoda i rashoda:

- sveukupni prihodi poslovanja, obveze za kredite i zajmove, odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja te preneseni višak prihoda iznose 5.813.685,93 eura;
- sveukupni rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda te obveze za kredite i zajmove iznose 4.407.665,26 eura;
- višak prihoda u iznosu 1.406.020,67 eura koji će se prenijeti izmjenom plana za 2025. godinu.

KLASA: 023-01/24-01/06
URBROJ: 2107-1-5-04-25-120
U Krku, 26. ožujka 2025. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Upravno vijeće

Predsjednica Upravnog vijeća
Nada Milošević, dipl. iur.



Prilog:

1. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za 2024. godinu
2. Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine koji obuhvaćaju Bilancu na Obrascu: BIL-NPF na dan 31.12.2024. godine, Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke uz financijske izvještaje
3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2024. godinu
